



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

## NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ STRATEGIE CLLD MAS HOLICKO

**v období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019**

Zpracovatel: Kontrolní výbor MAS Holicko

Konzultant: Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD

## Obsah

<b>1. ÚVOD</b>	<b>2</b>
1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	2
1.2. INFORMACE O PODANÝCH/ SCHVÁLENÝCH ZMĚNÁCH STRATEGIE CLLD	2
1.3. OPATŘENÍ PŘI NEPLNĚNÍ ULOŽENÝCH POVINNOSTÍ	2
<b>2. REALIZACE STRATEGIE CLLD</b>	<b>3</b>
2.1. PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV	3
2.1.1. Výzva MAS Holicko č. 2 - PRV	4
2.1.2. 1. výzva MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2017)	7
2.1.3. 2. výzva MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2017)	8
2.1.4. Malý LEADER pro Holicko pro rok 2018	10
2.2. PRŮBĚH ADMINISTRACE VÝZEV	12
2.3. KATEGORIE PODPOŘENÝCH ŽADATELŮ	12
2.4. MÍSTA REALIZACE PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ	14
<b>3. VĚCNÝ POKROK V PLNĚNÍ CÍLŮ STRATEGIE CLLD</b>	<b>16</b>
3.1. VĚCNÝ POKROK V PLNĚNÍ CÍLŮ PROGRAMOVÉHO RÁMCE PRV	16
3.1.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce PRV	18
3.1.2. Plnění finančního plánu Programového rámce PRV	25
3.1.3. Plnění indikátorového plánu Programového rámce PRV	24
3.2. VĚCNÝ POKROK V PLNĚNÍ CÍLŮ PROGRAMOVÉHO RÁMCE IROP	26
3.2.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce IROP	27
3.2.2. Plnění finančního plánu Programového rámce IROP	30
3.2.3. Plnění indikátorového plánu Programového rámce IROP	29
3.3. VĚCNÝ POKROK V PLNĚNÍ CÍLŮ SCLLD MIMO PROGRAMOVÉ RÁMCE	33
3.4. INFORMACE O DOSAŽENÝCH SYNERGICKÝCH EFEKTECH NA ÚROVNI OPATŘENÍ RESP. PODOPATŘENÍ STRATEGIE	38
3.5. HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY	38
<b>4. ANIMACE STRATEGIE CLLD</b>	<b>39</b>
4.1. PROPAGACE STRATEGIE CLLD	39
4.2. PODPORA ŽADATELŮ	40
4.3. ANIMACE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OPVVV	40
4.4. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A PARTNERŮ MAS	41
<b>5. INFORMACE O PROBLÉMECH A RIZICÍCH V PRŮBĚHU REALIZACE STRATEGIE CLLD</b>	<b>42</b>
5.1. INFORMACE O PROBLÉMECH, KTERÉ SE VYSKYTLY V PRŮBĚHU REALIZACE SCLLD A PŘIJATÁ OPATŘENÍ	44
5.2. INFORMACE O POTENCIÁLNÍCH RIZICÍCH REALIZACE SCLLD A OPATŘENÍ K JEJICH ELIMINACI	45
<b>6. ZÁVĚR</b>	<b>45</b>

## 1. Úvod

Předmětem této práce je vyhodnocení naplňování cílů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 - 2020 (SCLLD) s mottem: „Holicko – region plný života“.

Výchozím časovým obdobím pro tuto zprávu je období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, během kterého byly vyhlášeny 3 výzvy z obou programových rámců, které jsou uvedeny v SCLLD (1 výzva – PRV a 2 výzvy – IROP) a 1 výzva na Malý LEADER pro Holicko z financí Programu obnovy venkova Pardubického kraje.

### 1.1. Základní údaje

Název MAS:	MAS Holicko, o.p.s
Integrovaná strategie:	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 - 2020
Registrační číslo strategie:	CLLD_15_01_232
Datum schválení Strategie:	17. 8. 2016
Pořadí hodnotící zprávy:	3
Sledované období:	1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

### 1.2. Informace o podaných/ schválených změnách strategie CLLD

Ve sledovaném období byla schválena žádost o změnu týkající se členské základny MAS Holicko a složení povinných orgánů MAS. Změna byla podána 19.12.2018 a ŘO schválena 11.2.2019

Dále byly podány 4 žádosti o změnu SCLLD:

- 1) **Aktualizace finančního plánu programového rámce IROP** - dle skutečného čerpání v roce 2018, upravení celkové výše rezervované alokace v Kč dle kurzu CZK/EUR k 31.10.2018. - Změna byla podána 24.1.2019 a ŘO schválena 25.2.2019
- 2) **Změna v členské základně a složení povinných orgánů MAS** - Změna byla podána 5.6.2019 a ŘO schválena 1.7.2019
- 3) **Aktualizace programového rámce PRV** - vyplynula z provedené mid-term evaluace Strategie CLLD - narovnání finančního a indikátorového plánu a přidání nové Fiche 7 - Podpora spolkového života. - Změna byla podána 26.8.2019 a ŘO schválena 5.10.2019
- 4) **Změna v členské základně a složení povinných orgánů MAS** - Změna byla podána 2.12.2019 a dosud nebyla ŘO schválena.

### 1.3. Opatření při neplnění uložených povinností

Nerelevantní – žádná opatření ŘO nebyla vůči MAS Holicko uplatněna.

## 2. Realizace strategie CLLD

V průběhu sledovaného období MAS Holicko vyhlásila 3 výzvy příjmu žádostí o podporu pro oba programové rámce SCLLD a 1 výzvu na Malý LEADER pro Holicko z financí Programu obnovy venkova Pardubického kraje. V rámci těchto výzev poskytovala MAS Holicko potencionálním příjemcům podporu, ať již formou konzultací (osobní, telefon, e-mail) tak i formou realizovaných seminářů. V průběhu celého roku probíhala administrace těchto výzev (hodnocení a výběr projektů, komunikace se žadateli a řídicími orgány, apod.) a zároveň příprava výzev, které jsou v plánu vyhlásit v roce 2020.

V rámci programového rámce PRV bylo požádáno na Řídicí orgán o vyhlášení 2 výzev. Důvodem bylo to, že výzva č.4 - PRV musela být kvůli administrativní chybě stornována. A tak vzápětí byla vyhlášena výzva č.5 - PRV, v rámci které bylo přijato 11 žádostí o dotaci a následně schváleno 8 projektů. Z toho 4 projekty v 11/2019 podepsalo Dohodu o poskytnutí dotace (výše dotace: 600.376,-Kč) a zbylé 4 projekty byly v 12/2019 schváleny SZIFem (výše dotace: 2.539.303,-Kč). Celkem bylo v tomto období 13 projektů v realizaci (výše dotace: 3.341.869,- Kč), z toho 9 projektů podalo Žádost o platbu (výše dotace: 2.399.872,- Kč). Další 4 projekty již byly v udržitelnosti (výše dotace: 3.233.310,- Kč). Díky realizaci schválených projektů dochází k postupnému naplňování indikátorového a finančního plánu, tak jak bylo naplánováno při aktualizaci Strategie CLLD v 8/2019.

V rámci programového rámce IROP byly vyhlášeny 2 výzvy, v rámci kterých bylo přijato celkem 6 žádostí o podporu. V 12/2019 bylo 6 vybraných projektů MAS předáno na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti (výše dotace: 8.014.932,24Kč). Celkem bylo v tomto období 9 projektů v realizaci (výše dotace: 9.284.496,51 Kč), z toho 2 projekty podalo Žádost o platbu (výše dotace: 1.924.661,57 Kč). Další 3 projekty již byly v udržitelnosti (výše dotace: 3.318.669,33 Kč). V případě programového rámce IROP došlo k pomalejšímu naplňování indikátorového a finančního plánu než bylo původně plánováno. Důvodem je zpoždění, které jsme nabraly při vyhlášení prvních výzev, kde byla malá projektová připravenost žadatelů. Na druhou stranu, můžeme již teď konstatovat, že téměř veškeré finance jsou zazávazkované (zbývá volná alokace ve výši pouhých 1.201.284,91 Kč) a v případě indikátorového plánu víme, že na konci programovacího období dojde k jeho několikanásobnému překročení.

Dále byla vyhlášena výzva na Malý LEADER pro Holicko z financí Programu obnovy venkova Pardubického kraje, v rámci které bylo přijato 13 žádostí o podporu. 10 z nich bylo MAS vybráno k podpoře a následně předloženo na Pardubický kraj ke schválení (výše podpory: 350.000,- Kč). Zbylé 3 žádosti byly schváleny jako náhradníci pro případ, že by se některý z vybraných projektů nerealizoval (např. z důvodu odstoupení žadatele). Dále bylo v tomto období 10 projektů z loňské výzvy v realizaci (výše podpory: 349.180,- Kč)

Kromě vyhlášení výzev v první polovině roku 2019 probíhala i mid-term evaluace Strategie CLLD, jejímž výstupem byl návrh opatření, která povedou ke zlepšení naplňování cílů SCLLD. Jedním z těchto kroků byla i následná aktualizace Strategie CLLD, v rámci které došlo k narovnání finančního a indikátorového plánu programového rámce PRV a přidání nové Fiche 7 - Podpora spolkového života.

### 2.1. Přehled vyhlášených výzev

V roce 2019 MAS Holicko vyhlásila a úspěšně zrealizovala 3 výzvy pro oba programové rámce SCLLD (1x programový rámec PRV, 2x programový rámec IROP). Úspěšně zrealizovaná výzva znamená, že Programový výbor na základě hodnocení Výběrové komise schválil k financování minimálně 1 projekt, který byl následně předán k závěrečnému ověření na Řídicí orgán.

V rámci programového rámce PRV bylo požádáno na Řídicí orgán o vyhlášení 2 výzev. Důvodem bylo to, že výzva č.4 - PRV musela být kvůli administrativní chybě ještě před vyhlášením stornována. A tak vzápětí byla vyhlášena výzva č.5 - PRV, která byla i úspěšně zrealizována.

V případě programového rámce IROP probíhalo vyhlášení obou výzev bez problémů.

Tabulka 1 – Počet úspěšně zrealizovaných výzev MAS

	Plán uvedený v SCLLD	Plnění		
		Rok 2019	Celkem 2016 - 2019	%
Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou	15	3	9	60,00%

Kromě toho MAS Holicko vyhlásila a úspěšně zrealizovala ještě 1 výzvu, a to výzvu na Malý LEADER pro Holicko z financí Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Tato výzva nevychází ze žádného programového rámce CLLD – pomáhá podpořit projektové záměry, které jsou uvedeny ve strategii, ale nemohly být podpořeny z programových rámců. Z tohoto důvodu se tato výzva nezapočítává do povinných indikátorů sledujících průběh realizace SCLLD (tabulka výše).

#### 2.1.1. Výzva MAS Holicko č. 5 - PRV

**Vyhlášení výzvy:** 8.1.2019

**Příjem žádostí:** 8.1.2019 – 14.3.2019

**Vyhlášené Fiche:** 2 - Podpora potravinářských podniků, 3 - Podpora malých podniků, 4 - Ochrana lesních porostů, 5 -Zpřístupnění lesa návštěvníkům

**Finanční alokace:** 4.753.855,-Kč

Tabulka 2 – Finanční alokace pro výzvu MAS Holicko č. 5 - PRV

Výzva č. 5 - PRV	Finanční alokace výzvy	Počet přijatých projektů	Výše požadované dotace	Počet schválených projektů	Výše schválené dotace - MAS
<b>2 – Podpora potravinářských podniků</b>	412.850,- Kč	2	335.187,- Kč	2	335.187,- Kč
<b>3 – Podpora malých podniků</b>	3.500.000,- Kč	8	3.546.542,- Kč	6	2.808.542,- Kč
<b>4 – Ochrana lesních porostů</b>	536.610,- Kč	0	0 Kč	0	0 Kč
<b>5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům</b>	304.395,- Kč	1	0 Kč	0	0 Kč
<b>Celkem</b>	<b>4.753.855,- Kč</b>	<b>11</b>	<b>3.881.729,- Kč</b>	<b>8</b>	<b>3.143.729,- Kč</b>

**Průběh výzvy:** Bylo přijato celkem 11 žádostí o dotaci (2 žádosti do Fiche 1, 8 žádostí do Fiche 3 a 1 žádost do Fiche 5. V rámci Fiche 4 nebyla podána žádná žádost.). 1 žádost byla přijata po termínu (AUTOMOTOKLUB Holice v AČR) a proto jí byla ukončena administrace. 2 žádosti byly vyloučeny na základě administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti (Ondřej Plocek, Antonín Jablonský). Ostatních 8 žádostí prošlo administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti s kladným výsledkem. U všech těchto žádostí proběhlo místní šetření (provedl vedoucí pracovník pro CLLD).

Tabulka 3 – Přijaté žádosti o dotaci v rámci Výzvy MAS Holicko č.5 - PRV

Registrační číslo žádosti	Název žadatele	Název projektu	Místo realizace projektu (NUTS 5)	Počet bodů	Status	Výše schválené dotace *
<b>Fiche 2 – Podpora potravinářských podniků</b>						<b>329.327,-Kč</b>
19/005/19210/453/088/001126	Věra Skutilová	Nákup přívěsu	Chvojenec	67	Schválený SZIF - Podaná ŽoP	89.140,-Kč
19/005/19210/453/088/001127	Vladimíra Krejčíková	Uvádění ZEGITY na trh	Ostřetín	59	Schválený SZIF	240.187,-Kč
<b>Fiche 3 – Podpora malých podniků</b>						<b>2.803.044,-Kč</b>
19/005/19210/453/088/001125	Josef Branda	Pepe Zmrzlina	Holice	76	Schválený SZIF - Podaná ŽoP	220.050,-Kč
19/005/19210/453/088/001128	Tomáš Pražák	Nákup technologie a strojů	Holice - Roveňsko	73	Schválený SZIF - Podaná ŽoP	43.691,-Kč
19/005/19210/453/088/001123	Jana Vondroušová	Výměna podlahy v tanečním sálu a v lokále Hostince u Červinků - Horní Ředice č. 47	Horní Ředice	70	Schválený SZIF	294.253,-Kč
19/005/19210/453/088/001122	Vít Binko	Obnova strojního vybavení truhlářské dílny	Dolní Roveň	65	Schválený SZIF	450.000,-Kč
19/005/19210/453/088/001124	Miloš Vlasák	Pořízení stavební techniky	Poběžovice u Holic	57	Schválený SZIF	895.500,-Kč
19/005/19210/453/088/001121	Luboš Kvapil	Drobná zámečnická dílna	Horní Ředice	52	Schválený SZIF	899.550,-Kč
	Ondřej Plocek	Dovybavení provozovny – zdravé výživy	Holice	-	Nesplnění kritérií přijatelnosti	0 Kč
	Antonín Jablonský	Skladovací hala pro maloobchod s nápoji	Chvojenec	-	Nesplnění kritérií přijatelnosti	0 Kč
<b>Fiche 4 – Ochrana lesních porostů</b>						<b>-</b>
V rámci této Fiche nebyly podány žádné žádosti o dotaci						
<b>Fiche 5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům</b>						<b>0 Kč</b>
	AUTOMOTOKLUB Holice v AČR	Realizace lesní klidové zóny v přírodní lokalitě rybníku Hluboký	Holice	-	Ukončení administrace (pozdní podání)	0 Kč

\*Výše schválené dotace uvedené v tabulce 3 je výše dotace, kterou jednotlivým projektům schválil SZIF. Rozdíl (oproti tabulce 2) vznikl díky skutečným výběrovým řízením jednotlivými žadateli po odevzdání jejich žádostí na SZIF.

Výběrová komise zasedala v termínech 2.5.2019 a 9.5.2019 (veřejná obhajoba projektů). Všechny žádosti splnily minimální bodovou hranici. Programový výbor rozhodl 13.5.2019, že všechny zaregistrované projekty v rámci výzvy č.5 - PRV, které prošly hodnocením s kladným výsledkem, budou podpořeny.

Dne 18.6.2019 byly všechny žádosti o dotaci předány na SZIF k jejich kontrole. 6.11.2019 a 21.11.2019 byly schváleny SZIFem projekty, které nemusely dokládat výběrové řízení. 20.12.2019 byly schváleny i ostatní projekty výzvy, které výběrové řízení dokládaly.

Tabulka 4 – Parametry schválených žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS Holicko č.5 – PRV – Fiche 2 – Podpora potravinářských podniků

Fiche 2 – Podpora potravinářských podniků	Měrná jednotka	Hodnota
Počet schválených projektů celkem	Počet	2
Počet projektů týkající se výroby potravin	Počet	2
Počet projektů týkající se výroby krmiv	Počet	0
Počet projektů, jejichž součástí je investice do zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů	Počet	2
Počet inovativních projektů	Počet	0
Počet projektů šetrných k životnímu prostředí	Počet	0
Počet projektů využívajících stávající zařízení a objekty	Počet	2
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	Pracovní místa	0
Modernizace nevyužitých prostor	m <sup>2</sup>	0
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x: 501 – 2.000 obyvatel.</li> </ul>
Typ žadatele	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Zemědělec – FO (mikropodnik),</li> <li>• 1x Podnikatel – FO (mikropodnik)</li> </ul>
Počet začínajících podnikatelů	Žadatel	2
Počet žen (v případě FO)	Žadatel	2
Počet držitelů regionální značky „KRAJ PERŠTEJNŮ regionální produkt“	Žadatel	0
Počet nově vzniklých živnostenských oprávnění	Živnostenské oprávnění	0
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	56,84%

Tabulka 5 – Parametry schválených žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS Holicko č.5 – PRV – Fiche 3 – Podpora malých podniků

Fiche 3 – Podpora malých podniků	Měrná jednotka	Hodnota
Počet schválených projektů celkem	Počet	6
Ekonomická činnost žadatele	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x C - Zpracovatelský průmysl,</li> <li>• 1x F - Stavebnictví,</li> <li>• 2x I - Ubytování, stravování a pohostinství,</li> <li>• 1x S - Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost.</li> </ul>
Počet inovativních projektů	Počet	1
Počet projektů šetrných k životnímu prostředí	Počet	2
Počet projektů zlepšujících základní vybavení nebo služby v obci	Počet	0
Počet projektů využívajících stávající zařízení a objekty	Počet	5
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	Pracovní místa	0
Modernizace nevyužitých prostor	m <sup>2</sup>	0
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x: do 500 obyvatel,</li> <li>• 2x: 501 – 2.000 obyvatel,</li> <li>• 1x: 2.001 – 5.000 obyvatel,</li> <li>• 2x: nad 5.000 obyvatel.</li> </ul>

Fiche 3 – Podpora malých podniků	Měrná jednotka	Hodnota
Typ žadatele	-	• 6x Podnikatel – FO (mikropodniky).
Počet začínajících podnikatelů	Žadatel	2
Počet žen (v případě FO)	Žadatel	1
Počet držitelů regionální značky „KRAJ PERŠTEJNŮ regionální produkt“	Žadatel	0
Počet nově vzniklých živnostenských oprávnění	Živnostenské oprávnění	2
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	53,64%

### 2.1.2. 5. výzva MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2019)

**Vyhlášení výzvy:** 3.6.2019

**Příjem žádostí:** 3.6.2019 – 5.9.2019

**Vyhlášené opatření:** 1 – Vzdělávání

**Finanční alokace:** 2.644.622,59 Kč

Tabulka 6 – Finanční alokace pro 5. výzvu MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2019)

5.výzva MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2019)	Finanční alokace výzvy	Počet přijatých projektů	Výše požadované dotace	Počet schválených projektů	Výše schválené dotace - MAS
1 – Vzdělávání	2.644.622,59 Kč	2	2.644.574,85 Kč	2	2.644.574,85 Kč

**Průběh výzvy:** Byly přijaty 2 žádosti o podporu, které prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí s kladným výsledkem.

Tabulka 7 – Přijaté žádosti o dotaci v rámci 5. výzvy MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2019)

Registrační číslo žádosti	Název žadatele	Název projektu	Místo realizace projektu (NUTS 5)	Počet bodů	Status	Výše schválené dotace
<b>Opatření 1 – Vzdělávání</b>						<b>2.644.574,85Kč</b>
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012301	Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace	Vybavení učebny informatiky a učebny cizího jazyka Základní školy Horní Jelení	Horní Jelení	80	Vybraný MAS	1.504.154,- Kč
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012311	Obec Horní Ředice	Stavební úpravy a pořízení vybavení učebny informatiky a venkovní učebny při ZŠ Horní Ředice	Horní Ředice	80	Vybraný MAS	1.140.420,85Kč

Výběrová komise zasedala v termínech 13.11.2019 a 20.11.2019. Žádosti splnily minimální bodovou hranici. Programový výbor rozhodl 11.12.2019 o schválení všech projektů, které prošly hodnocením s kladným výsledkem.

Dne 17.12.2019 byly žádosti o podporu předány na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.



Tabulka 8 – Parametry schválených žádostí o dotaci v rámci 5. výzvy MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2019)

Opatření 1 - Vzdělávání	Měrná jednotka	Hodnota
Počet schválených projektů celkem	Počet	2
Počet podpořených základních škol	Zařízení	2
Počet podpořených zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání	Zařízení	0
Počet podpořených zařízení pro celoživotní vzdělávání	Zařízení	0
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení	Osoby	76
Počet projektů týkající se komunikace v cizích jazycích	Počet	1
Počet projektů týkající se technických a řemeslných oborů	Projekt	0
Počet projektů týkající se přírodních věd	Projekt	1
Počet projektů týkající se schopnosti práce s digitálními technologiemi	Projekt	2
Počet projektů základních škol, jejichž výstupy budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže	Projekt	2
Počet projektů základních škol, jejichž výstupy budou sloužit pro výuku více předmětů (kroužků)	Projekt	2
Počet projektů týkající se bezbariérovosti	Projekt	0
Počet projektů týkající se vnitřní konektivity škol a školských zařízení a připojení k internetu	Projekt	0
Počet projektů, jejichž součástí byly úpravy venkovního prostoru	Projekt	0
Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela cílová skupina	Projekt	2
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x: 501 – 2.000 obyvatel,</li> <li>• 1x: 2.001 - 5.000 obyvatel.</li> </ul>
Typ žadatele	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Školy a školská zařízení,</li> <li>• 1x Obce a jejich organizace.</li> </ul>
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	5,00%

### 2.1.3. 6. výzva MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2019)

**Vyhlášení výzvy:** 3.6.2019

**Příjem žádostí:** 3.6.2019 – 5.9.2019

**Vyhlášené opatření:** 2 – Bezpečnost silničního provozu

**Finanční alokace:** 6.571.594,54Kč

Tabulka 9 – Finanční alokace pro 6. výzvu MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2019)

6.výzva MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2019)	Finanční alokace výzvy	Počet přijatých projektů	Výše požadované dotace	Počet schválených projektů	Výše schválené dotace - MAS
<b>2 – Bezpečnost silničního provozu</b>	6.571.594,54 Kč	4	5.370.357,39 Kč	4	5.370.357,39 Kč

**Průběh výzvy:** Byly přijaty 4 žádosti o podporu, které prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí s kladným výsledkem.

Tabulka 10 – Přijaté žádosti o dotaci v rámci 6. výzvy MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2019)

Registrační číslo žádosti	Název žadatele	Název projektu	Místo realizace projektu (NUTS 5)	Počet bodů	Status	Výše schválené dotace
<b>Opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu</b>						<b>5.370.357,39Kč</b>
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012307	Obec Uhersko	Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Uhersko výstavbou nového chodníku při silnici III/30513	Uhersko	75	Vybraný MAS	320.935,65Kč
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012302	Obec Chvojenec	Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Chvojenec rekonstrukcí chodníku podél silnice III/29821	Chvojenec	75	Vybraný MAS	3.029.875,85Kč
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012313	Obec Trusnov	Zvýšení bezpečnosti v obci Trusnov, 2. etapa	Trusnov	65	Vybraný MAS	947.605,79Kč
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012291	Obec Horní Ředice	Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Horní Ředice rekonstrukcí chodníků podél silnice III/3051	Horní Ředice	60	Vybraný MAS	1.071.940,10Kč

Výběrová komise zasedala v termínech 13.11.2019 a 20.11.2019. Žádosti splnily minimální bodovou hranici. Programový výbor rozhodl 11.12.2019 o schválení všech projektů, které prošly hodnocením s kladným výsledkem.

Dne 17.12.2019 byly žádosti o podporu předány na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.

Tabulka 11 – Parametry schválených žádostí o dotaci v rámci 6. výzvy MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2019)

Opatření 2 - Bezpečnost silničního provozu	Měrná jednotka	Hodnota
Počet schválených projektů celkem	Počet	4
Počet projektů týkající se chodníků nebo stezek pro pěší	Počet	4
Počet projektů řešících místa pro přecházení	Počet	2
Počet projektů týkající se realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy	Počet	0
Počet projektů, jež zajišťují přístup k centru, či občanské vybavenosti	Počet	4
Počet projektů šetrných k životnímu prostředí	Počet	3
Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela cílová skupina	Počet	4
Délka nově vybudovaných chodníků nebo stezek pro pěší	m	81,00
Délka zrekonstruovaných chodníků nebo stezek pro pěší	m	1.290,16
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x: do 500 obyvatel,</li> <li>• 2x: 501 – 2.000 obyvatel.</li> </ul>
Typ žadatele	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4x Obce a jejich organizace</li> </ul>
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	35,79%

#### 2.1.4. Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020

**Vyhlášení výzvy:** 4.6.2019

**Příjem žádostí:** 4.6.2019 – 31.10.2019

Původní termín příjmu žádostí byl v průběhu výzvy prodloužen z 12.9.2019 do 31.10.2019. Důvodem byl přesun termínu výzvy POV Pardubického kraje z 9/2019 do 12/2019.

**Podporované oblasti:** Obnova a údržba občanské vybavenosti (radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, hřiště, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, ostatní), Obnova a údržba venkovského prostoru, Obnova a údržba sportovních zařízení, Obnova a údržba sakrálních staveb, Podpora péče o krajinu, apod.

**Finanční alokace:** 350.000,-Kč

Tabulka 12 – Finanční alokace výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020

Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020	Finanční alokace výzvy	Počet přijatých projektů	Výše požadované dotace	Počet schválených projektů	Výše schválené dotace
Obnova a údržba občanské vybavenosti, venkovského prostoru, sportovních zařízení, sakrálních staveb a podpora péče o krajinu	350.000,00 Kč	13	455.000,- Kč	10	350.000,- Kč

**Průběh výzvy:** V průběhu výzvy bylo přijato celkem 13 žádostí o podporu. Celková požadovaná výše příspěvku činila 455.000,-Kč, což bylo o 105 tis. Kč více, než umožňovala výzva POV PK. Všechny žádosti prošly kontrolou formálních náležitostí s kladným výsledkem.

Tabulka 13 – Přijaté žádosti o dotaci v rámci výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020

Registrační číslo žádosti	Název žadatele	Název projektu	Místo realizace projektu (NUTS 5)	Počet bodů	Status	Výše schválené dotace
ML-2019/9	Obec Uhersko	Tvořivá dílnička s Ferdou aneb Ferda keramik	Uhersko	50	Vybraný MAS	35.000,-Kč
ML-2019/6	Tělovýchovná jednota Sokol Horní Ředice, spolek	Pořízení ozvučovací a projekční techniky	Horní Ředice	45	Vybraný MAS	35.000,-Kč
ML-2019/10	Spolek rodičů a přátel LMŠ Hlubáček	Obnova a údržba venkovní terasy	Holice	40	Vybraný MAS	35.000,-Kč
ML-2019/2	Obec Vysoké Chvojno	Dětské hřiště u fotbalového hřiště	Vysoké Chvojno	40	Vybraný MAS	35.000,-Kč
ML-2019/3	Obec Jaroslav	Osvětlení víceúčelového hřiště Jaroslav	Jaroslav	40	Vybraný MAS	35.000,-Kč
ML-2019/7	Obec Chvojenec	Modernizace prostor v MŠ Chvojenec	Chvojenec	35	Vybraný MAS	35.000,-Kč
ML-2019/8	Obec Dolní Ředice	Oprava povrchu, oplocení a osvětlení umělého hřiště	Dolní Ředice	35	Vybraný MAS	35.000,-Kč

Registrační číslo žádosti	Název žadatele	Název projektu	Místo realizace projektu (NUTS 5)	Počet bodů	Status	Výše schválené dotace
ML-2019/12	Obec Poběžovice u Holic	Oprava veřejného prostranství Poběžovice u Holic - plocha u hospody	Poběžovice u Holic	30	Vybraný MAS	35.000,-Kč
ML-2019/4	Obec Radhošť	Obnova a údržba venkovského parku před bytovkou a částí prostranství bývalého obchodu v obci Radhošť	Radhošť	30	Vybraný MAS	35.000,-Kč
ML-2019/13	Město Holice	Oprava oplocení antukových kurtů - TK Holice	Holice	30	Vybraný MAS	35.000,-Kč
ML-2019/11	Tělocvičná jednota Sokol Holice	Oprava prostorů kotelny a výměna basketbalových košů	Holice	30	Náhradník	35.000,-Kč
ML-2019/1	Obec Býšť	Hoděšovice - Oprava oplocení pomníku padlých	Býšť	25	Náhradník	35.000,-Kč
ML-2019/5	Obec Horní Ředice	Horní Ředice	Chvojenec	25	Náhradník	35.000,-Kč

Výběrová komise zasedla v termínu 13.11.2019. Ta obodovala jednotlivé projekty a seřadila je sestupně dle získaných preferenčních kritérií, dle počtu dosud podpořených žádostí z předchozích výzev Malého LEADERu a dle data a času podání žádosti na MAS. Dne 11.12.2019 proběhnu Programový výbor MAS Holicko, který schválil pořadí projektů a rozhodl o zařazení prvních 10 projektů do žádosti MAS Holicko do POV PK. S tím, že další 3 projekty byly schváleny jako náhradníci pro případ, že by se některý z vybraných projektů nerealizoval (např. z důvodu odstoupení žadatele). Výběr případného náhradníka bude probíhat dle pořadí uvedeném v tabulce výše.

Dne 17.12.2019 byly všechny vybrané a náhradní žádosti o podporu předány na Pardubický kraj ke schválení.

Tabulka 14 – Parametry schválených žádostí o dotaci v rámci výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020

Malý LEADER Pro Holicko	Měrná jednotka	Hodnota
Počet schválených projektů celkem	Počet	10
Počet projektů zaměřených na zařízení pro spolkovou činnost	Počet	2
Počet projektů zaměřených na obnovu sportovního zařízení	Počet	3
Počet projektů zaměřených na obnovu multifunkčního zařízení	Počet	0
Počet projektů zaměřených na obnovu kulturního zařízení	Počet	0
Počet projektů zaměřených na obnovu sakrálních staveb a památek	Počet	0
Počet projektů zaměřených na obnovu MŠ	Počet	2
Počet projektů zaměřených na obnovu dětského hřiště	Počet	1
Počet projektů zaměřených na úpravu veřejného prostranství	Počet	2
Počet projektů zaměřených na podporu péče o krajinu	Počet	0
Počet projektů, jejichž výstupy podpoří komunitní život v obci (např. spolková činnost)	Počet	9
Počet projektů, jejichž výstupy podpoří práci s dětmi	Počet	8
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5x: do 500 obyvatel,</li> <li>• 3x: 501 – 2.000 obyvatel,</li> <li>• 2x: Nad 5.000 obyvatel.</li> </ul>

Malý LEADER Pro Holicko	Měrná jednotka	Hodnota
Typ žadatele	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8x: Obce a jejich organizace,</li> <li>• 2x: NNO</li> </ul>
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	62,95%

## 2.2. Průběh administrace výzev

Následující tabulka shrnuje administraci všech výzev MAS Holicko vyhlášených od začátku realizace Strategie CLLD, tj. od 18.8.2016. Samostatně je zde vypíchnut sledovaný rok 2019. V tabulce je možné vyčíst, kolik žádostí o podporu bylo přijato a hodnoceno, kolik jich bylo schváleno, kolik jich je v realizaci, apod.

V období 2016 – 2019 proběhly každoročně 4 výzvy pro předkládání žádostí o dotaci (1x programový rámec PRV, 2x programový rámec IROP a 1x Malý LEADER pro Holicko).

Letos jsme hodnotili 30 nových projektů (administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti, věcné hodnocení), z toho 17 projektů bylo z výzev pro programové rámce PRV a IROP. Dalších 28 projektů bylo v realizaci (18 projektů z výzev pro prog. rámce). U těchto projektů jsme přijali 30 hlášení o změně, 23 monitorovacích zpráv a 21 žádostí o proplacení.

Tabulka 15 – Průběh administrace výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 - 2019

Průběh administrace výzev	Rok 2019			Celkem 2016 - 2019
	Výzvy prog.rámců PRV a IROP	Výzvy Malý LEADER	Celkem rok 2019	
Počet podaných projektů	17	13	30	90
Počet projektů vyřazených ve formálním hodnocení	3	0	3	5
Počet projektů vyřazených ve věcném hodnocení	0	0	0	0
Počet vybraných projektů	14	10	24	72
Počet náhradníků	0	3	3	3
Počet podaných odvolání na MAS	0	0	0	0
Počet vyřazených projektů ŘO	0	0	0	0
Počet podaných odvolání na ŘO	1	0	1	1
Počet projektů s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace	16	10	26	52
Počet projektů v realizaci (neukončené k 31.12. daného roku)	14	10	24	29
Počet podaných Hlášení o změnách	30	0	30	38
Počet podaných Monitorovacích zpráv	23	0	23	31
Kontrola na místě realizace projektu	17	0	17	35
Počet podaných Závěrečných Žádostí o proplacení	11	10	21	41
Počet projektů v době udržitelnosti (k 31.12. daného roku)	7	0	7	15

## 2.3. Kategorie schválených žadatelů


Níže uvedená tabulka uvádí kategorie žadatelů, kteří projekt podali a kteří byli schválení v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených od začátku realizace Strategie CLLD, tj. od 18.8.2016. Samostatně je zde uveden právě sledovaný rok 2019.

Ze zjištěných výsledků je patrné, že nejvíce schválených žadatelů jsou obce (62,5 %). Ostatních typů žadatelů je podstatně méně: podnikatelské subjekty - 15,3%, zemědělci - 13,9% a NNO - 8,3%.

V případě srovnání částek schválené dotace to vypadá obdobně: obce získaly 69,6% dotace, podnikatelské subjekty 16,7% a zemědělci 13,0%. Rozdíl je ale u NNO, které získaly pouhých 0,7% dotace, a to i přesto, že počet schválených projektů je podobný jako u podnikatelů a zemědělců. Rozdíl je způsoben tím, že NNO mohou víceméně žádat pouze v rámci výzev Malého LEADERu, kde je maximální výše dotace pouze 35 tis. Kč. Ostatní kategorie žadatelů (podnikatelé, zemědělci, obce) mají průměrnou výši schválené dotace mezi 371 - 522 tis. Kč. Obce ve výzvách mimo Malý LEADER mají průměrnou výši schválené dotace 660 tis. Kč

Tabulka 16 – Kategorie schválených žadatelů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2019

Monitoring typu schválených žadatelů	Rok 2019			Celkem 2016 - 2019	%
	Výzvy prog.rámčů PRV a IROP	Výzvy Malý LEADER	Celkem rok 2019		
Stát a jeho organizace	0	0	0	0	0%
Obce, svazky obcí nebo jejich organizace	8.014.932,24Kč (6 projektů)	280.000,-Kč (8 projektů)	8.294.932,24Kč (14 projektů)	21.801.934,21Kč (45 projektů)	69,61%
Círky a jejich organizace	0	0	0	0	0%
Nestátní neziskové organizace	0	70.000,-Kč (2 projekty)	70.000,-Kč (2 projekty)	209.350,-Kč (6 projektů)	0,67%
Zemědělci	95.000,-Kč (1 projekt)	0	95.000,-Kč (1 projekt)	5.222.708,-Kč (10 projektů)	16,68%
Podnikatelské subjekty	3.048.729,-Kč (7 projektů)	0	3.048.729,-Kč (7 projektů)	4.085.000,-Kč (11 projektů)	13,04%
<b>Celkem</b>	<b>11.158.661,24Kč (14 projektů)</b>	<b>350.000,-Kč (10 projektů)</b>	<b>11.508.661,24Kč (24 projektů)</b>	<b>31.318.992,21Kč (72 projektů)</b>	<b>100%</b>

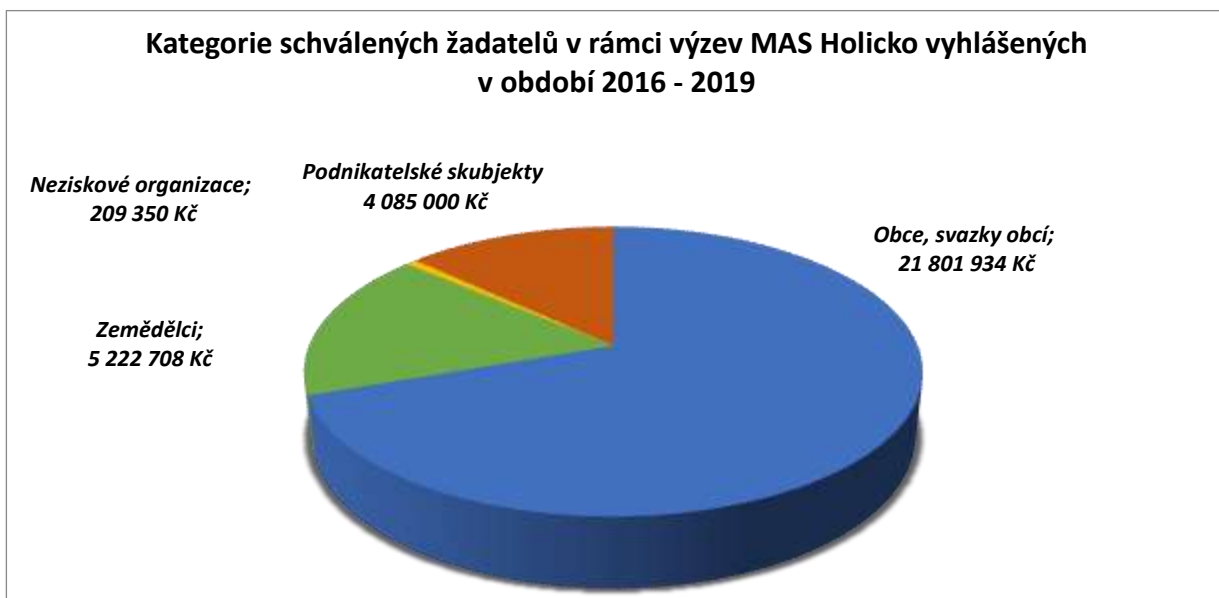

## 2.4. Místa realizace schválených projektů

Následující tabulka uvádí místa realizace schválených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených od začátku realizace Strategie CLLD, tj. od 18.8.2016.


Počet míst realizace neodpovídá zcela přesně počtu schválených projektů, neboť některé projekty jsou realizovány na více místech (oplocenky).

Jak je vidět, daří se nám pokrýt skoro celé území MAS. Zatím jediná obec, která nevyužila dotací MAS Holicko je obec Týništko. Dále nejméně čerpají obce Radhošť, Nová Ves, Vysoké Chvojno a Uhersko. Naopak nejvíce peněz poputuje do obcí Horní Ředice, Dolní Roveň, Ostřetín, Chvojenec a Horní Jelení.


Tabulka 17 – Místa realizace schválených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2019

Místo realizace schválených projektů	Rok 2019			Celkem 2016 - 2019	%
	Výzvy prog.rámců PRV a IROP	Výzvy Malý LEADER	Celkem rok 2019		
Býšť	0	0	0	2.083.989,94Kč (4,31 projekty)	6,65%
Dolní Roveň	450.000,-Kč (1 projekt)	0	450.000,-Kč (1 projekt)	4.509.574,71Kč (5 projektů)	14,40%
Dolní Ředice	0	35.000,-Kč (1 projekt)	35.000,-Kč (1 projekt)	2.185.237,72 Kč (6 projektů)	6,98%
Holice	265.189,-Kč (2 projekty)	70.000,-Kč (2 projekty)	335.189,-Kč (4 projekty)	1.098.870,60Kč (9 projektů)	3,51%
Horní Jelení	1.504.154,-Kč (1 projekt)	0	1.504.154,-Kč (1 projekt)	3.476.824,30Kč (5 projektů)	11,10%
Horní Ředice	3.406.163,95Kč (4 projekty)	35.000,-Kč (1 projekt)	3.441.163,95Kč (5 projektů)	4.692.830,60Kč (9 projektů)	14,98%
Chvojenec	3.124.875,85Kč (2 projekty)	35.000,-Kč (1 projekt)	3.159.875,85Kč (3 projekty)	4.009.110,29Kč (8,06 projektů)	12,80%
Jaroslav	0	35.000,-Kč (1 projekt)	35.000,-Kč (1 projekt)	955.378,23Kč (3 projekty)	3,05%
Ostřetín	240.187,-Kč (1 projekt)	0	240.187,-Kč (1 projekt)	4.402.060,62Kč (9 projektů)	14,06%
Poběžovice u Holic	899.550,-Kč (1 projekt)	35.000,-Kč (1 projekt)	934.550,-Kč (2 projekty)	1.084.336,73Kč (2,68 projekty)	3,46%
Radhošť	0	35.000,-Kč (1 projekt)	35.000,-Kč (1 projekt)	70.000,-Kč (2 projekty)	0,22%
Trusnov	947.605,79Kč (1 projekt)	0	947.605,79Kč (1 projekt)	2.021.889,14Kč (3 projekty)	6,46%
Týništko	0	0	0	0	0%
Uhersko	320.935,65Kč (1 projekt)	35.000,-Kč (1 projekt)	355.935,65Kč (2 projekty)	355.935,65Kč (2 projekty)	1,14%
Vysoké Chvojno	0	35.000,-Kč (1 projekt)	35.000,-Kč (1 projekt)	199.768,34Kč (2,61 projekty)	0,64%
Nová Ves	0	0	0	173.185,35Kč (1,34 projektu)	0,55%
<b>Celkem</b>	<b>11.158.661,24Kč (14 projektů)</b>	<b>350.000,-Kč (10 projektů)</b>	<b>11.508.661,24Kč (24 projektů)</b>	<b>31.318.992,21Kč (72 projektů)</b>	<b>100%</b>

### Místa realizace schválených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených období 2016 - 2019

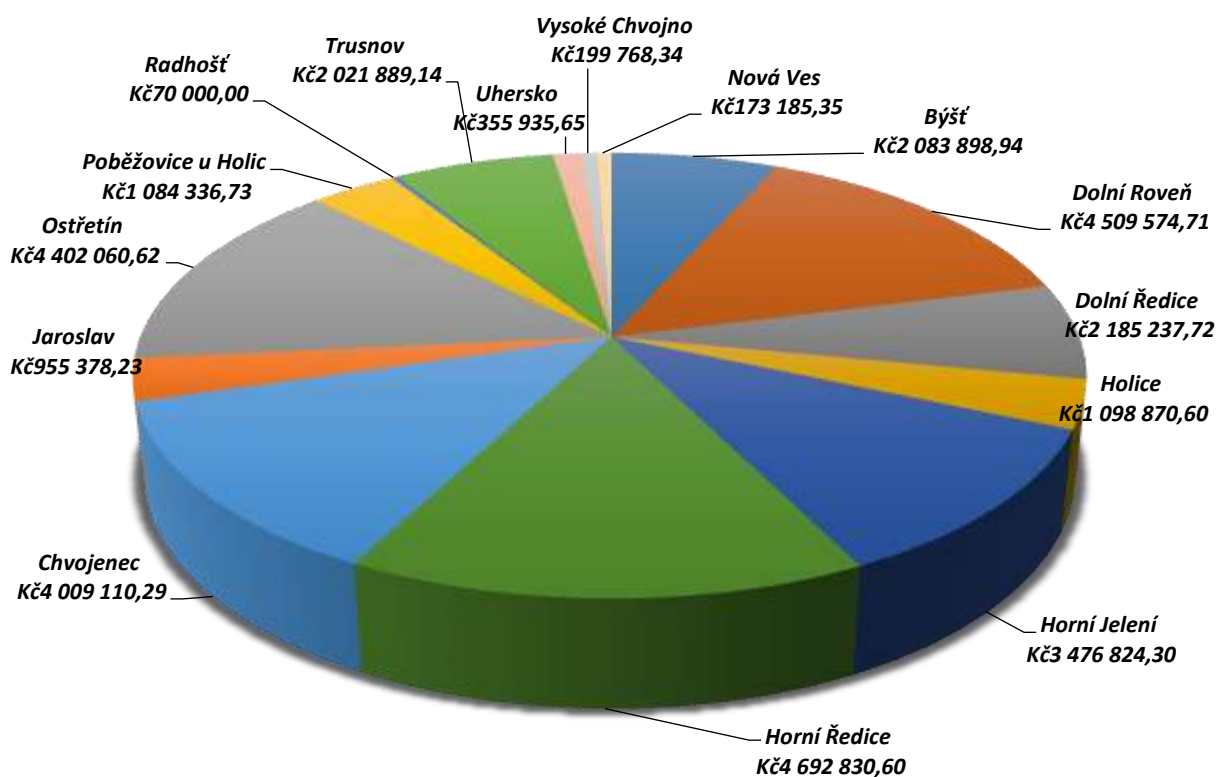

### Místa realizace schválených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 - 2019 dle kategorií žadatelů

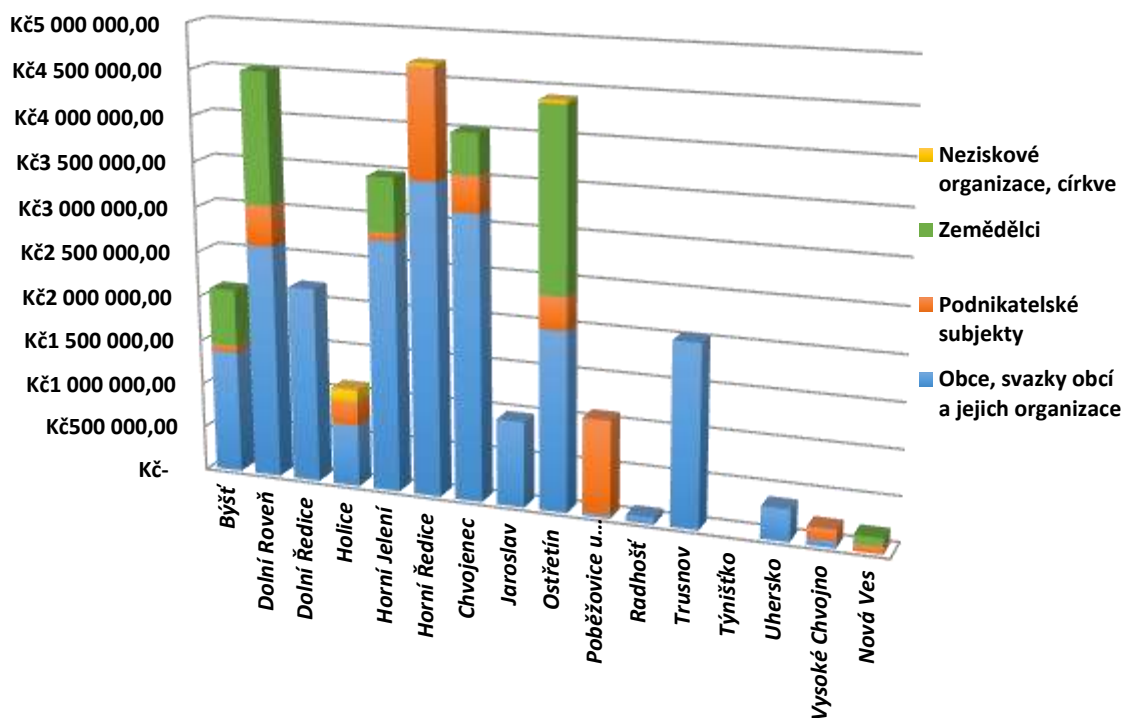



### 3. Věcný pokrok v plnění cílů strategie CLLD

Ve sledovaném období bylo 28 projektů v realizaci, z toho 18 projektů z výzev programových rámců PRV a IROP. 11 projektů z výzev programových rámců podalo závěrečnou žádost o proplacení. 10 projektů z výzvy Malého LEADERu podalo závěrečné vyúčtování.

K 31.12.2019 bylo celkem v udržitelnosti 15 projektů z programových rámců, z toho 7 projektů přešlo do udržitelnosti v roce 2019.

#### 3.1. Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce PRV

Dosavadní plnění SCLLD ve vztahu k jednotlivým Fichím Programového rámce PRV probíhalo následovně:

**Fiche 1.- Podpora zemědělských podniků:** Na tuto Fichi byly vyhlášeny 2 výzvy (2017 a 2018). 5 projektů je v udržitelnosti (4.319.190,-Kč), z toho 2 projekty přešly do tohoto stavu v letošním roce. Poslední 1 projekt (525.000,-Kč) je stále v realizaci. Vyhlášení další výzvy se již neplánuje.

Na základě výsledků šetření v rámci mid-term evaluace bylo rozhodnuto o snížení alokace této fiche o 273.742,- Kč (méně než 6%) ve prospěch nově vytvořené Fiche 7. Důvody byly následující: Zazávazkování více jak 71% celkové alokace programového rámce, která již nelze navýšit. Zbytková část alokace této Fiche, která je výrazně nižší než obvyklá výše požadované podpory. Diskuse v území ohledně nově otevřených možností v programovém rámci PRV (podpora NNO prostřednictvím článku 20).

**Fiche 2.- Podpora potravinářských podniků:** Na tuto Fichi byly vyhlášeny 2 výzvy (2018 a 2019). 2 projekty jsou v udržitelnosti (377.197,-Kč). Oba dva projekty přešly do tohoto stavu v letošním roce. 1 projekt (89.140,-Kč) podal žádost o proplacení. Další 2 projekty (335.187,-Kč) jsou stále v realizaci. Vyhlášení další výzvy se již neplánuje.

Na základě výsledků šetření v rámci mid-term evaluace bylo rozhodnuto o snížení celkové alokace o 166.663,- Kč (cca 17%) ve prospěch nově vytvořené Fiche 7. Důvody byly následující: Zazávazkování více jak 71% celkové alokace programového rámce, která již nelze navýšit. Zbytková část alokace této Fiche, která je výrazně nižší než obvyklá výše požadované podpory. Diskuse v území ohledně nově otevřených možností v programovém rámci PRV (podpora NNO prostřednictvím článku 20).

**Fiche 3 – Podpora malých podniků:** Na tuto Fichi byly vyhlášeny 3 výzvy (2017, 2018 a 2019). 1 projekt přešel v roce 2019 do stavu udržitelnosti (387.900,-Kč). 2 projekty (263.741,-Kč) podaly žádost o proplacení. 1 projekt (81.810,-Kč) je stále v realizaci. Další 4 projekty (2.539.303,-Kč) jsou v procesu závěrečného ověření SZIF - těsně před podpisem Dohody o poskytnutí dotace. V 1/2020 byla vyhlášena další výzva na zbývající část finanční alokace.

**Fiche 4 – Ochrana lesních porostů:** Na tuto Fichi byly vyhlášeny 3 výzvy (2017, 2018 a 2019). Oba dva podané projekty jsou v udržitelnosti (382.746,-Kč), z toho 1 projekt přešel do tohoto stavu v letošním roce. Vyhlášení další výzvy se již neplánuje.

Na základě výsledků šetření v rámci mid-term evaluace bylo rozhodnuto o snížení celkové alokace o 786.628,- Kč (cca 64,6%) ve prospěch Fiche 5 (675.600,-Kč) a Fiche 7 (111.028,-Kč). Důvodem byl nezáměr o tuto Fichi kvůli nepředvídatelné změně klimatických (suché počasí), ekologických (kůrovcová kalamita) a ekonomických podmínek (nízká cena dřeva).

**Fiche 5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům:** Na tuto Fichi byly vyhlášeny 2 výzvy (2018 a 2019). V roce 2018 se do výzvy nepřihlásil žádný projekt. V roce 2019 byla do výzvy podána 1 žádost, která ale byla vyřazena při formálním hodnocení.

Na základě výsledků šetření v rámci mid-term evaluace bylo rozhodnuto o navýšení celkové alokace o 675 600,- Kč (cca 222%). Důvodem bylo zjištění, že se v území připravují akce o vyšší finanční náročnosti oproti plánované celkové alokaci této Fiche. Fiche byla navýšena na úkor Fiche 4, která je zaměřena na stejný typ žadatelů, ale už o ní díky nepředvídatelným okolnostem není zájem. V 1/2020 byla vyhlášena další výzva na zbývající část finanční alokace.

Sice došlo k výraznému ponížení alokace Fiche 4 (o cca 64,6%), ale na druhou stranu došlo i k výraznému navýšení Fiche 5 (o cca 222%). Obě tyto Fiche jsou navázány na stejný článek Programu rozvoje venkova 25 týkající se lesnických opatření. Z tohoto pohledu došlo k ponížení všech lesnických Fichí souhrnně o pouhých 7,3%.

**Fiche 6 – Spolupráce místních akčních skupin:** V průběhu mid-term evaluace bylo provedeno šetření možných témat, která umožňují Pravidla PRV a zájmu případných partnerských MAS o tuto Fichi. Na základě výsledků bylo rozhodnuto o převodu veškerých finančních prostředků (580.940,-Kč) do potřebnější Fiche 7.

**Fiche 7 - Podpora spolkového života:** V roce 2019 byla vytvořena nová Fiche 7. Její potřebnost vyplynula z mid-term evaluace – na jednání fokusní skupiny, bylo uvedeno, že v rámci SCLLD jsou podporovány pouze obce a podnikatelé, ale nejsou vůbec podporovány NNO. Z tohoto důvodu je tato Fiche zaměřena pouze na oblast f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, kde budou preferovány projekty se zaměřením na podporu činnosti spolkových a neziskových organizací.

V 1/2020 byla vyhlášena výzva na celou její finanční alokaci.

Tabulka 18 – Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce PRV k 31.12.2019

Věcný pokrok v plnění cílů programového rámce PRV	1 - Podpora zemědělských podniků	2 - Podpora potravinářských podniků	3 - Podpora malých podniků	4 - Ochrana lesních porostů	5 - Zpřístupnění lesa návštěvníkům	6 - Spolupráce MAS	7 - Podpora spolkového života	Celkem Programový rámec PRV
Finanční alokace pro celé období uvedená v SCLLD	4.657.458,-Kč	807.397,-Kč	4.748.560,-Kč	430.972,-Kč	980.000,-Kč	0Kč	1.132.373,-Kč	12.756.760,-Kč
Vyhlášená alokace	3.031.207,-Kč	912.850,-Kč	8.097.138,-Kč	1.526.663,-Kč	608.790,-Kč	0Kč	0Kč	14.176.648,-Kč
Počet podaných projektů	7	5	12	2	1	0	0	27
Výše požadované dotace (Žádost o dotaci)	5.532.708,-Kč	907.397,-Kč	4.016.252,-Kč	439.351,-Kč	0Kč	0Kč	0Kč	10.895.708,-Kč
Počet schválených projektů	6	5	8	2	0	0	0	21

Věcný pokrok v plnění cílů programového rámce PRV	1 - Podpora zemědělských podniků	2 - Podpora potravinářských podniků	3 - Podpora malých podniků	4 - Ochrana lesních porostů	5 - Zpřístupnění lesa návštěvníkům	6 - Spolupráce MAS	7 - Podpora spolkového života	Celkem Programový rámec PRV
Výše schválené dotace ( <i>Dohoda o poskytnutí dotace</i> )	4.409.583,-Kč	801.524,-Kč	733.451,-Kč	382.746,-Kč	0Kč	0Kč	0Kč	6.327.304,-Kč
Počet podpořených projektů	5	2	1	2	0	0	0	10
Výše proplacené dotace	3.884.583,-Kč	377.197,-Kč	387.900,-Kč	382.746,-Kč	0Kč	0Kč	0Kč	5.032.426,-Kč
Výše sankcí a korekcí	247.875,-Kč	0Kč	0Kč	0Kč	0Kč	0Kč	0Kč	247.875,-Kč

### 3.1.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce PRV

Ve sledovaném období 9 projektů z Programového rámce PRV podalo závěrečnou žádost o proplacení. Konkrétně se jednalo o 6 projektů z výzvy č. 3-PRV a 3 projekty z výzvy č. 5-PRV.

Z toho 6 projektů bylo proplaceno. Jednalo se o projekty z výzvy č.3-PRV: 2 projekty z Fiche 1, 2 projekty z Fiche 2, 1 projekt z Fiche 3 a 1 projekt z Fiche 4.

Tabulka 19 – Podpořené projekty v rámci Programového rámce PRV v roce 2019

Fiche	Registrační číslo	Žadatel	Název projektu	Místo realizace	Poskytnutá dotace	Proplacení projektu
<b>Výzva č. 3 - PRV</b>						
1	18/003/19210/452/088/001414	Jiří Motyčka	Rozvoj ovčí farmy - pastevní areál	Nová Ves	94.380,-Kč	30.7.2019
1	18/003/19210/453/088/001454	Zemědělská společnost Ostřetín, a.s.	Moderní technika v zemědělství	Ostřetín	743.625,-Kč	29.10.2019
2	18/003/19210/453/088/001972	Věra Skutilová	Nákup dopravního prostředku na rozvoz brambor	Chvojenec	250.000,-Kč	10.6.2019
2	18/003/19210/453/088/001453	Vladimíra Krejčíková	Výrobní pro ZEGITU	Ostřetín	127.197,-Kč	22.7.2019
3	18/003/19210/453/088/001451	Antonín Jablonský	Modernizace a rozšíření vybavení pro zajišťování cateringových služeb	Chvojenec	387.900,-Kč	29.10.2019
4	18/003/19210/453/088/001452	"Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o."	Ochrana MZD oplocením MAS 2	Vysoké Chvojno, Poběžovice, Býšť, Nová Ves	196.014,-Kč	26.11.2019

Všechny projekty až na jeden byly bez uložení sankce/korekce. Korekce dotace byla uložena pouze projektu Zemědělské společnosti Ostřetín, a.s. s názvem „Moderní technika v zemědělství“ ve výši 25% (247.875,-Kč) z důvodu chybně provedeného výběrového řízení. Tato částka se poté vrátila zpět do volné finanční alokace Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků.

Všechny projekty dodržely indikátory a preferenční kritéria, ke kterým se zavázaly.

Níže uvedené tabulky shrnují parametry, které MAS Holicko sleduje u podpořených projektů, pro každou Fichi zvlášť. Jsou zde uvedeny souhrnně všechny projekty, které byly realizovány od začátku realizace Strategie CLLD, tj. od 18.8.2016. Samostatně je zde uveden právě sledovaný rok 2019.

Můžeme konstatovat, že v rámci Fiche 1 bylo prozatím podpořeno 5 projektů, z toho 4x se podpora týkala živočišné výroby a 1x rostlinné výroby. 3 projekty byly zaměřeny na nákup mobilních strojů pro zemědělskou výrobu. 3 projekty byly inovativního charakteru a 3 projekty byly šetrné k životnímu prostředí. Díky realizaci projektu bylo vytvořeno 1,0 pracovního místa.

V případě podrobnějšího pohledu na žadatele je dobré zmínit, že byly podpořeny 2 začínající podnikatelé a 1x byla žadatelem žena, 1 žadatel byl podpořen dokonce dvakrát (Zemědělská společnost Ostřetín, a.s.).

Tabulka 20 – Parametry podpořených projektů Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2019

Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků	Měrná jednotka	Hodnota	
		Rok 2019	Celkem 2016 - 2019
Počet podpořených projektů celkem	Počet	2	5
Počet podpořených žadatelů celkem	Počet	2	4
Počet projektů týkající se živočišné výroby	Počet	1	4
Počet projektů týkající se rostlinné výroby nebo školkařské produkce	Počet	1	1
Počet projektů týkající se pořízení peletovacího zařízení	Počet	0	0
Počet projektů týkající se pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu	Počet	1	3
Počet inovativních projektů	Počet	1	3
Počet projektů šetrných k životnímu prostředí	Počet	1	3
Počet projektů využívajících stávající zařízení a objekty	Počet	2	5
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	Pracovní místa	1	1
Modernizace nevyužitých prostor	m <sup>2</sup>	0	0
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x: do 500 obyvatel,</li> <li>• 1x: 501 – 5.000 obyvatel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x: do 500 obyvatel,</li> <li>• 4x: 501 – 5.000 obyvatel.</li> </ul>
Typ žadatele	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Zemědělec – PO (střední podnik),</li> <li>• 1x Zemědělec – FO (mikropodniky).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x Zemědělec – PO (střední podnik),</li> <li>• 3x Zemědělec – FO (mikropodniky).</li> </ul>
Počet začínajících podnikatelů	Žadatel	1	2
Počet žen (v případě FO)	Žadatel	0	1
Počet držitelů regionální značky „KRAJ PERŠTEJNŮ regionální produkt“	Žadatel	0	0
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	54,69%	56,82%

V rámci Fiche 2 byly prozatím podpořeny pouze 2 projekty zaměřené na výrobu potravin. 1 projekt se týkal investice do zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů. 1 projekt byl inovativního charakteru a 1 projekt byl šetrný k životnímu prostředí. Zatím nebylo vytvořeno žádné pracovní místo.

V případě podrobnějšího pohledu na žadatele je dobré zmínit, že byli podpořeni 2 začínající podnikatelé. V obou případech se jednalo o ženy. V jednom případě díky realizaci projektu vzniklo nové živnostenské oprávnění.

Tabulka 21 – Parametry podpořených projektů Fiche2 – Podpora potravinářských podniků v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2019

Fiche 2 – Podpora potravinářských podniků	Měrná jednotka	Hodnota	
		Rok 2019	Celkem 2016 - 2019
Počet podpořených projektů celkem	Počet	2	2
Počet podpořených žadatelů celkem	Počet	2	2
Počet projektů týkající se výroby potravin	Počet	2	2
Počet projektů týkající se výroby krmiv	Počet	0	0
Počet projektů, jejichž součástí je investice do zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů	Počet	1	1
Počet inovativních projektů	Počet	1	1
Počet projektů šetrných k životnímu prostředí	Počet	1	1
Počet projektů využívajících stávající zařízení a objekty	Počet	2	2
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	Pracovní místa	0	0
Modernizace nevyužitých prostor	m <sup>2</sup>	0	0
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	• 2x: 501 – 5.000 obyvatel.	• 2x: 501 – 5.000 obyvatel.
Typ žadatele	-	• 1x Zemědělec – FO (mikropodniky), • 1x Podnikatel – FO (mikropodniky).	• 1x Zemědělec – FO (mikropodniky), • 1x Podnikatel – FO (mikropodniky).
Počet začínajících podnikatelů	Žadatel	2	2
Počet žen (v případě FO)	Žadatel	2	2
Počet držitelů regionální značky „KRAJ PERŠTEJNŮ regionální produkt“	Žadatel	0	0
Počet nově vzniklých živnostenských oprávnění	Živnostenské oprávnění	1	1
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	62,26%	62,26%

V rámci Fiche 3 byl prozatím podpořen pouze 1 projekt, který byl zaměřen na CZ-NACE I - Ubytování, stravování a pohostinství. Žadatel s v rámci realizace projektu zavázal k vytvoření 1,00 pracovního místa, a to do 29.4.2020.

Tabulka 22 – Parametry podpořených projektů Fiche3 – Podpora malých podniků v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2019

Fiche 3 – Podpora malých podniků	Měrná jednotka	Hodnota	
		Rok 2019	Celkem 2016 - 2019
Počet podpořených projektů celkem	Počet	1	1
Počet podpořených žadatelů celkem	Počet	1	1
Ekonomická činnost žadatele	-	• 1x I – Ubytování, stravování a pohostinství.	• 1x I – Ubytování, stravování a pohostinství.
Počet inovativních projektů	Počet	0	0
Počet projektů šetrných k životnímu prostředí	Počet	0	0
Počet projektů zlepšujících základní vybavení nebo služby v obci	Počet	0	0
Počet projektů využívajících stávající zařízení a objekty	Počet	1	1
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	Pracovní místa	1	1
Modernizace nevyužitých prostor	m <sup>2</sup>	0	0
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	• 1x: 501 – 5.000 obyvatel.	• 1x: 501 – 5.000 obyvatel.
Typ žadatele	-	• 1x Podnikatel – FO (mikropodnik).	• 1x Podnikatel – FO (mikropodnik).
Počet začínajících podnikatelů	Žadatel	0	0
Počet žen (v případě FO)	Žadatel	0	0
Počet držitelů regionální značky „KRAJ PERŠTEJNŮ regionální produkt“	Žadatel	0	0
Počet nově vzniklých živnostenských oprávnění	Živnostenské oprávnění	0	0
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	60,88%	60,88%

V rámci Fiche 4 byly podpořeny 2 projekty. Jedná se již o finální verzi tabulky, protože již žádné projekty nejsou v realizaci a MAS neplánuje vyhlásit žádnou další výzvu. Oba dva projekty byly zrealizovány v hospodářských lesích, kde bylo oploceno 8,59 ha melioračních a zpevňujících dřevin. Průměrná výše finanční spoluúčasti byla 33,68%.

V případě podrobnějšího pohledu na žadatele je dobré zmínit, že se v obou případech jednalo o toho samého žadatele - Lesní družstvo Vysoké Chvojno, s.r.o. (společnost vlastněná obcemi).

Tabulka 23 – Parametry podpořených projektů Fiche 4 – Ochrana lesních porostů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2019

Fiche 4 - Ochrana lesních porostů	Měrná jednotka	Hodnota	
		Rok 2019	Celkem 2016 - 2019
Počet podpořených projektů celkem	Počet	1	2
Počet podpořených žadatelů celkem	Počet	1	1
Počet inovativních projektů	Počet	0	0
Počet projektů šetrných k životnímu prostředí	Počet	1	2
Počet projektů, jejichž místo realizace jsou lesy hospodářské	Počet	1	2

Fiche 4 - Ochrana lesních porostů	Měrná jednotka	Hodnota	
		Rok 2019	Celkem 2016 - 2019
Počet projektů, jejichž místo realizace jsou lesy zvláštního určení	Počet	0	0
Celková plocha	ha	3	8,59
Typ žadatele	-	• Podnikatel – PO (velký podnik)	• Podnikatel – PO (velký podnik)
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	17,36%	33,68%

V případě Fiche 5 ještě nebyl zrealizován žádný projekt.

Tabulka 24 – Parametry podpořených projektů Fiche5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2019

Fiche 5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům	Měrná jednotka	Hodnota	
		Rok 2019	Celkem 2016 - 2019
Počet podpořených projektů celkem	Počet	0	0
Počet podpořených žadatelů celkem	Počet	0	0
Počet projektů zaměřených na posílení rekreační funkce lesa (např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty, značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků)	Počet-	0	0
Počet projektů zaměřených na usměrňování návštěvnosti území (např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory)	Počet	0	0
Počet projektů zaměřených na údržbu lesního prostředí (např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně)	Počet	0	0
Počet inovativních projektů	Počet	0	0
Počet projektů šetrných k životnímu prostředí	Počet	0	0
Počet projektů zaměřených na regionální tematiku	Počet	0	0
Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela cílová skupina	Počet	0	0
Počet projektů, jejichž místo realizace jsou lesy zvláštního určení	Počet	0	0
Délka nově vybudovaných stezek pro turisty	m	0	0
Délka zrekonstruovaných stezek pro turisty	m	0	0
Počet herních, naučných a fitness prvků	ks	0	0
Počet odpočinkových stanovišť	ks	0	0
Počet přístřešků	ks	0	0
Počet informačních tabulí	ks	0	0
Typ žadatele	-	0	0
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	0	0

V případě Fiche 6 se jedná o finální verzi tabulky. V průběhu aktualizace Strategie CLLD po mid-term evaluaci bylo rozhodnuto, že projekty spolupráce MAS nebudou realizovány a veškeré finanční prostředky budou převedeny na Fichi 7.

Tabulka 25 – Parametry podpořených projektů Fiche 6 – Spolupráce MAS v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2019

Fiche 6 – Spolupráce MAS	Měrná jednotka	Hodnota	
		Rok 2019	Celkem 2016 - 2019
Počet podpořených projektů celkem	Počet	0	0
Počet podpořených žadatelů celkem	Počet	0	0
Počet projektů týkající se národní spolupráce	Počet	0	0
Počet projektů zaměřených na realizaci propagačních, informačních, vzdělávacích a volnočasových akcí	Počet	0	0
Počet projektů zaměřených na investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků a služeb	Počet	0	0
Počet projektů zaměřených na investice souvisejících se vzdělávacími aktivitami	Počet	0	0
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	0	0

V případě Fiche 7 ještě nebyl zrealizován žádný projekt.

Tabulka 26 – Parametry podpořených projektů Fiche 7 – Podpora spolkového života v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2019

Fiche 7 – Podpora spolkového života	Měrná jednotka	Hodnota	
		Rok 2019	Celkem 2016 - 2019
Počet podpořených projektů celkem	Počet	0	0
Počet podpořených žadatelů celkem	Počet	0	0
Počet projektů, jejichž výstupy budou sloužit pro více aktivit/účelů v obci	Počet	0	0
Počet projektů, jejichž výstupy jsou efektivně využívány: 30 – 49 hodin/rok	Počet	0	0
Počet projektů, jejichž výstupy jsou efektivně využívány: min 50 hodin/rok a více	Počet	0	0
Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela cílová skupina	Počet	0	0
Počet projektů, které podpořily činnost spolkových a neziskových organizací (NNO nebo církev a její organizace jsou buď žadatelem, nebo mají předmět realizace projektu v dlouhodobém pronájmu)	Počet	0	0
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	Pracovní místa	0	0
Velikost obce, kde je projekt realizován	Počet	0	0
Typ žadatele	Počet	0	0
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	0	0



### 3.1.2. Plnění indikátorového plánu Programového rámce PRV

Indikátorový plán uvedený ve Strategii CLLD je plněn, tak jak by měl. Je to způsobeno především jeho aktualizací, která proběhla v 8/2019.

Co se týče uzavřených Fichí 1, 2, 4 a 6 (Fiche, na které již MAS neplánuje vyhlásit výzvu), tak zde byl indikátorový plán nastaven dle závazků schválených projektů. To znamená, pokud nedojde k odstoupení některého projektu v průběhu jeho realizace, tak zde bude plnění v příštím roce 100%. V případě Fiche 4 splňujeme 100% již v letošním roce.

V případě Fiche 2, 5 a 7 byla v 1/2020 vyhlášena výzva, kde preferenční kritéria jednotlivých Fichí byla nastavena tak, aby vybrané projekty pokud možno umožnily naplnit indikátory na 100%.

Tabulka 27 – Plnění indikátorového plánu Programového rámce PRV uvedeného v SCLLD v období 2016 – 2019

Název indikátoru	Plán uvedený v SCLLD	Plnění		
		Rok 2019	Celkem 2016 - 2019	%
<b>Fiche 1 - Podpora zemědělských podniků</b>				
Počet podpořených podniků / příjemců	6	2	5	83,33%
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	1,5	1	1	66,67%
<b>Fiche 2 - Podpora potravinářských podniků</b>				
Počet podpořených podniků/příjemců	5	3	3	60,00%
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	1	0	0	0%
<b>Fiche 3 - Podpora malých podniků</b>				
Počet podpořených podniků / příjemců	11	3	3	27,27%
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	1	1	1	100%
<b>Fiche 4 - Ochrana lesních porostů</b>				
Počet podpořených operací (akcí)	2	1	2	100%
Celková plocha (ha)	8,59	3	8,59	100%
<b>Fiche 5 - Zpřístupnění lesa návštěvníkům</b>				
Počet podpořených operací (akcí)	2	0	0	0%
Celková plocha (ha)	12,69	0	0	0%
<b>Fiche 6 - Spolupráce místních akčních skupin</b>				
Celkové veřejné výdaje (O.1)	0	0	0	-
<b>Fiche 7 - Podpora spolkového života</b>				
Počet podpořených operací (akcí)	5	0	0	0%
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	0	0	0	-

### 3.1.3. Plnění finančního plánu Programového rámce PRV

Finanční plán uvedený ve Strategii CLLD MAS Holicko nebyl plněn dle původního předpokladu již od počátku realizace Strategie. Hlavním důvodem bylo zpoždění ve vyhlášení první výzvy (nemožnost vyhlásit výzvu v druhé polovině roku 2016), které se teď táhne celým obdobím. MAS Holicko se to sice snažila dohnat větší finanční alokací na jednotlivé vyhlášené Fiche, ale zase narazila na malou projektovou připravenost žadatelů a tím tedy i na zdánlivý nezáměr území, který se postupně daří bořit neustálou propagací MAS a jejích aktivit (prostřednictvím starostů a úspěšných žadatelů, tiskové zprávy v Holických listech, Zpravodaji Agrovenkova, na webu [www.holicko.cz](http://www.holicko.cz) a na facebooku).

Z tohoto důvodu byla po schválení mid-term evaluace Strategie CLLD v 6/2019 provedena aktualizace finančního plánu programového rámce PRV. Protože aktualizace proběhla v 8/2019, tak plnění odpovídá téměř nově nastavenému plánu. Drobný rozdíl v plnění (2,38%) je způsoben úsporou jednotlivých realizovaných žádostí, které prováděly výběrové řízení až ve druhé polovině roku 2019 (tj. až po provedení aktualizace SCLLD) a uloženou sankcí projektu Zemědělské společnosti Ostřetín.

Tabulka 28 – Plnění finančního plánu Programového rámce PRV uvedeného v SCLLD v období 2016 – 2019

FINANČNÍ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD – OBDOBÍ 2016 - 2019						
Opatření/Fiche SCLLD	PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)				Nezpůsobilé výdaje (Kč)	Kumulativní % čerpání alokace
	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
		Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje			
1. Podpora zemědělských podniků	8.908.457,-	2.980.772,-	1.676.686,-	4.250.999,-	1.901.459,-	100%
2. Podpora potravinářských podniků	1.874.441,-	516.734,-	290.663,-	1.061.044,-	222.180,-	100%
3. Podpora malých podniků	1.658.406,12	470.335,-	264.564,-	923.507,12	245.216,40	15,48%
4. Ochrana lesních porostů	617.704,-	275.821,-	155.151,-	186.732,-	51.290,-	100%
5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům	0	0	0	0	0	0%
6. Spolupráce místních akčních skupin	0	0	0	0	0	-
7. Podpora spolkového života	0	0	0	0	0	0%
<b>Celkem</b>	<b>13.059.008,12</b>	<b>4.243.662,-</b>	<b>2.387.064,-</b>	<b>6.428.282,12</b>	<b>2.420.145,40</b>	<b>51,98%</b>
SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ – OBDOBÍ 2016 - 2019						
Opatření/Fiche SCLLD	PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)				Nezpůsobilé výdaje (Kč)	Kumulativní % čerpání alokace
	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
		Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje			
1. Podpora zemědělských podniků	8.908.457,-	2.822.132,-	1.587.451,-	4.498.874,-	1.901.459,-	94,68%
2. Podpora potravinářských podniků	1.862.691,88	512.974,-	288.550,-	1.061.167,88	219.718,80	99,27%
3. Podpora malých podniků	1.655.189,12	469.408,-	264.043,-	921.738,12	257.316,40	15,45%
4. Ochrana lesních porostů	569.478,-	244.956,-	137.790,-	186.732,-	0	88,81%
5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům	0	0	0	0	0	0%
6. Spolupráce místních akčních skupin	0	0	0	0	0	-
7. Podpora spolkového života	0	0	0	0	0	0%
<b>Celkem</b>	<b>12.995.816,-</b>	<b>4.049.470,-</b>	<b>2.277.834,-</b>	<b>6.668.512,-</b>	<b>2.378.494,20</b>	<b>49,60%</b>
SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI S PLÁNEM – OBDOBÍ 2016 - 2019						
Opatření/Fiche SCLLD	PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					

	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce	Nezpůsobilé výdaje (Kč)	Kumulativní % čerpání alokace
		Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje			
1. Podpora zemědělských podniků	-	- 158.640,-	- 89.235,-	+ 247.875,-	-	- 5,32%
2. Podpora potravinářských podniků	- 11.749,12	- 3.760,-	- 2.113,-	- 5.876,-	- 2.461,20	- 0,73%
3. Podpora malých podniků	- 3.217,-	- 927,-	- 521,-	- 1.769,-	+ 12.100,-	- 0,03%
4. Ochrana lesních porostů	- 48.226,-	- 30.865,-	- 17.361,-	-	- 51.290,-	- 11,19%
5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům	-	-	-	-	-	-
6. Spolupráce místních akčních skupin	-	-	-	-	-	-
7. Podpora spolkového života	-	-	-	-	-	-
<b>Celkem</b>	<b>- 63.192,12</b>	<b>- 194.192,-</b>	<b>- 109.230,-</b>	<b>+ 240.229,88</b>	<b>- 41.651,20</b>	<b>- 2,38%</b>

\*Veškeré částky jsou v případě Programového rámce PRV počítány ze Žádostí o dotaci schválených SZIF do 31.12.2019

Pro rekapitulaci uvádíme, že v 10/2019 byla schválena změna finančního plánu programového rámce PRV jejímž obsahem byla jeho úprava dle skutečného čerpání v roce 2018 a dle zjištěných potřeb území z provedeného šetření v průběhu mid-term evaluace. Dále pak byla přidána nová Fiche 7 - Podpora spolkového života, na úkor jiných nevyužitých Fichí:

- Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků: původní alokace: 4.931.200,-Kč, nová alokace: 4.657.458,-Kč,
- Fiche 2 – Podpora potravinářských podniků: původní alokace: 974.060,-Kč, nová alokace: 807.397,-Kč,
- Fiche 3 – Podpora malých podniků: původní alokace: 4.748.560,-Kč, nová alokace: 4.748.560,-Kč,
- Fiche 4 – Ochrana lesních porostů: původní alokace: 1.217.600,-Kč, nová alokace: 430.972,-Kč,
- Fiche 5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům: původní alokace: 304.400,-Kč, nová alokace: 980.000,-č,
- Fiche 6 – Spolupráce místních akčních skupin: původní alokace: 580.940,-Kč, nová alokace: 0,- Kč,
- Fiche 7 – Podpora spolkového života: původní alokace: 0,-Kč, nová alokace: 1.132.373,-Kč,
- Celkem: původní alokace: 12.756.760,-Kč, nová alokace: 12.756.760,-Kč.

### 3.2. Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce IROP

Dosavadní plnění SCLLD ve vztahu k jednotlivým opatřením Programového rámce IROP probíhalo následovně:

**Opatření 1. – Vzdělávání:** Na toto opatření byly vyhlášeny 3 výzvy (2017, 2018 a 2019). 5 projektů je v realizaci (4.992.160,39Kč). Zbýlé 2 projekty (2.644.564,85Kč) jsou po schválení ze strany MAS na závěrečném ověření na CRR.

Vyhlášení další výzvy na toto opatření se již neplánuje. Důvodem je vyčerpání finanční alokace. Po schválení projektů z výzvy č.5-IROP na tomto opatření zbyla volná finanční alokace ve výši pouhých 47,76Kč. Valná hromada MAS Holicko proto na svém jednání v 11/2019 rozhodla o převodu této částky do opatření 2, kde bude moci být ještě využita v plánované výzvě v 6/2020.

**Opatření 2. – Bezpečnost silničního provozu:** Na toto opatření byly vyhlášeny 3 výzvy (2017, 2018 a 2019). 5 projektů je v udržitelnosti (4.204.047,55Kč), z toho 3 projekty přešly do tohoto stavu

v letošním roce. 1 projekt (1.039.283,35Kč) v letošním roce podal žádost o proplacení. Další 2 projekty (2.367.674,55Kč) jsou v realizaci. Zbýlé 4 projekty (5.370.357,39Kč) jsou po schválení ze strany MAS na závěrečném ověření na CRR. Vyhlášení další výzvy na zbývající část finanční alokace je naplánováno na 6/2020.

V 1/2019 byla podána žádost o změnu týkající se změny finančního plánu programového rámce IROP. Změna spočívala mimo jiné i v úpravě (snížení) celkové finanční alokace všech opatření IROP z důvodu vývoje kurzu CZK/EUR. Tuto změnu byla MAS Holicko povinna provést na základě dopisu řídicího orgánu ze dne 13.12.2018. MAS Holicko toto povinné snížení vyřešila proporčním snížením alokací na všech opatřeních Strategie CLLD.

Tabulka 29 – Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce IROP k 31.12.2019

Věcný pokrok v plnění cílů programového rámce IROP	1 - Vzdělávání	2 – Bezpečnost silničního provozu	Celkem Programový rámec IROP
<b>Finanční alokace pro celé období uvedená v SCLLD</b>	<b>7.636.783,-Kč</b>	<b>14.182.600,-Kč</b>	<b>21.819.383,-Kč</b>
Vyhlášená alokace	9.834.143,59Kč	19.440.529,54Kč	<b>29.274.673,13Kč</b>
Počet podaných projektů	7	13	<b>20</b>
Výše požadované dotace ( <i>Žádost o podporu</i> )	7.636.735,24Kč	13.685.584,32Kč	<b>21.322.319,56Kč</b>
Počet schválených projektů	5	8	<b>13</b>
<b>Výše schválené dotace (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)</b>	<b>4.992.160,39Kč</b>	<b>7.905.011,58Kč</b>	<b>12.787.171,97Kč</b>
Počet podpořených projektů	0	5	<b>5</b>
<b>Výše proplacené dotace</b>	<b>0Kč</b>	<b>4.204.047,18Kč</b>	<b>4.204.047,18Kč</b>
Výše sankcí a korekcí	0Kč	0Kč	<b>0Kč</b>

### 3.2.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce IROP

Ve sledovaném období 2 projekty z Programového rámce IROP podaly závěrečnou žádost o proplacení. Konkrétně šlo o projekty ze 4. výzvy MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2018). Z toho pouze 1 projekt byl ještě v letošním roce proplacen (podpořen).

Tabulka 30 – Podpořené projekty v rámci Programového rámce IROP v roce 2019

Opatření	Registrační číslo	Žadatel	Název projektu	Místo realizace	Poskytnutá dotace	Proplacení projektu
<b>4. výzva MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2018)</b>						
2	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009420	Obec Jaroslav	Jaroslav - chodník při II/305	Jaroslav	885.378,22Kč	28.11.2019

Projekt byl bez uložení sankce/korekce a dodržel všechny indikátory a preferenční kritéria, ke kterým se zavázal.

Níže uvedené tabulky shrnují parametry, které MAS Holicko sleduje u podpořených projektů, pro každé opatření zvlášť. Jsou zde uvedeny souhrnně všechny projekty, které byly realizovány od začátku realizace Strategie CLLD, tj. od 18.8.2016. Samostatně je zde uveden právě sledovaný rok 2019.

Můžeme konstatovat, že v rámci opatření 1 nebyl prozatím ukončen žádný projekt.

Tabulka 31 – Parametry podpořených projektů Opatření 1 – Vzdělávání rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2019

Opatření 1 - Vzdělávání	Měrná jednotka	Hodnota	
		Rok 2019	Celkem 2016 - 2019
Počet podpořených projektů celkem	Počet	0	0
Počet podpořených žadatelů celkem	Počet	0	0
Počet podpořených základních škol	Zařízení	0	0
Počet podpořených zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání	Zařízení	0	0
Počet podpořených zařízení pro celoživotní vzdělávání	Zařízení	0	0
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení	Osoby	0	0
Počet projektů týkající se komunikace v cizích jazycích	Počet	0	0
Počet projektů týkající se technických a řemeslných oborů	Projekt	0	0
Počet projektů týkající se přírodních věd	Projekt	0	0
Počet projektů týkající se schopnosti práce s digitálními technologiemi	Projekt	0	0
Počet projektů základních škol, jejichž výstupy budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže	Projekt	0	0
Počet projektů základních škol, jejichž výstupy budou sloužit pro výuku více předmětů (kroužků)	Projekt	0	0
Počet projektů týkající se bezbariérovosti	Projekt	0	0
Počet projektů týkající se vnitřní konektivity škol a školských zařízení a připojení k internetu	Projekt	0	0
Počet projektů, jejichž součástí byly úpravy venkovního prostranství	Projekt	0	0
Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela cílová skupina	Projekt	0	0
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	0	0
Typ žadatele	-	0	0
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	0	0

V rámci opatření 2 bylo podpořeno 5 projektů týkajících se chodníků. Konkrétně bylo vybudováno 455,61 m nových chodníků a zrekonstruováno 151,77 m chodníků ve špatném stavu. 2 projekty řešily místa pro přecházení a 3 projekty realizovaly prvky zvyšujících bezpečnost silniční a pěší dopravy. 3 projekty zlepšily přístup k občanské vybavenosti v obcích - zpravidla se jednalo o budování nebo rekonstrukce chodníků u škol. Součástí 4 chodníků byla výsadba zeleně. Příprava všech projektů byla veřejně projednána s cílovou skupinou a její připomínky byly zapracovány do konečného řešení.

Tabulka 32 – Parametry podpořených projektů Opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2019

Opatření 2 - Bezpečnost silničního provozu	Měrná jednotka	Hodnota	
		Rok 2019	Celkem 2016 - 2019
Počet podpořených projektů celkem	Počet	1	5
Počet podpořených žadatelů celkem	Počet	1	5
Počet projektů týkající se chodníků nebo stezek pro pěší	Počet	1	5
Počet projektů řešících místa pro přecházení	Počet	0	2
Počet projektů týkající se realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy	Počet	1	3
Počet projektů, jež zajišťují přístup k centru, či občanské vybavenosti	Počet	0	3
Počet projektů šetrných k životnímu prostředí	Počet	0	4
Délka nově vybudovaných chodníků nebo stezek pro pěší	m	115,5	455,61
Délka zrekonstruovaných chodníků nebo stezek pro pěší	m	0	151,77
Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela cílová skupina	Počet	1	5
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x: do 500 obyvatel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x: do 500 obyvatel,</li> <li>• 3x: 501 – 5.000 obyvatel,</li> <li>• 1x: nad 5.000 obyvatel.</li> </ul>
Typ žadatele	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x obce.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5x obce.</li> </ul>
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	5,00%	5,00%

### 3.2.2. Plnění indikátorového plánu Programového rámce IROP

Protože indikátorový plán programového rámce IROP vznikl na přelomu let 2015/2016, tak dle počtu zaregistrovaných projektů je již teď vidět, že dojde k jeho několikanásobnému překročení.

Ačkoliv dosud není hotový žádný projekt z opatření 1 – Vzdělávání, tak zde máme závazek 7 projektů (plánované plnění indikátoru na 140%) o celkové plánované kapacitě podpořených učeben 466 žáků (plánované plnění indikátoru na 259%).

V případě opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu je v současné chvíli zrealizováno 6 projektů (plnění indikátoru na 100%) a dalších 6 projektů je ještě v realizaci (plánované plnění indikátoru na 200%).

Na základě konzultace s Řídicím orgánem IROP bude indikátorový plán upraven dle skutečnosti až na konci období, tj. až všechny projekty budou proplaceny.

Tabulka 33 – Plnění indikátorového plánu Programového rámce IROP uvedeného v SCLLD v období 2016 – 2019

Název indikátoru	Plán uvedený v SCLLD	Plnění		
		Rok 2019	Celkem 2016 - 2019	%
<b>Opatření 1 - Vzdělávání</b>				
Počet podpořených vzdělávacích zařízení	5	0	0	0%
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	180	0	0	0%
<b>Opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu</b>				
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	6	2	6	100,00%

### 3.2.3. Plnění finančního plánu Programového rámce IROP

Finanční plán uvedený ve Strategii CLLD MAS Holicko nebyl plněn dle původního předpokladu již od počátku realizace Strategie. Hlavním důvodem bylo zpoždění ve vyhlášení prvních výzev, které jsme se sice snažili dohnat větší vyhlášenou finanční alokací, ale pak jsme zase narazili na malou projektovou připravenost žadatelů a tím tedy i na zdánlivý nezájem území. To se ale postupně daří bořit díky neustálé komunikaci se starosty jako víceméně jedinými možnými žadateli.

Přestože MAS Holicko provedla aktualizaci finančního plánu v 1/2019, tak skutečné plnění k 31.10.2019 neodpovídá ani nově nastavenému finančnímu plánu. Důvodem je to, že se do finančního plánu uvádí projekty, které podaly žádost o platbu, a to ještě pouze do 31.10. daného roku. Bohužel většina projektů je sice plánována dle nejlepší vůle žadatelů, pak ale, protože se jedná většinou o stavební projekty, dochází ke zpoždění buď ve výběrovém řízení, nebo při realizaci samotných stavebních prací. Proto ačkoliv částky ve finančním plánu odpovídaly plánovaným ŽoP v 1/2019, tak v průběhu roku 2019 došlo k posunutí termínu ukončení realizace téměř u všech projektů. A bohužel MAS toto není schopná nijak ovlivnit.

Dalším problémem programového rámce IROP je stanovení povinných milníků pro každý rok, a tedy i pro rok 2019. Do 31. 10. 2019 měly být předloženy žádosti o platbu na 41,17 % celkové alokace SCLLD. V případě MAS Holicko jsme dosáhly na pouhých 19,27%. Naštěstí ŘO IROP zmírnil své požadavky a posuzoval pouze objem schválených žádostí o podporu ve výzvách MAS, což MAS Holicko splnila (58,6%). Milník pro rok 2020 (55,44%) by již MAS Holicko dle plánu předkládání ŽoP měla plnit.

Tabulka 34 – Plnění finančního plánu Programového rámce IROP uvedeného v SCLLD v období 2016 – 2019

FINANČNÍ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD – OBDOBÍ 2016 - 2019						
Opatření/Fiche SCLLD	PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)				Nezpůsobilé výdaje (Kč)	Kumulativní % čerpání alokace
	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
		Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje			
1. Vzdělávání	3.215.488,42	3.054.714,-	0	160.774,42	0	40,00%
2. Bezpečnost silničního provozu	6.243.695,39	5.931.510,62	0	312.184,77	0	41,82%
<b>Celkem</b>	<b>9.459.183,81</b>	<b>8.986.224,62</b>	<b>0</b>	<b>472.959,19</b>	<b>0</b>	<b>41,18%</b>
SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ – OBDOBÍ 2016 - 2019						
Opatření/Fiche SCLLD	PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					

	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce	Nezpůsobilé výdaje (Kč)	Kumulativní % čerpání alokace
		Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje			
1. Vzdělávání	0	0	0	0	0	0%
2. Bezpečnost silničního provozu	4.425.313,23	4.204.047,18	0	221.266,05	0	29,64%
<b>Celkem</b>	<b>12.995.816,-</b>	<b>4.208.110,-</b>	<b>0</b>	<b>6.420.637,-</b>	<b>2.378.494,20</b>	<b>19,27%</b>

#### SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI S PLÁNEM – OBDOBÍ 2016 - 2019

Opatření/Fiche SCLLD	PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)				Nezpůsobilé výdaje (Kč)	Kumulativní % čerpání alokace
	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
		Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje			
1. Vzdělávání	- 3.215.488,42	- 3.054.714,-	-	- 160.774,42	-	- 40,00%
2. Bezpečnost silničního provozu	- 1.818.382,16	- 1.727.463,44	-	- 90.918,72	-	- 12,18%
<b>Celkem</b>	<b>- 5.033.870,58</b>	<b>- 4.782.177,44</b>	<b>-</b>	<b>- 251.693,14</b>	<b>-</b>	<b>- 21,92%</b>

\*Veškeré částky jsou v případě Programového rámce IROP počítány ze Žádostí o platbu podaných na CRR do 31.10.2019

Pro rekapitulaci uvádíme, že v 2/2019 byla schválena změna finančního plánu programového rámce IROP jejímž obsahem bylo jeho narovnání dle skutečného čerpání v roce 2018 a úprava (snížení) celkové finanční alokace všech opatření IROP z důvodu vývoje kurzu CZK/EUR. Tuto změnu byla MAS Holicko povinna provést na základě dopisu řídicího orgánu ze dne 13.12.2018. MAS Holicko toto povinné snížení vyřešila proporčním snížením alokací na všech opatřeních Strategie CLLD:

- Opatření 1 – Vzdělávání: původní alokace: 8.166.203,-Kč, nová alokace: 7.636.783,-Kč,
- Opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu: původní alokace: 15.165.805,-Kč, nová alokace: 14.182.600,-Kč,
- Celkem: původní alokace: 23.332.008,-Kč, nová alokace: 21.819.383,-Kč.

V průběhu 1/2020 bude MAS Holicko podávat žádost o změnu finančního plánu, jehož součástí bude jeho narovnání podle skutečného čerpání v roce 2019 a převod volné alokace z opatření 1-Vzdělávání (47,76Kč) do opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu.

### 3.3. Místa realizace podpořených projektů

Následující tabulka uvádí místa realizace podpořených (již proplacených) projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených od začátku realizace Strategie CLLD, tj. od 18.8.2016.


Počet míst realizace neodpovídá zcela přesně počtu podpořených projektů, neboť některé projekty jsou realizovány na více místech (oplocenky).


Jak je vidět, již teď se nám daří pokrýt skoro celé území MAS. Zatím jediná obec, která nevyužila dotací MAS Holicko je obec Týniště. Žádný podpořený projekt také nemá obec Uhersko. Ta ale na rozdíl od Týniště má již 2 schválené projekty. Prozatím mají nejméně podpořených projektů obce Trusnov, Radhošť, Býšť a Poběžovice u Holic. Naopak nejvíce peněz prozatím získaly obce Ostřetín, Dolní Roveň, Horní Ředice, Dolní Ředice a Jaroslav.



Tabulka 35 – Místa realizace podpořených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2019

Místo realizace podpořených projektů	Rok 2019			Celkem 2016 - 2019	%
	Výzvy prog.rámce PRV a IROP	Výzvy Malý LEADER	Celkem rok 2019		
Býšť	35.368,91Kč (0,18 projektu)	34.981,-Kč (1 projekt)	<b>70.349,91Kč</b> (1,18 projektu)	93.961,41Kč (1,31 projektu)	0,94%
Dolní Roveň	0	0	<b>0</b>	1.448.328,-Kč (1 projekt)	14,50%
Dolní Ředice	1.014.189,91Kč (1 projekt)	34.303,-Kč (1 projekt)	<b>1.048.492,91Kč</b> (2 projekty)	1.113.167,91Kč (4 projekty)	11,15%
Holice	0	35.000,-Kč (1 projekt)	<b>35.000,-Kč</b> (1 projekt)	522.135,55Kč (5 projektů)	5,23%
Horní Jelení	0	0	<b>0</b>	632.641,-Kč (2 projekty)	6,34%
Horní Ředice	0	104.896,-Kč (3 projekty)	<b>104.896,-Kč</b> (3 projekty)	1.251.665,70Kč (4 projekty)	12,53%
Chvojenec	637.900,-Kč (2 projekty)	35.000,-Kč (1 projekt)	<b>672.900,-Kč</b> (3 projekty)	748.710,75Kč (5,063 projektů)	7,50%
Jaroslav	885.378,22Kč (1 projekt)	0	<b>885.378,22Kč</b> (1 projekt)	920.378,22Kč (2 projekty)	9,22%
Ostřetín	1.644.760,80Kč (3 projekty)	35.000,-Kč (1 projekt)	<b>1.679.760,80Kč</b> (4 projekty)	2.743.189,80Kč (7 projektů)	27,47%
Poběžovice u Holic	71.277,82Kč (0,36 projektu)	0	<b>71.277,82Kč</b> (0,36 projektu)	129.631,57Kč (0,68 projektu)	1,30%
Radhošť	0	35.000,-Kč (1 projekt)	<b>35.000,-Kč</b> (1 projekt)	35.000,-Kč (1 projekt)	0,35%
Trusnov	0	35.000,-Kč (1 projekt)	<b>35.000,-Kč</b> (1 projekt)	35.000,-Kč (1 projekt)	0,35%
Týništko	0	0	<b>0</b>	0	0%
Uhersko	0	0	<b>0</b>	0	0%
Vysoké Chvojno	35.638,91Kč (0,18 projektu)	0	<b>35.638,91Kč</b> (0,18 projektu)	152.334,16Kč (1,62 projektu)	1,53%
Nová Ves	147.838,36Kč (1,27 projektu)	0	<b>147.838,36Kč</b> (1,27 projektu)	159.509,11Kč (1,34 projektu)	1,60%
<b>Celkem</b>	<b>4.472.622,93Kč</b> (9 projektů)	<b>349.180,-Kč</b> (10 projektů)	<b>4.821.802,93Kč</b> (19 projektů)	<b>9.985.653,18Kč</b> (37 projektů)	<b>100%</b>

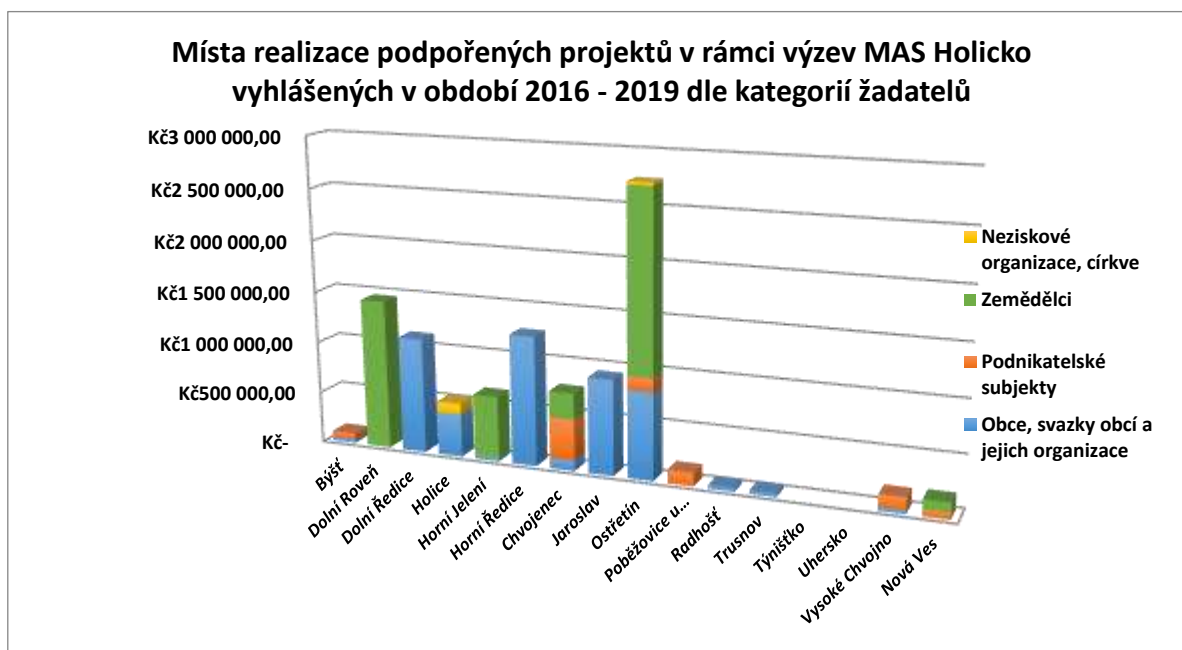

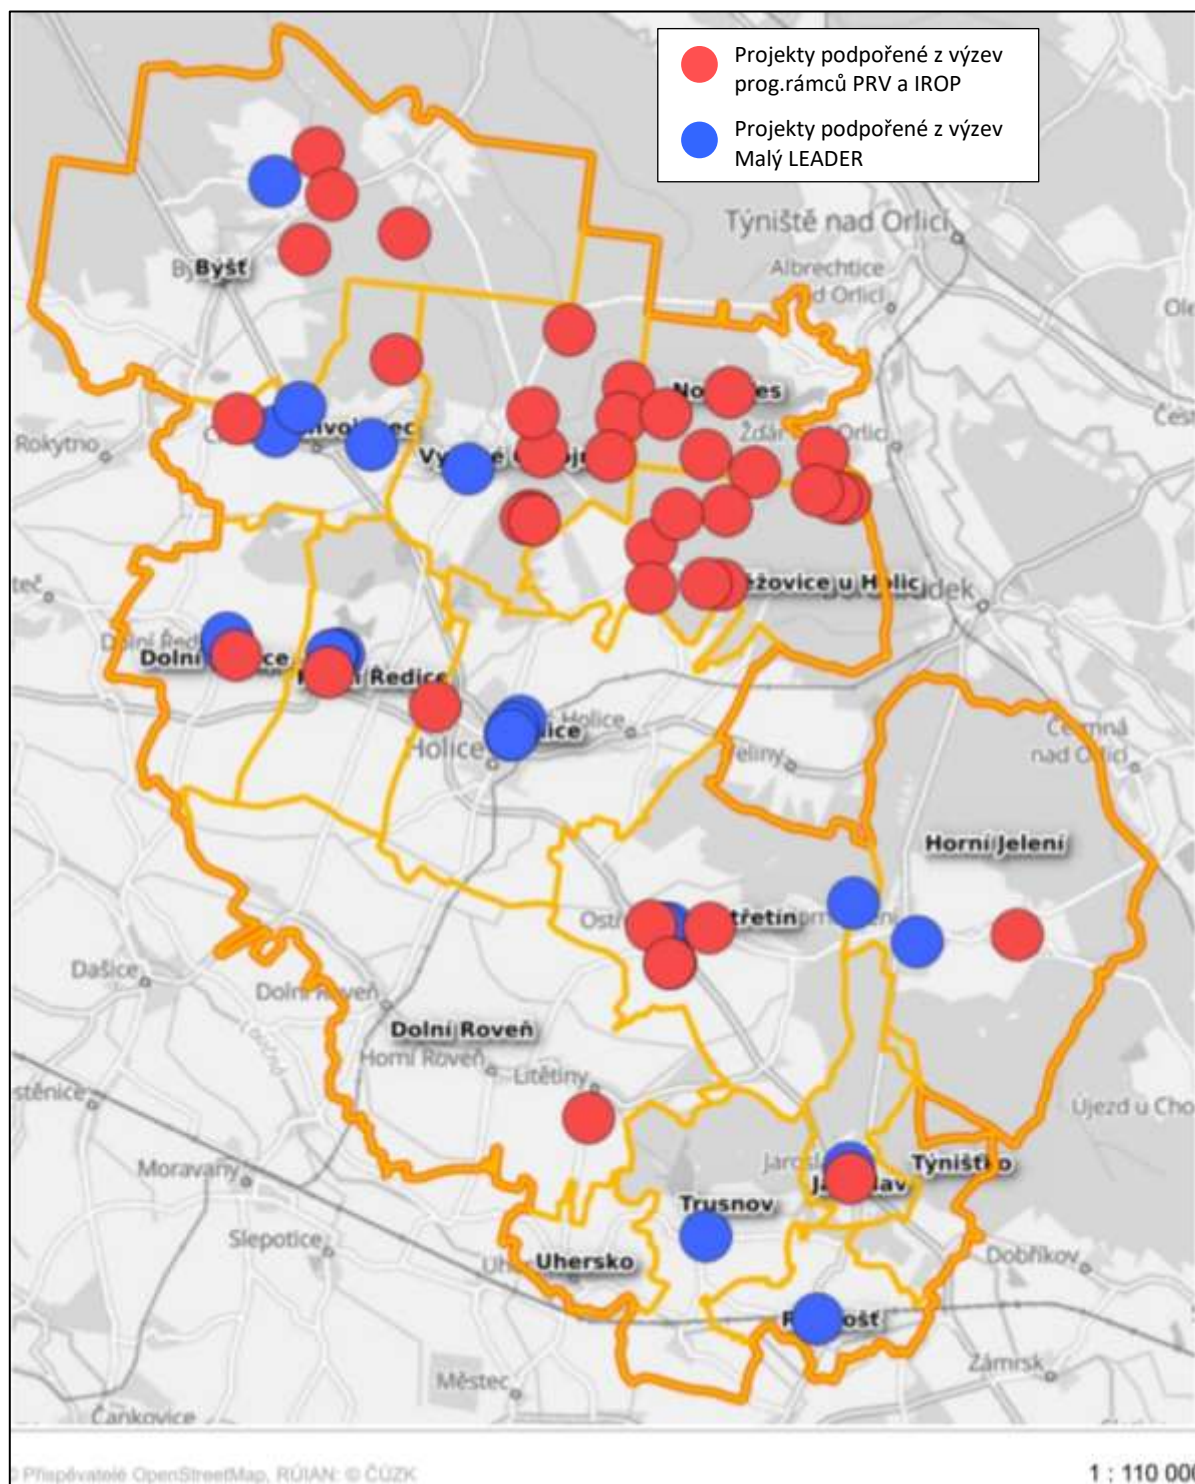

### 3.4. Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo programové rámce

Immediately after the end of the monitored period, a survey was conducted on the territory of Holicko regarding the implementation of the goals of the CLLD MAS Holicko strategy, which the MAS set outside the PRV and IROP program frameworks.

In early 2020, all mayors of municipalities within the MAS's area of influence, MAS members, and other stakeholders from the territory were contacted to request the completion of data in a questionnaire.

Ten byl zaměřen na zjištění počtu projektů, které se na Holicku ve sledovaném období realizovaly. Mohlo se jednat o projekty realizované z evropských fondů, národních dotací, dotací Pardubického kraje nebo i třeba z vlastních zdrojů.

Protože návratnost dotazníků byla malá (odpovědělo pouze 35 respondentů), tak kancelář MAS zjišťovala informace o realizovaných projektech ještě na těchto portálech:

- IS CEDR III (Centrální registr dotací) - <http://cedr.mfcr.cz/Cedr3InternetV419/CommonPages/ConditionPage.aspx?queryType=1>
- DotInfo (Informace o Dotacích a návratných finančních výpomocích EDS) - <https://www.dotinfo.cz/Default.aspx>
- DotaceEU - <https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznamy-prijemcu>

Na základě výsledků těchto šetření můžeme konstatovat, že skutečnost odpovídá předpokladům, tj. počet zrealizovaných projektů v území je na cca 81% plnění indikátorů.

V rámci klíčové oblasti A. Partnerská spolupráce jsou indikátory naplňovány lépe, než bylo při tvorbě strategie očekáváno (400%). Důvodem je, že projekty založené na spolupráci několika jiných subjektů, ať již na regionální, národní nebo mezinárodní úrovni realizovaly i jiné subjekty v území než pouze MAS Holicko (Dobrovolný svazek obcí Holicka, Rodinné centrum Holoubek, ZUŠ Karla Malicha, Dětský domov Holice).

Konkrétně ve sledovaném období probíhala na území Holicka realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (partnerství MŠ, ZŠ, školských zařízení a jejich zřizovatelů z Holicka) (regionální spolupráce). Na mezinárodní bázi spolupracoval Dětský domov Holice se zahraničními regiony.

Tabulka 36 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo programové rámce k 31.12.2019 – Klíčová oblast A. Partnerská spolupráce

Název opatření / indikátoru	Plán uvedený v SCLLD	Plnění		
		Rok 2019	Celkem 2016 - 2019	%
<b>Opatření: A.1.1.1 Aktivní tvorba dostatečného prostoru na setkávání, navazování kontaktů a spolupráci nejrůznějších subjektů ať již vně, či uvnitř jednotlivých sektorů a zájmových skupin místního partnerství</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	1	1	3	300,00%
Počet vytvořených partnerství v rámci regionu MAS Holicko	2	0	1	50,00%
<b>Opatření: A.1.2.1 Přenos zkušeností a aktivní spolupráce na regionální, národní i mezinárodní úrovni</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	2	1	10	500,00%
Počet vytvořených partnerství s aktéry mimo území MAS Holicko	3	0	1	33,33%
92501 - Celkové veřejné výdaje (O.1) (EUR)	0	0	0	-
<b>Počet realizovaných projektů v rámci Klíčové oblasti A celkem</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>433,33%</b>

V rámci klíčové aktivity B. Kvalitní život v obcích jsme na přibližně 80% plnění indikátorů. Nejvíce zrealizovaných projektů je z opatření zaměřených na školství (78), kulturu a sport (43), volnočasové aktivity (41) a veřejná prostranství (35). Naopak nejméně projektů bylo z opatření zaměřených na zlepšení dohledu nad veřejným pořádkem (0), dopravní dostupnost (2), rozvoj komunitních služeb (5) a technické infrastruktury (9).

Tabulka 37 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo programové rámce k 31.12.2019 – Klíčová oblast B. Kvalitní život v obcích

Název opatření /indikátoru	Plán uvedený v SCLLD	Plnění		
		Rok 2019	Celkem 2016 - 2019	%
<b>Opatření: B.1.1.1 Obnova a kultivace veřejných prostranství a center obcí</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	60	10	35	58,33%
<b>Opatření: B.1.1.2 Rozvoj komunitních služeb a vybavenosti obcí</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	10	2	5	50,00%
<b>Opatření: B.1.1.3 Podpora školství a celoživotního vzdělávání</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	60	34	78	130,00%
50000 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení	5	0	0	0%
50001 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení	180	0	0	0%
50030 - Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,00%	-	-	-
<b>Opatření: B.1.1.4 Podpora sociálních služeb a zapojení sociálně a jinak znevýhodněných skupin občanů do života v obcích a v regionu</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	10	4	11	110,00%
<b>Opatření: B.2.1.1 Volnočasové aktivity a spolkový život</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	30	22	41	136,67%
92702 - Počet podpořených operací	3	0	0	0%
94800 - Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	0	0	0	0%
<b>Opatření: B.2.1.2 Kulturní, společenské a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	60	21	43	71,67%
92702 - Počet podpořených operací	2	0	0	0%
94800 - Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	0	0	0	0%
<b>Opatření: B.3.1.1 Rozvoj technické infrastruktury</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	20	5	9	45,00%
<b>Opatření: B.3.1.2 Rozvoj dopravní infrastruktury</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	30	2	13	43,33%
<b>Opatření: B.3.1.3 Dopravní dostupnost a obslužnost regionu</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	5	0	2	40,00%
<b>Opatření: B.4.1.1 Podpora bezpečnosti silničního provozu a rozvoj cyklodopravy v obcích regionu</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	20	2	16	80,00%
75001 - Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	6	2	6	100,00%
75120 - Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	35%	-	-	-
<b>Opatření: B.4.1.2 Zlepšení dohledu nad veřejným pořádkem</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	5	0	0	0%
<b>Opatření: B.4.1.3 Protipovodňová a požární prevence</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	20	1	10	55,00%
<b>Počet realizovaných projektů v rámci Klíčové oblasti B celkem</b>	<b>330</b>	<b>103</b>	<b>263</b>	<b>79,70%</b>

V rámci klíčové aktivity C. Podpora podnikání a zaměstnanosti jsme na přibližně 72% plnění indikátorů. Oznámené zrealizované projekty jsou z opatření zaměřených na zemědělské podnikání (14), drobné nezemědělské podnikání (9), lesní hospodářství (7) i na podporu zaměstnanosti (4). Žádný projekt se netýkal podpory regionálních produktů a řemesel.

Tabulka 38 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo programové rámce k 31.12.2019 – Klíčová oblast C. Podpora podnikání a zaměstnanosti

Název opatření	Plán uvedený v SCLLD	Plnění		
		Rok 2019	Celkem 2016 - 2019	%
<b>Opatření: C.1.1.1 Podpora rozvoje zemědělského podnikání</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	15	3	14	93,33%
93701 - Počet podpořených podniků / příjemců	6	2	5	83,33%
94800 - Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	1,5	1	1	66,67%
<b>Opatření: C.1.1.2 Podpora lesního hospodářství</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	10	2	7	70,00%
92702 - Počet podpořených operací	4	1	2	50,00%
93001 - Celková plocha (ha)	21,28	3	8,59	40,37%
<b>Opatření: C.1.2.1 Podpora drobného podnikání, rozvoje služeb a tradičních řemesel</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	20	9	9	45,00%
93701 - Počet podpořených podniků / příjemců	16	3	3	18,75%
94800 - Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	2	1	1	50,00%
<b>Opatření: C.1.2.2 Podpora regionálních produktů, řemesel a služeb včetně jejich propagace</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	1	0	0	0%
<b>Opatření: C.2.1.1 Podpora zaměstnanosti a rozvoj vzdělanosti v souladu s potřebami regionu</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	1	1	4	400,00%
<b>Počet realizovaných projektů v rámci Klíčové oblasti C celkem</b>	<b>47</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>72,34%</b>

V rámci klíčové aktivity D. Rozvoj cestovního ruchu jsme na přibližně 35% plnění indikátorů, tj. jedná se o nejméně řešenou oblast na Holicku. A to bohužel i přesto, že původní plán byl pouze v počtu jednotek realizovaných projektů.

Oznámené zrealizované projekty jsou z opatření zaměřených na propagaci regionu (5), infrastrukturu cestovního ruchu (2), podporu turisticky významných objektů (2) a rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit (1). Žádný projekt se netýkal cykloturistiky a informačních center.

MAS Holicko se také snaží přispět k plnění této klíčové aktivity prostřednictvím založení a fungování Turistické oblasti Pardubicko a vydáním mapy Holicka.

Z tohoto pohledu je jasné, že by MAS i její partneři měli iniciovat území k podpoře cestovního ruchu v regionu, např. zlepšení služeb informačního centra, pokrok v přípravě budování sítě cyklostezek, hippostezek nebo naučných stezek, příprava budování nových turistických atraktivit (např. vyhlídky, rozhledny, obecní muzea,...), rozvoj ubytovacích a stravovacích zařízení, vydání nových propagačních a informačních materiálů, mapování kulturního a historického dědictví nebo místních tradic

Tabulka 39 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo programové rámce k 31.12.2019 – Klíčová oblast D. Rozvoj cestovního ruchu

Název opatření	Plán uvedený v SCLLD	Plnění		
		Rok 2019	Celkem 2016 - 2019	%
<b>Opatření: D.1.1.1 Infrastruktura pro cestovní ruch (rozhledny, pěší stezky, naučné stezky, půjčovny sportovních potřeb, servis, apod.)</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	5	0	2	40,00%
<b>Opatření: D.1.1.2 Podpora turisticky a historicky významných objektů</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	15	1	2	13,33%
<b>Opatření: D.1.2.1 Rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit v oblasti venkovské turistiky</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	3	1	1	33,33%
<b>Opatření: D.1.2.2 Podpora cykloturistiky</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	3	0	0	0%
<b>Opatření: D.2.1.1 Podpora informačních a návštěvnických center a jejich spolupráce</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	1	0	0	0%
<b>Opatření: D.2.1.2 Propagace regionu (i mimo jeho území) a v něm působících subjektů</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	1	1	5	500,00%
<b>Počet realizovaných projektů v rámci Klíčové oblasti D celkem</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>35,71%</b>

V rámci klíčové aktivity E. Životní prostředí jsou indikátory naplňovány lépe, než bylo při tvorbě strategie očekáváno (150%). Důvodem je to, že původně bylo odhadováno plnění v rámci jednotek (18 projektů), tudíž i když se zrealizovalo ve sledovaném období 28 projektů, tak procentní překročení plánovaného plnění je veliké.

Oznámené zrealizované projekty jsou z opatření zaměřených na hospodaření s odpady (10), zachování a obnovu krajinných hodnot (7), udržitelné nakládání s přírodními zdroji (6), zlepšení vodního režimu krajiny (4) a udržitelné obhospodařování krajiny (1). Naopak žádný projekt se netýkal revitalizace černých skládek a vzdělávání v oblasti životního prostředí.

Tabulka 40 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo programové rámce k 31.12.2019 – Klíčová oblast E. Životní prostředí

Název opatření	Plán uvedený v SCLLD	Plnění		
		Rok 2019	Celkem 2016 - 2019	%
<b>Opatření: E.1.1.1 Zachování a obnova krajinných hodnot a přírodního dědictví</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	5	3	6	120,00%
<b>Opatření: E.1.1.2 Udržitelné obhospodařování krajiny</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	2	1	1	50,00%
<b>Opatření: E.1.1.3 Zlepšování vodního režimu v krajině a hospodaření s vodou</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	2	1	4	200,00%
<b>Opatření: E.2.1.1 Zkvalitnění hospodaření s odpady</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	3	1	10	333,33%
<b>Opatření: E.2.1.2 Revitalizace černých skládek a zátěží</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	2	0	0	0%
<b>Opatření: E.3.1.1 Udržitelné nakládání s přírodními zdroji</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	2	5	6	300,00%

Název opatření	Plán uvedený v SCLLD	Plnění		
		Rok 2019	Celkem 2016 - 2019	%
<b>Opatření: E.3.1.2 Vzdělávání, informovanost, výchova a zapojování veřejnosti v oblasti životního prostředí</b>				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	2	0	0	0%
<b>Počet realizovaných projektů v rámci Klíčové oblasti E celkem</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>150,00%</b>

### 3.5. Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie

Vzhledem k tomu, že jsme na počátku druhé poloviny realizace Strategie CLLD, tak se synergické efekty začínají projevovat, i když zatím pouze v omezeném rozsahu. To je způsobeno i nízkou finanční alokací, kterou má MAS Holicko k dispozici na celé období 2016 - 2023 (34,5 mil. Kč). Takže ani po zrealizování všech podpořených projektů nebudou efekty tak zřetelné, jako kdybychom měli financí dvojnásobek.

Synergický efekt je asi nejvýraznější v oblasti podpory vzdělávání, a to i přesto, že ještě nebyl dokončen žádný projekt z opatření 1 - Vzdělávání. Ale již teď je vidět provázanost animačních aktivit MAS Holicko v animaci škol v OP VVV s aktivitami projektu Místního akčního plánu vzdělávání (realizátor MAS Holicko) a i s právě realizovanými projekty z opatření 1 - Vzdělávání zaměřenými na podporu jazykového, přírodovědného a polytechnického vzdělávání.

Další oblastí je bezpečnost silničního provozu. Zde se díky realizaci jednotlivých projektů postupně zvyšuje bezpečnost silniční a pěší dopravy v jednotlivých obcích regionu Holicka, který je celý zatížen intenzivní automobilovou dopravou (především podél silnic I/35 a I/36 a návazných komunikací). Navíc řešené chodníky zlepšují přístup k občanské vybavenosti v obcích - mimo jiné se jedná o chodníky u základních škol, které jsou podporovány v rámci opatření 1 nebo o chodníky u mateřských škol, sportovišť, kulturních zařízení, apod., jejichž rekonstrukce byla podporována v předchozím programovém období 2007 - 2013 a v současném období je podporována jejich údržba v rámci výzev Malého LEADERu (přerozdělení financí Programu obnovy venkova Pardubického kraje prostřednictvím MAS).

V případě fichí PRV je podporován rozvoj drobného podnikání na Holicku, ať už se jedná o zemědělce nebo nezemědělské podnikatele. Bohužel, zde se kvůli opravdu nízké finanční alokaci Strategie CLLD a různých typů žadajících podnikatelů (zemědělci, jezdecká stáj, výrobci potravin, catering, pohostinství, truhlářství, stavební firma, zámečnictví,...), synergické efekty až tolik neprojevují. Jedinou spojující aktivitou je propojení výrobců potravin podpořených z výzev PRV s aktivitami projektu Kraj Pernštejnů - regionální produkt (MAS Holicko je jedním z realizátorů). Další vazbu lze vysledovat v propojení podnikatelů zaměřených na cestovní ruch a pohostinství s aktivitami Turistické oblasti Pardubicko (MAS Holicko je jedním ze zakládajících členů).

### 3.6. Horizontální principy

Strategie CLLD MAS Holicko nemá negativní vliv na žádné z horizontálních témat. Jednotlivé specifické cíle a opatření jsou naplňovány dílčími projekty zohledňujícími požadavky na horizontální témata (Udržitelný rozvoj, Rovné příležitosti a zákaz diskriminace a Rovnost mezi muži a ženami). Povinností konečných žadatelů je zajištění alespoň neutrálního vztahu k daným tématům.

Nadto v rámci hodnocení a výběru projektů jsou zvýhodňovány ty projekty, jež mají pozitivní vliv na horizontální témata (především udržitelný rozvoj). Z tohoto důvodu byly podpořeny žádosti zaměřené na pořízení technologií a strojů šetrných k životnímu prostředí nebo jejichž součástí je i výsadba zeleně. A například projekty z programového rámce IROP (školy, chodníky) musí splňovat podmínky bezbariérovosti (základní požadavek na přijatelnost projektu).

## 4. Animace strategie CLLD

Animační aktivity MAS jsou všechny činnosti MAS v rámci SCLLD, které nezahrnují vyhlášení výzev a administraci projektů konečných žadatelů/příjemců. Jedná se především o používané komunikační strategie a z nich vycházející komunikační aktivity, které slouží k informování veřejnosti o SCLLD, dále k přenosu informací ke konkrétním žadatelům či zájemcům o podání žádosti o podporu v rámci SCLLD, podpoře žadatelů při realizaci svých projektů či nastavení celkových procesů toku informací mezi všeobecnou veřejností, zájemci, žadateli a dalšími aktéry na území.

V roce 2019 byla uspořádána beseda s názvem „Co Vám nabízí MAS Holicko a její Strategie v letech 2016 – 2023“ (23.10.2019), 3 semináře v rámci výzev MAS (16.1.2019, 30.1.2019 a 19.6.2019) a 3 valné hromady MAS Holicko (23.1.2019, 29.5.2019 a 27.11.2019), které byly veřejně přístupné a byly na nich zveřejňovány informace o průběhu realizace CLLD.

Tabulka 41 – Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí

	Plán uvedený v SCLLD	Plnění		
		Rok 2019	Celkem 2016 - 2019	%
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	26	7	20	76,92%

Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitolách níže.

### 4.1. Propagace strategie CLLD

Ve sledovaném období bylo cílem informovat území o tom, že MAS Holicko začalo realizovat SCLLD a také všechny potencionální předkladatele projektů seznámit se zaměřením jednotlivých opatření a s pravidly administrace. Pro toto období byly voleny následující prostředky propagace:

- Využití **roll-upu, propagačních předmětů a letáků**, které si MAS Holicko nechala vyrobit v předcházejících letech.
- **Informační tabule pro projekty podpořené MAS** jsou rozdávány všem příjemcům dotace po úspěšné realizaci jejich projektu. Příjemce dotace má povinnost tuto tabulku umístit na viditelném místě v místě realizace projektu. Tímto krokem se zvyšuje informovanost území o činnosti MAS Holicko a samotné realizaci SCLLD.
- **Webové stránky ([www.holicko.cz](http://www.holicko.cz)) a facebook (<https://www.facebook.com/mas.holicko>)** MAS Holicko – informace o připravovaných a právě vyhlášených výzvách a realizovaných akcích v rámci SCLLD.
- **Vizitky** manažerek pro SCLLD – rozdávány jak na osobních konzultacích, tak i na kulturních, propagačních a vzdělávacích akcích, kterých se pracovníci MAS účastní.



- **Zpravodaj MAS Holicko** (duben a září 2019) – informace o připravovaných a právě vyhlášených výzvách a realizovaných akcích v rámci SCLLD. Distribuce probíhá prostřednictvím partnerů MAS a obecních úřadů na území MAS a dále na webu MAS.
- **Výroční zpráva MAS Holicko** za rok 2019 – zveřejnění výsledků, kterých bylo za příslušný rok dosaženo.
- **Tiskové zprávy** – Holické listy (2/2019) – informace o výzvách a realizaci SCLLD.
- **Rozesílání důležitých informací do e-mailových schránek** partnerům MAS, klíčovým aktérům z území MAS a všem subjektům, které má MAS v adresáři – informace o vyhlášení výzvy a jejich důležitých milnících (např. přijaté žádosti o podporu, schválené žádosti o podporu, apod.)
- **Účast na kulturních a propagačních akcích** – Kreativní jarmark v RC Holoubek (17.4.2019) a Dny Holicka 2019 (22.-23.6.2019) – prezentace realizace SCLLD na Holicku.
- **Pořádání besedy s názvem „Co Vám nabízí MAS Holicko a její Strategie v letech 2016 – 2023“** (23.10.2019) – Zde se se přítomní dozvěděli o Strategii CLLD a o jejích jednotlivých opatřeních.
- **Pořádání valných hromad MAS Holicko, které byly veřejně přístupné** (23.1.2019, 29.5.2019 a 27.11.2019) – Zde byli přítomní informováni o průběhu realizace CLLD.

#### 4.2. Podpora žadatelů

**Telefonické, e-mailové a osobní konzultace s pracovníky MAS.** – Konečným žadatelům, resp. příjemcům je poskytnuta podpora ze strany pracovníků MAS. Žadatelům jsou zprostředkovávány přes pracovníky MAS informace z řídicích orgánů a naopak. Na druhou stranu pracovníci MAS u příjemců zjišťují informace o průběhu realizace projektu a reagují na možné problémy.

**Příručky pro žadatele** – Manažerky MAS zpracovaly pro každou vyhlášenou Fichi / opatření samostatnou Příručku pro žadatele. V nich žadatel najde informace jak vyplnit žádost o podporu, seznam povinných a nepovinných příloh, seznam způsobilých a nezpůsobilých výdajů, kritéria hodnocení přijatelnosti, bodovací tabulky a další důležité informace související se zpracováním projektů. Příručky jsou zveřejněny vždy u konkrétní výzvy nebo jsou rozdávány vytištěné na seminářích pořádaných MAS.

**Pořádání seminářů pro žadatele v rámci každé výzvy** – V rámci výzvy č. 5 – PRV se konaly semináře 16.1.2019 v Horním Jelení a 30.1.2019 v Holicích. V rámci výzev č.5 a 6 – IROP se konal seminář 19.6.2019 v Horních Ředvicích.

#### 4.3. Animace školských zařízení v OPVVV

V průběhu sledovaného období také samozřejmě probíhala animace školských zařízení v OP VVV, v rámci které manažerky MAS poskytují MŠ, ZŠ a střediskům volného času z regionu Holicka **konzultace (telefonické, e-mailové a osobní)**, zprostředkovávají kontakt s MŠMT, pomáhají se založením žádosti o dotaci, oznámením změny, žádostí o proplacení, jejím vyplněním a odesláním.

Naši pomoc využívají od letošního roku již všechny školy a školská zařízení na Holicku (podepsaný souhlas).

V roce 2019 v rámci Šablon I jsme pomohli:

- 2 MŠ podat závěrečnou zprávu o realizaci projektu,
- 2 ZŠ podat průběžnou a závěrečnou zprávu o realizaci projektu,
- 1 MŠ požádat o změnu projektu.

V rámci Šablon II jsme pomáhali:

- 2 MŠ a 1 ZŠ podat Žádost o podporu,
- 1 MŠ, 2 ZŠ a 1 ZUŠ podat průběžnou zprávu o realizaci projektu.

Samozřejmě manažerky MAS se také účastní různých školení k tomuto tématu.

#### 4.4. Vzdělávání zaměstnanců a partnerů MAS

Ve sledovaném období se manažerky MAS zúčastnily **27 školení (workshopy, semináře, konference) věnovaných realizaci CLLD:**

- Školení „Mid-term evaluace“ pořádané MMR-ORP 4.1.2019 v Praze,
- Workshop „Mid-term evaluace strategií SCLLD“ pořádaný NS MAS ČR 10.1.2019 v Poličce,
- Workshop „Mid-term evaluace strategií SCLLD“ pořádaný NS MAS ČR 29.1.2019 v Svitavách,
- Workshop „Cestovní ruch v regionu“ pořádaný MAS Region Kunětická hora 20.2.2019 v Sezemicích,
- Workshop „Mid-term evaluace strategií SCLLD“ pořádaný NS MA ČR 21.2.2019 v Holicích,
- Seminář „Dotační příležitosti pro podnikatele“ pořádaný P-PINK 26.2.2019 v Pardubicích,
- Výroční setkání Územního odboru IROP pro Pardubický kraj s partnery v regionu pořádané CRR 6.3.2019 v Přelouči,
- Konference k budoucnosti CLLD a NS MAS pořádanou NS MAS ČR 11.3.2019 v Pardubicích,
- Seminář Agentury pro podnikání a inovace a společnosti GAREP pořádaný NS MAS ČR 12.3.2019 v Pardubicích,
- Konzultační seminář MAS a SZIF k projektům spolupráce PRV pořádaný NS MAS ČR – PS Mezinárodní spolupráce 21.3.2019 v Praze,
- Workshop k metodě balanční kruh pořádaný NIDV 24.3.2019 v Pardubicích,
- onference „Sdílení zkušeností MAS Pardubického a Olomouckého kraje s realizací komunitně vedeného místního rozvoje“ pořádaná CSV ve dnech 11.-12.4.2019 v Jevíčku,
- Výjezdní seminář po Vysočině pořádaný Dobrovolným svazkem obcí Holicka ve dnech 15-17.5.2019,
- Konference LeaderFEST 2019 ve dnech 22.-23.5.2019 v Žatci,
- Seminář Šablony OP VVV pořádaný NIDV 10.9.2019 v Pardubicích,
- Společné setkání Rady pardubického kraje se zástupci mikroregionů a MAS „Spojujeme venkov“ pořádaný SMS dne 17.9.2019 v Českých Heřmanicích,
- Odborná exkurze „Příběhy lokální produkce, místních produktů a regionální spolupráce – Opavsko 2019“ pořádaná CSV ve dnech 19.-20.9.2019 na Opavsku,
- Konference „Čerpání evropských fondů v programovém období 2021-2027“ pořádaná RSK Pardubického kraje 25.9.2019 v Pardubicích,
- Konference Venkov 2019 ve dnech 1.-3.10.2019 v Klášteře Teplá,
- Seminář k budoucnosti CLLD 21+ pořádaný NS MAS ČR ve dnech 11.-12.11.2019 v Hradci nad Moravicí,

- Seminář IROP pro příjemce 6. výzvy pořádaný MMR 25.11.2019 v Praze,
- Workshop k metodám stanovení priorit pořádaný NIDV 26.11.2019 v Pardubicích,
- Seminář „Současný stav a vývoj implementace SCLLD – sdílení a výměna zkušeností MAS Pardubického kraje“ pořádaný CSV 28.11.2019 v Dřítči,
- Seminář „Jak být lepším leaderem“ pořádaný P-PINK 3.12.2019 v Pardubicích,
- Seminář „Voda a vodní hospodářství obcí + Obecní komunity podporují chytré starostky a starosty“ pořádaný Pardubickým krajem a CCV 5.12.2019 v Pardubicích,
- PR Seminář pořádaný Nadací Via 6.12.2019 v Praze,
- Seminář „Příležitosti a bariéry rozvoje venkova a malých měst ČR“ pořádaný NS MAS ČR 9.12.2019 v Praze.

Dále ve sledovaném období probíhala **výměna zkušeností a poznatků**, a to především v rámci Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje. Obsahem společných setkání byly nejen informace z výboru a pracovních skupin NS MAS ČR, ale i informace k úpravám strategií v rámci připomínek od řídicích orgánů, přípravě a zkušenostem z vyhlášení výzev MAS v rámci jednotlivých programových rámců, příprava výzvy Malého LEADERu nebo výměna informací se zástupci z CSV, SZIF, CRR, MMR a Pardubického kraje. Součástí některých jednání byla i školení s příklady dobré praxe a představení směrů podpory v rámci operačních programů.

- 29.1.2019 Svitavy - zkušenosti z realizace výzev PRV, IROP, OPZ a OPŽP, mid-term evaluace SCLLD,
- 12.6.2019 Letohrad – zkušenosti z realizace výzev PRV, IROP, OPZ a OPŽP, mid-term evaluace SCLLD,
- 11.9.2019 Bystré – zkušenosti z realizace výzev PRV, IROP, OPZ a OPŽP, mid-term evaluace SCLLD.

## 5. Informace o plnění doporučení Evaluační zprávy z 5/2019

V průběhu první poloviny roku 2019 probíhala mid-term evaluace Strategie CLLD, jejímž cílem bylo zhodnotit:

- relevanci nastavení jednotlivých programových rámců,
- nastavení činností a procesů implementace Strategie CLLD,
- pokrok v plnění cílů programových rámců,
- příspěvek Strategie CLLD ke vzniku přidané hodnoty v území MAS.

Jak vyplývá z tabulek uvedených níže, většina doporučení byla splněna již v roce 2019. Na zbytku doporučení se intenzivně pracuje, tak aby došlo k jejich naplnění co nejdříve. Konkrétně ještě zbývá dořešit napojení MAS na Hospodářskou komoru a přes ně na podnikatele, upravit SWOT analýzu a analýzu rizik Strategie CLLD při tvorbě strategie pro nové programové období, využívat komunitární programy a posílit synergických efektů projektů.

Tabulka 42 – Plnění doporučení Evaluační zprávy z 5/2019

Doporučení Evaluační zprávy		Stav plnění
<b>1</b>	<b>Interní procesy a postupy na úrovni nositele SCLLD</b>	
1.1	Vedoucí manažer SCLLD se obrátí na kancelář NS MAS, aby vznesla požadavek na ŘO PRV a IROP k odstranění skutečností, které negativně ovlivňují činnosti na MAS.	Splněno
1.2	Vedoucí manažer SCLLD zajistí v jednacím řádu ošetření situace, kdy by hlasování výběrové komise skončilo rovným počtem hlasů.	Splněno
1.3	Vedoucí manažer SCLLD zajistí vyšší a lepší propagaci informací do území:	
1.3.a	- posílí vazbu na mikroregion (účast pracovníka MAS na jednání svazku obcí),	Plněno průběžně
1.3.b	- více využít propagačně akcí „dny Holicka“,	Plněno průběžně
1.3.c	- napojit se na Hospodářskou komoru a přes ně na podnikatele,	Pokračuje
1.3.d	- zhodnotí návštěvnost webových stránek MAS a jejich přehlednost a v případě potřeby tento komunikační kanál posílí,	Plněno průběžně
1.3.e	- zajistí lepší propagaci seminářů pro žadatele a posílí komunikační kanály do území (např. účast vedoucího pracovníka SCLLD na jednání svazku obcí, přenos informací přes starosty).	Plněno průběžně
<b>2</b>	<b>Nastavení východisek pro realizaci SCLLD a řešení aktuálních problémů</b>	
2.1	Návrhy na drobnou úpravu SWOT analýzy a Analýzy rizik vzešlé z jednání Focus group budou zpracovány při tvorbě strategie do nového programového období.	Pokračuje
2.2	MAS zavede do svých aktivit některá opatření (navrhovaná Focus group) na eliminaci hrozeb:	
2.2.a	- Zajišťovat monitoring dotačních titulů a zajistit informace o zdrojích do území k potenciálním žadatelům,	Plněno průběžně
2.2.b	- Využívat komunitární programy (pro hrozbu: Nedostatečné množství finančních zdrojů pro realizaci),	Pokračuje
2.2.c	- Články v obecních zpravodajích, osobní schůzky se starosty, leták do každé schránky (pro hrozbu: Nedostatek žadatelů při výzvách MAS),	Plněno průběžně
2.3	Jednou z možných cest, jak účinněji problémy a potřeby řešit je i rozšíření Programových rámců IROP a PRV a zavedení nových Opatření/Fichí a současně navýšení alokace na Programové rámce.	Splněno
<b>3</b>	<b>Klíčové závěry k jednotlivým Programovým rámcům v rámci relevance SCLLD</b>	
3.1	Úprava SCLLD – rozšířit programový rámec o článek 20, Fiche Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, oblast f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.	Splněno
3.2	Úprava SCLLD – úprava finančního a indikátorového plánu	Splněno
3.3	Aktivity MAS – animace území, která zajistí připravenost žadatelů do dalších výzev v rámci Programových rámců PRV a IROP.	Plněno průběžně
3.4	Aktivity MAS – realizovat dotační poradenství a pomáhat subjektům hledat zdroje na pokrytí aktuálních potřeb v území.	Plněno průběžně
<b>4</b>	<b>Výstupy a výsledky implementace SCLLD</b>	
4.1	Úprava SCLLD – úprava finančního a indikátorového plánu.	Splněno
4.2	Aktivity MAS – neustálá propagace realizace SCLLD MAS Holicko v území. Možné nové nástroje: účast manažera MAS na jednání Svazku obcí, využít dny Holicka.	Plněno průběžně
4.3	Posílení podpory neziskového sektoru v rámci realizace SCLLD. Mezi novými nástroji může být: Cílenější komunikační strategie, využití šablon pro NNO jako nástroj podpory NNO, zavedení článku 20 v rámci PRV.	Plněno průběžně
4.4	Zkvalitnění komunikační strategie směrem ke srozumitelnějšímu podávání informací (možné nástroje: vzdělání pracovníka MAS, využití externích služeb, využití sociálních sítí).	Plněno průběžně

Doporučení Evaluační zprávy		Stav plnění
4.5	Posílit synergické účinky projektů. Možné nástroje: Zavedení nového kritéria: popis synergických vazeb, vyhledávání dalších nástrojů.	<b>Pokračuje</b>
4.6	V rámci vyhlášení výzev PRV zachovat jako preferenční kritérium „Uplatňování inovačních a více odvětvových přístupů“, kde je jako inovace považována i odborná vzdělávací akce pro místní občany.	<b>Splněno</b>
4.7	Animace území vedoucí k zajištění dostatečného počtu kvalitních projektů v rámci PR PRV.	<b>Plněno průběžně</b>

## 6. Informace o problémech a rizicích v průběhu realizace strategie CLLD

### 6.1. Informace o problémech, které se vyskytly v průběhu realizace SCLLD a přijatá opatření

#### 1) Programový rámec PRV – nedostatek žadatelů při výzvách MAS

Finanční plán uvedený ve Strategii CLLD MAS Holicko nebyl plněn dle původního předpokladu již od počátku realizace Strategie. Hlavním důvodem bylo zpoždění ve vyhlášení první výzvy (nemožnost vyhlásit výzvu v druhé polovině roku 2016), které se teď táhne celým obdobím. MAS Holicko se to sice snažila dohnat větší finanční alokací na jednotlivé vyhlášené Fiche, ale zase narazila na malou projektovou připravenost žadatelů a tím tedy i na zdánlivý nezájem území, který se postupně daří bořit neustálou propagací MAS a jejích aktivit.

**Opatření:** Neustálá propagace realizace Strategie CLLD MAS Holicko v území (prostřednictvím starostů a úspěšných žadatelů, tiskové zprávy v Holických listech, Zpravodaji Agrovenkova, na webu [www.holicko.cz](http://www.holicko.cz) a na facebooku).

#### 2) Programový rámec IROP – dosažení povinného milníku pro rok 2019

V případě programového rámce IROP se stalo problémem dosažení povinného milníku pro rok 2019 - do 31. 10. 2019 měly být předloženy žádosti o platbu na 41,17 % celkové alokace SCLLD. My jsme bohužel dosáhli na pouhých 19,27%. Naštěstí ŘO IROP zmírnil své požadavky a posuzoval pouze objem schválených žádostí o podporu ve výzvách MAS, což jsme splnili (58,6%). Milník pro rok 2020 (55,44%) by již dle plánu předkládání ŽoP měli plnit.

**Opatření:** Do finančního plánu programového rámce IROP se uvádí projekty, které podaly žádost o platbu do 31.10. daného roku. Bohužel většina projektů je sice plánována dle nejlepší vůle žadatelů, pak ale, protože se jedná většinou o stavební projekty, dochází ke zpoždění buď ve výběrovém řízení, nebo při realizaci samotných stavebních prací. Proto ačkoliv měla MAS Holicko zazávkováno k 31.10.2019 58,6% alokace, tak téměř všechny projekty v průběhu druhé poloviny roku 2019 požádaly o prodloužení termínu pro ukončení realizace. A to i přesto, že MAS mezi schválené žadatele rozeslala dopis s žádostí o urychlení realizace do 31.10.2019. Tím došlo k tomu, že bylo k 31.10.2019 podáno ŽoP za pouhých 19,27% alokace.

Z toho plyne, že tento jev je MAS schopná pouze zmírnit zazávkováním většího procenta finanční alokace a případnou co největší možnou podporou žadatelů (telefonické, e-mailové a osobní konzultace), tak aby docházelo k co nejmenší chybivosti.

## 6.2. Informace o potenciálních rizicích realizace SCLLD a opatření k jejich eliminaci

### 1) Neplnění finančního plánu

Nejzásadnějším rizikem je pomalé čerpání a tím pádem nedodržení finančního plánu Strategie CLLD. Důvodem je zpoždění, které jsme nabraly při vyhlášení prvních výzev, kde byla malá projektová připravenost žadatelů. MAS se sice neustále snaží propagovat svou činnost v území, čímž postupně dochází k nárůstu počtu podaných a tím i podpořených projektů do výzev MAS, přesto tu vždy existuje riziko nedodržení povinných milníků (ať už z pohledu prodlužování realizace projektů nebo třeba i odstoupení žadatelů od smlouvy o poskytnutí dotace).

**Opatření:** Neustálá podpora žadatelů ze strany MAS Holicko formou telefonických, e-mailových a osobních konzultací, tak aby koneční žadatelé se vyvarovali co nejvíce případným problémům a dopustili se co nejméně chyb v průběhu realizace svých projektů. Tím se alespoň trochu dopomůže k tomu, že žadatel dokončí projekt včas a bez chyb.

## 7. Závěr

Hlavním cílem této zprávy bylo zhodnotit současnou situaci naplňování strategie CLLD v průběhu roku 2019. Jednalo se o kompletní zhodnocení všech činností, které provádí MAS a podstatou samotného hodnocení byly vyhlášené výzvy a v závislosti na tom i přijaté a zrealizované projekty. Účelem této zprávy bylo zjistit, jak bylo dosaženo stanovených cílů a zda byly realizovány stanovené výstupy.

Vzhledem k tomu, že jsme na počátku druhé poloviny realizace Strategie CLLD, tak je zde vidět odpovídající plnění indikátorového a finančního plánu, které jsou také přibližně v polovině svého plnění.

Výjimku tvoří **klíčová aktivita D. Rozvoj cestovního ruchu**, kde jsme přibližně na 35% plnění indikátorů, tj. jedná se o nejméně řešenou oblast na Holicku. A to bohužel i přesto, že původní plán byl pouze v počtu jednotek realizovaných projektů. MAS Holicko se snaží přispět k plnění této klíčové aktivity prostřednictvím založení a fungování Turistické oblasti Pardubicko, ale přesto je to málo. Z tohoto pohledu se zdá, že je potřeba **více iniciovat území k podpoře cestovního ruchu v regionu**.

Z pohledu Programových rámců Strategie CLLD, byla v průběhu roku 2019 provedena kancelář MAS Holicko mid-term evaluace Strategie CLLD. Jejím výstupem byl návrh opatření, která povedou ke zlepšení naplňování cílů Strategie CLLD. Jedním z těchto kroků byla i následná **aktualizace Strategie CLLD (8/2019)**, v rámci které došlo k narovnání finančního a indikátorového plánu programového rámce PRV a přidání nové Fiche 7 - Podpora spolkového života. Na základě výsledků této hodnotící zprávy můžeme konstatovat, že tato aktualizace **programového rámce PRV** se v tuto chvíli jeví jako dostačující a není zapotřebí dalších opatření.

**V případě programového rámce IROP** je situace trochu odlišná, protože zde se musí aktualizovat finanční plán každý rok vždy do konce ledna dle skutečného plnění. A tak ačkoliv MAS Holicko provedla **aktualizaci finančního plánu v 1/2019**, tak ta již opět na konci roku neodpovídala skutečnému plnění k 31.10.2019. Z tohoto důvodu kancelář MAS provedla **v 1/2020 druhou aktualizaci finančního plánu** programového rámce IROP, která upraví finanční plán podle skutečného čerpání v roce 2019 a převede volnou alokaci z opatření 1-Vzdělávání (47,76Kč) do opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu. Tyto aktualizace programového rámce IROP se v tuto chvíli jeví jako dostačující a není zapotřebí dalších opatření.

I z pohledu dalšího obsahu (mimo programové rámce) se Strategie CLLD v tuto chvíli jeví jako dostatečná, a proto **Kontrolní výbor MAS Holicko nenavrhuje žádná další doporučení pro aktualizaci Strategie CLLD MAS Holicko.**

V případě implementační procesů a aktivit je situace trochu odlišná. Z pohledu doporučení Evaluační zprávy (mid-term evaluace) z 5/2019, sice byla v průběhu roku splněna většina doporučených aktivit v ní uvedených, ale na několika doporučeních se ještě stále intenzivně pracuje, tak aby došlo k jejich naplnění co nejdříve. Konkrétně ještě zbývá dořešit: napojení MAS na Hospodářskou komoru a přes ně na podnikatele, upravit SWOT analýzu a analýzu rizik Strategie CLLD při tvorbě strategie pro nové programové období, využívat komunitární programy a posílit vliv synergických efektů projektů.

Dále je potřeba zmínit, že v průběhu tvorby této hodnotící zprávy byly identifikovány problémy, jako je zpožděný harmonogram čerpání SCLLD oproti původnímu předpokladu a nedostatek žadatelů při výzvách MAS, což v sobě nese rizika v podobě neplnění finančního plánu, a to hlavně vůči blížícímu se milníku – 31.10.2020.

Proto **Kontrolní výbor MAS Holicko navrhuje tato opatření, která povedou ke zlepšení naplňování cílů strategie CLLD MAS Holicko:**

- **Dořešení doporučení Evaluační zprávy (mid-term evaluace) z 5/2019:** napojení MAS na Hospodářskou komoru a přes ně na podnikatele, upravit SWOT analýzu a analýzu rizik Strategie CLLD při tvorbě strategie pro nové programové období, využívat komunitární programy a posílit synergických efektů projektů.
- **Neustálá propagace realizace Strategie CLLD MAS Holicko v území** (prostřednictvím starostů a úspěšných žadatelů, tiskové zprávy v Holických listech, Zpravodaji Agrovenkova, na webu [www.holicko.cz](http://www.holicko.cz) a na facebooku),
- **Zazávazkování pokud možno co největšího procenta finanční alokace** – vyhlášení výzev v roce 2020 na celou zbývající alokaci, tak aby mohlo být podpořeno co nejvíce projektů a MAS překonala hodnotu milník (31.10.2020).
- **Neustálá podpora žadatelů ze strany MAS Holicko formou telefonických, e-mailových a osobních konzultací**, tak aby koneční žadatelé se vyvarovali co nejvíce případným problémům a dopustili se co nejméně chyb v průběhu realizace svých projektů. Tím se alespoň trochu dopomůže k tomu, že žadatel dokončí projekt včas a bez chyb.
- **Iniciace území k větší podpoře cestovního ruchu v regionu**, např. zlepšení služeb informačního centra, pokrok v přípravě budování sítě cyklostezek, hipposteze nebo naučných stezek, příprava budování nových turistických atraktivit (např. vyhlídky, rozhledny, obecní muzea,...), rozvoj ubytovacích a stravovacích zařízení, vydání nových propagačních a informačních materiálů, mapování kulturního a historického dědictví nebo místních tradic

V Holicích dne 25.5.2020

.....  
Lenka Bezdíčková, Obec Jaroslav  
Předsedkyně Kontrolního výboru MAS Holicko
