



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ STRATEGIE CLLD MAS HOLICKO

v období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Zpracovatel: Kontrolní výbor MAS Holicko

Konzultant: Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD

Obsah

1. ÚVOD	2
1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	2
1.2. INFORMACE O PODANÝCH/ SCHVÁLENÝCH ZMĚNÁCH STRATEGIE CLLD	2
1.3. OPATŘENÍ PŘI NEPLNĚNÍ ULOŽENÝCH POVINNOSTÍ	2
2. REALIZACE STRATEGIE CLLD	2
2.1. PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV	4
2.1.1. Výzva MAS Holicko č. 6 - PRV	4
2.1.2. 7. výzva MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2020)	7
2.1.3. Malý LEADER pro Holicko pro rok 2021	8
2.2. PRŮBĚH ADMINISTRACE VÝZEV	10
2.3. KATEGORIE SCHVÁLENÝCH ŽADATELŮ	11
2.4. MÍSTA REALIZACE SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ	12
3. VĚCNÝ POKROK V PLNĚNÍ CÍLŮ STRATEGIE CLLD	14
3.1. VĚCNÝ POKROK V PLNĚNÍ CÍLŮ PROGRAMOVÉHO RÁMCE PRV	14
3.1.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce PRV	16
3.1.2. Plnění indikátorového plánu Programového rámce PRV	21
3.1.3. Plnění finančního plánu Programového rámce PRV	22
3.2. VĚCNÝ POKROK V PLNĚNÍ CÍLŮ PROGRAMOVÉHO RÁMCE IROP	24
3.2.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce IROP	24
3.2.2. Plnění indikátorového plánu Programového rámce IROP	27
3.2.3. Plnění finančního plánu Programového rámce IROP	28
3.3. MÍSTA REALIZACE PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ	29
3.4. VĚCNÝ POKROK V PLNĚNÍ CÍLŮ SCLLD MIMO PROGRAMOVÉ RÁMCE	31
3.5. INFORMACE O DOSAŽENÝCH SYNERGICKÝCH EFEKTECH NA ÚROVNI OPATŘENÍ RESP. PODOPATŘENÍ STRATEGIE	36
3.6. HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY	36
4. ANIMACE STRATEGIE CLLD	37
4.1. PROPAGACE STRATEGIE CLLD	37
4.2. PODPORA ŽADATELŮ	38
4.3. ANIMACE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OPV VV	38
4.4. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A PARTNERŮ MAS	39
5. INFORMACE O PLNĚNÍ DOPORUČENÍ EVALUAČNÍ ZPRÁVY Z 5/2019	40
6. INFORMACE O PROBLÉMECH A RIZICÍCH V PRŮBĚHU REALIZACE STRATEGIE CLLD	42
6.1. INFORMACE O PROBLÉMECH, KTERÉ SE VYSKYTLY V PRŮBĚHU REALIZACE SCLLD A PŘIJATÁ OPATŘENÍ	42
6.2. INFORMACE O POTENCIÁLNÍCH RIZICÍCH REALIZACE SCLLD A OPATŘENÍ K JEJICH ELIMINACI	42
7. ZÁVĚR	43

1. Úvod

Předmětem této práce je vyhodnocení naplňování cílů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 - 2020 (SCLLD) s mottem: „Holicko – region plný života“.

Výchozím časovým obdobím pro tuto zprávu je období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, během kterého byly vyhlášeny 2 výzvy z obou programových rámců, které jsou uvedeny v SCLLD (1 výzva – PRV a 1 výzva – IROP) a 1 výzva na Malý LEADER pro Holicko z financí Programu obnovy venkova Pardubického kraje.

1.1. Základní údaje

Název MAS:	MAS Holicko, o.p.s
Integrovaná strategie:	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 - 2020
Registrační číslo strategie:	CLLD_15_01_232
Datum schválení Strategie:	17. 8. 2016
Pořadí hodnotící zprávy:	4
Sledované období:	1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

1.2. Informace o podaných/ schválených změnách strategie CLLD

Ve sledovaném období byla schválena žádost o změnu týkající se členské základny MAS Holicko a složení povinných orgánů MAS (vystoupení Zdeňka Meliše, přijetí Spolku rodičů a přátel dětí při Masarykově ZŠ, Věry Skutilové, Miloše Vlasáka, Jany Vodnroušové, Luboše Kvapila a SDH Horní Ředice). Změna byla podána 2.12.2019 a ŘO schválena 12.3.2020.

Dále byly podány 2 žádosti o změnu SCLLD:

- 1) **Aktualizace finančního plánu programového rámce IROP** - dle skutečného čerpání v letech 2018 a 2019, převod zbývajících nezazávkovaných alokací ve výši 47,76 Kč (příspěvek EU) z opatření 1. Vzdělávání do opatření 2. Bezpečnost silničního provozu. - Změna byla podána 8.1.2020 a ŘO schválena 11.2.2020.
- 2) **Změna v členské základně a složení povinných orgánů MAS** (přijetí SDH Holice) - Změna byla podána 23.6.2020 a ŘO schválena 2.7.2020.

1.3. Opatření při neplnění uložených povinností

Nerelevantní – žádná opatření ŘO nebyla vůči MAS Holicko uplatněna.

2. Realizace strategie CLLD

V průběhu sledovaného období MAS Holicko vyhlásila 2 výzvy příjmu žádostí o podporu pro oba programové rámce SCLLD a 1 výzvu na Malý LEADER pro Holicko z financí Programu obnovy venkova

Pardubického kraje. V rámci těchto výzev poskytovala MAS Holicko potencionálním příjemcům podporu, ať již formou konzultací (osobní, telefon, e-mail) tak i formou realizovaných seminářů. V průběhu celého roku probíhala administrace těchto výzev (hodnocení a výběr projektů, komunikace se žadateli a řídicími orgány, apod.).

V rámci programového rámce PRV byla vyhlášena výzva č. 6 - PRV, v rámci které bylo přijato 14 žádostí o dotaci a následně schváleno 13 projektů. Z toho 7 projektů v průběhu 11-12/2020 podepsalo Dohodu o poskytnutí dotace (výše dotace: 1.256.203,-Kč). Další 4 projekty jsou stále v procesu kontroly (výše dotace: 1.345.250,-Kč) a bohužel 2 projektům byla ze strany SZIF ukončena administrace (požadovaná výše dotace: 825.500,-Kč).

Z předchozích výzev PRV bylo 13 projektů z programového rámce PRV již v pětileté udržitelnosti (výše dotace: 5.385.307,-Kč). Další 8 projektů bylo v realizaci (výše dotace: 3.481.300,-Kč). Z toho 4 projekty podaly Žádost o platbu (výše dotace: 1.039.237,-Kč) a 2 projekty (620.000,-Kč) z důvodu komplikací s opatřeními proti COVID nepodaly závěrečnou žádost o proplacení. S tím ale souvisí i komplikace pro MAS - neplnění finančního a indikátorového plánu: tyto projekty se totiž zavázaly k vytvoření 1,5 pracovního místa, což je povinný indikátor pro MAS č. 94800.

V tuto chvíli nám tedy ještě zbývá volná finanční alokace ve výši 1.935.713,-Kč (úspora projektů, ukončení administrace projektů ze strany SZIF nebo uplatněné sankce SZIF vůči zrealizovaným projektům) + očekáváme finance z přechodného období. Valná hromada MAS Holicko v průběhu příštího sledovaného období rozhodne o tom, na které Fiche budou tyto volné finanční prostředky převedeny a následně bude počátkem roku 2022 vyhlášena výzva. Rozhodovat se bude jak podle zájmu území, tak i podle toho, aby byl naplněn indikátorový plán Strategie CLLD.

V rámci programového rámce IROP byla vyhlášena výzva č. 7 - IROP, v rámci které byly přijaty celkem 2 žádosti o dotaci (z toho 1 žádost byla stornována ještě před ukončením výzvy). V 12/2020 byl 1 vybraný projekt MAS předán na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti (výše dotace: 1.054.044,59Kč).

Celkem bylo v tomto období 14 projektů v realizaci (výše dotace: 14.281.829,51Kč), z toho 10 projektů podalo Žádost o platbu (výše dotace: 11.986.188,44Kč). Další 6 projektů již bylo v udržitelnosti (výše dotace: 5.243.330,53Kč).

V případě programového rámce IROP došlo letos poprvé k rychlejšímu naplňování indikátorového a finančního plánu oproti původnímu předpokladu. A i v případě milníku stanovém řídicím orgánem IROP pro rok 2020 (čerpání min. 55,44% alokace) jsme nad hodnotou pro rok 2021 (čerpání min. 70% alokace). MAS Holicko má totiž vyčerpáno již 78,96% své alokace určené pro programový rámec IROP. Na druhou stranu zde máme ještě volnou alokaci ve výši 1.240.178,37Kč, na kterou bude v 6/2021 vyhlášena výzva.

Dále byla vyhlášena výzva na Malý LEADER pro Holicko z financí Programu obnovy venkova Pardubického kraje, v rámci které bylo přijato 13 žádostí o podporu. 10 z nich bylo MAS vybráno k podpoře a následně předloženo na Pardubický kraj ke schválení (výše podpory: 350.000,-Kč). Zbýlé 3 žádosti byly schváleny jako náhradníci pro případ, že by se některý z vybraných projektů nerealizoval (např. z důvodu odstoupení žadatele). Dále bylo v tomto období 10 projektů z loňské výzvy v realizaci (výše podpory: 249.000,-Kč)

2.1. Přehled vyhlášených výzev

V roce 2020 MAS Holicko vyhlásila a úspěšně zrealizovala 2 výzvy pro oba programové rámce SCLLD (1x programový rámec PRV, 1x programový rámec IROP). Úspěšně zrealizovaná výzva znamená, že Programový výbor na základě hodnocení Výběrové komise schválil k financování minimálně 1 projekt, který byl následně předán k závěrečnému ověření na Řídící orgán.

Tabulka 1 – Počet úspěšně zrealizovaných výzev MAS

	Plán uvedený v SCLLD	Plnění		
		Rok 2020	Celkem 2016 - 2020	%
Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou	15	2	11	73,33%

Kromě toho MAS Holicko vyhlásila a úspěšně zrealizovala ještě 1 výzvu, a to výzvu na Malý LEADER pro Holicko z financí Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Tato výzva nevychází ze žádného programového rámce CLLD – pomáhá podpořit projektové záměry, které jsou uvedeny ve strategii, ale nemohly být podpořeny z programových rámců. Z tohoto důvodu se tato výzva nezapočítává do povinných indikátorů sledujících průběh realizace SCLLD (tabulka výše).

2.1.1. Výzva MAS Holicko č. 6 - PRV

Vyhlášení výzvy: 7.1.2020

Příjem žádostí: 7.1.2020 – 16.3.2020

Vyhlášené Fiche: 3 - Podpora malých podniků, 5 - Zpřístupnění lesa návštěvníkům, 7 – Podpora spolkového života

Finanční alokace: 3.586.731,-Kč

Tabulka 2 – Finanční alokace pro výzvu MAS Holicko č. 6 - PRV

Výzva č. 6 - PRV	Finanční alokace výzvy	Počet přijatých projektů	Výše požadované dotace	Počet schválených projektů	Výše schválené dotace - MAS
3 – Podpora malých podniků	1.474.358,- Kč	7	2.374.216,- Kč	6	1.474.216,- Kč
5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům	980.000,- Kč	2	980.000,- Kč	2	980.000,- Kč
7 – Podpora spolkového života	1.132.373,- Kč	5	972.737,- Kč	5	972.737,- Kč
Celkem	3.586.731,- Kč	14	4.326.953,- Kč	13	3.426.953,- Kč

Průběh výzvy: Bylo přijato celkem 14 žádostí o dotaci (7 žádostí do Fiche 3, 2 žádosti do Fiche 5 a 5 žádostí do Fiche 7). Všechny prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti s kladným výsledkem a u všech těchto žádostí proběhlo místní šetření (provedl vedoucí pracovník pro CLLD).

Tabulka 3 – Přijaté žádosti o dotaci v rámci Výzvy MAS Holicko č.6 - PRV

Registrační číslo žádosti	Název žadatele	Název projektu	Místo realizace projektu (NUTS 5)	Počet bodů	Status	Výše schválené dotace *
Fiche 3 – Podpora malých podniků						1.028.716,-Kč
20/006/19210/453/088/000896	Jaroslava Konečná	Stavební úpravy domu čp.313 pro zřízení 3 dvouúžkových pokojů.	Holice	70	Schválený SZIF	269.040,-Kč
20/006/19210/453/088/000890	Josef Branda	Holická zmrzlina u Pepeho	Holice	72	Schválený SZIF	117.076,-Kč
20/006/19210/453/088/000888	PIVOVAR MORDÝŘ s.r.o.	TECHNOLOGICKÉ ZEFEKTIVNĚNÍ VÝROBY	Dolní Ředice	65	Ukončena administrace SZIF	0 Kč
20/006/19210/453/088/000895	Antonín Jablonský	Pořízení chladírenského vozu	Chvojenec	57	Závěrečná kontrola SZIF	313.650,-Kč
20/006/19210/453/088/000894	Aleš Erber	Vybavení pro environmentální poradenství 2020	Chvojenec	71	Schválený SZIF	58.950,-Kč
20/006/19210/453/088/000889	VODA TOPENÍ SERVIS s.r.o.	Pořízení techniky do stavební činnosti	Horní Ředice	65	Závěrečná kontrola SZIF	270.000,-Kč
	Luboš Vohralík	Technické vybavení pro stavební činnost	Poběžovice u Holic	55	Nevybrán MAS	0 Kč
Fiche 5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům						600.000,-Kč
20/006/19210/453/088/000891	AUTOMOTOKLUB Holice v AČR	Aktivace klidové lokality Na Hlubáku - 1. fáze	Holice	90	Ukončena administrace SZIF	0 Kč
20/006/19210/453/088/000887	"Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o."	Rekonstrukce stezky pro turisty na PUPFL	Vysoké Chvojno	65	Závěrečná kontrola SZIF	600.000,-Kč
Fiche 7 – Podpora spolkového života						972.737,- Kč
20/006/19210/453/088/000886	Tělocvičná jednota Sokol Holice	Do sokolovny za kulturou a vzděláváním	Holice	80	Schválený SZIF	240.000,-Kč
20/006/19210/453/088/000893	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Ředice	Vybavení společenské místnosti hasičské zbrojnice SDH Horní Ředice	Horní Ředice	90	Schválený SZIF	229.579,-Kč
20/006/19210/453/088/000897	Obec Vysoké Chvojno	Vybavení pro spolky - Vysoké Chvojno	Vysoké Chvojno	75	Schválený SZIF	112.288,-Kč
20/006/19210/453/088/000892	TJ Sokol Chvojenec z.s.	Vybavení zázemí pro činnost TJ Sokol Chvojenec z.s.	Chvojenec	90	Schválený SZIF	229.270,-Kč
20/006/19210/453/088/000885	Jezdecká stáj Dolní Jelení, spolek	Jezdecká stáj veřejnosti	Horní Jelení	70	Schválený SZIF	161.600,-Kč

*Výše schválené dotace uvedené v tabulce 3 je výše dotace, kterou jednotlivým projektům schválil SZIF. Rozdíl (oproti tabulce 2) vznikl díky tomu, že 2 projektům byla v rámci závěrečné kontroly SZIF ukončena administrace. Důvodem bylo nedodání požadované dokumentace v termínu.

Výběrová komise zasedala v termínech 11.5.2020 a 20.5.2020 (veřejná obhajoba projektů). Všechny žádosti splnily minimální bodovou hranici. Programový výbor rozhodl 25.5.2020 o podpoření všech projektů, na které vystačí alokace výzvy. To znamená, že poslední projekt v rámci Fiche 3 nemohl být podpořen, protože na něj nevystačily finance.

Dne 26.6.2020 byly všechny žádosti o dotaci předány na SZIF k jejich kontrole. V rámci této kontroly byla 2 projektům ukončena administrace. Důvodem bylo nedoložení požadovaných dokumentů v termínu. V 11/2020 – 1/2021 byly schváleny SZIFem ostatní projekty, které nemusely dokládat výběrové řízení. V prvním čtvrtletí byly schváleny další projekty výzvy, které výběrové řízení dokládaly.

Tabulka 4 – Parametry schválených žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS Holicko č.6 – PRV – Fiche 3 – Podpora malých podniků

Fiche 3 – Podpora malých podniků	Měrná jednotka	Hodnota
Počet schválených projektů MAS	Počet	6
Počet schválených projektů SZIF	Počet	5
Ekonomická činnost žadatele	-	<ul style="list-style-type: none"> • 1x I - Ubytování, stravování a pohostinství + C - Zpracovatelský průmysl, • 1x M- Profesní, vědecké a technické činnosti, • 2x I - Ubytování, stravování a pohostinství, • 1x F – Stavebnictví.
Počet inovativních projektů	Počet	2
Počet projektů šetrných k životnímu prostředí	Počet	1
Počet projektů zlepšujících základní vybavení nebo služby v obci	Počet	0
Počet projektů využívajících stávající zařízení a objekty	Počet	5
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	Pracovní místa	0
Modernizace nevyužitých prostor	m ²	0
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	<ul style="list-style-type: none"> • 3x: 501 – 2.000 obyvatel, • 2x: nad 5.000 obyvatel.
Typ žadatele	-	<ul style="list-style-type: none"> • 4x Podnikatel – FO (mikropodnik), • 5x Podnikatel – PO (mikropodnik).
Počet začínajících podnikatelů	Žadatel	2
Počet žen (v případě FO)	Žadatel	1
Počet držitelů regionální značky „KRAJ PERŠTEJNŮ regionální produkt“	Žadatel	1
Počet nově vzniklých živnostenských oprávnění	Živnostenské oprávnění	0
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	57,82%

Tabulka 5 – Parametry schválených žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS Holicko č.6 – PRV – Fiche 5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům

Fiche 5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům	Měrná jednotka	Hodnota
Počet schválených projektů MAS	Počet	2
Počet schválených projektů SZIF	Počet	1
Počet projektů zaměřených na posílení rekreační funkce lesa (např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty, značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků)	Počet	1
Počet projektů zaměřených na usměrňování návštěvnosti území (např. zřizování odpočinkových stanišť, přístřešků, informačních tabulí, závory)	Počet	0
Počet projektů zaměřených na údržbu lesního prostředí (např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně)	Počet	1
Počet inovativních projektů	Počet	1
Počet projektů šetrných k životnímu prostředí	Počet	1
Počet projektů zaměřených na regionální tematiku	Počet	1
Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela cílová skupina	Počet	0

Fiche 5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům	Měrná jednotka	Hodnota
Počet projektů, jejichž místo realizace jsou lesy zvláštního určení	Počet	0
Délka nově vybudovaných stezek pro turisty	m	0
Délka zrekonstruovaných stezek pro turisty	m	392,1
Počet herních, naučných a fitness prvků	ks	0
Počet odpočinkových stanišť	ks	0
Počet přístřešků	ks	0
Počet informačních tabulí	ks	1
Typ žadatele	-	• 1x Podnikatel – PO (velký podnik)
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	34,27%

Tabulka 6 – Parametry schválených žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS Holicko č.6 – PRV – Fiche 7 – Podpora spolkového života

Fiche 7 – Podpora spolkového života	Měrná jednotka	Hodnota
Počet schválených projektů MAS	Počet	5
Počet schválených projektů SZIF	Počet	5
Počet projektů, jejichž výstupy budou sloužit pro více aktivit/účelů v obci	Počet	5
Počet projektů, jejichž výstupy jsou efektivně využívány: 30 – 49 hodin/rok	Počet	0
Počet projektů, jejichž výstupy jsou efektivně využívány: min 50 hodin/rok a více	Počet	5
Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela cílová skupina	Počet	3
Počet projektů, které podpořily činnost spolkových a neziskových organizací (NNO nebo církev a její organizace jsou buď žadatelem, nebo mají předmět realizace projektu v dlouhodobém pronájmu)	Počet	4
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	Pracovní místa	0
Velikost obce, kde je projekt realizován	Počet	<ul style="list-style-type: none"> • 1x: do 500 obyvatel, • 2x: 501 – 2.000 obyvatel, • 1x: 2.001 – 5.000 obyvatel, • 1x: nad 5.000 obyvatel.
Typ žadatele	Počet	0
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	0

2.1.2. 7. výzva MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2020)

Vyhlášení výzvy: 8.6.2020

Příjem žádostí: 8.6.2020 – 3.9.2020

Vyhlášené opatření: 2 – Bezpečnost silničního provozu

Finanční alokace: 1.201.285,29 Kč

Tabulka 7 – Finanční alokace pro 7. výzvu MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2020)

7.výzva MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2020)	Finanční alokace výzvy	Počet přijatých projektů	Výše požadované dotace	Počet schválených projektů	Výše schválené dotace - MAS
2 – Bezpečnost silničního provozu	1.201.285,29 Kč	2	1.054.044,59 Kč	1	1.054.044,59 Kč

Průběh výzvy: Byly přijaty 2 žádosti o podporu. Z toho 1 žádost byla stornována ještě před ukončením výzvy. Druhá žádost prošla kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí s kladným výsledkem.

Tabulka 8 – Přijaté žádosti o dotaci v rámci 7. výzvy MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2020)

Registrační číslo žádosti	Název žadatele	Název projektu	Místo realizace projektu (NUTS 5)	Počet bodů	Status	Výše schválené dotace
Opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu						1.054.044,59 Kč
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014481	OBEC NOVÁ VES	Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Nová Ves výstavbou chodníku a rekonstrukcí veřejného osvětlení	Nová Ves	-	Stažen žadatelem	0 Kč
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015014	OBEC NOVÁ VES	Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Nová Ves výstavbou chodníku a rekonstrukcí veřejného osvětlení	Nová Ves	70	Vybraný MAS	1.054.044,59 Kč

Výběrová komise zasedala v termínech 5.11.2020 a 19.11.2020. Žádost splnila minimální bodovou hranici. Programový výbor rozhodl 9.12.2020 o schválení tohoto projektu.

Dne 11.12.2020 byla žádost o podporu předána na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.

Tabulka 9 – Parametry schválených žádostí o dotaci v rámci 7. výzvy MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2020)

Opatření 2 - Bezpečnost silničního provozu	Měrná jednotka	Hodnota
Počet schválených projektů celkem	Počet	1
Počet projektů týkající se chodníků nebo stezek pro pěší	Počet	1
Počet projektů řešících místa pro přecházení	Počet	1
Počet projektů týkající se realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy	Počet	0
Počet projektů, jež zajišťují přístup k centru, či občanské vybavenosti	Počet	0
Počet projektů šetrných k životnímu prostředí	Počet	1
Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela cílová skupina	Počet	1
Délka nově vybudovaných chodníků nebo stezek pro pěší	m	91,9
Délka zrekonstruovaných chodníků nebo stezek pro pěší	m	0
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	• 1x: do 500 obyvatel.
Typ žadatele	-	• 1x Obce a jejich organizace
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	8,57%

2.1.3. Malý LEADER pro Holicko pro rok 2021

Vyhlášení výzvy: 7.9.2020

Příjem žádostí: 7.9.2020 – 30.10.2020

Podporované oblasti: Obnova a údržba občanské vybavenosti (radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, hřiště, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, ostatní), obnova a údržba venkovského prostoru, obnova a údržba sportovních zařízení, obnova a údržba sakrálních staveb, podpora péče o krajinu, apod.

Finanční alokace: 350.000,-Kč

Tabulka 10 – Finanční alokace výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2021

Malý LEADER pro Holicko pro rok 2021	Finanční alokace výzvy	Počet přijatých projektů	Výše požadované dotace	Počet schválených projektů	Výše schválené dotace
Obnova a údržba občanské vybavenosti, venkovského prostoru, sportovních zařízení, sakrálních staveb a podpora péče o krajinu	350.000,00 Kč	13	451.164,- Kč	10	350.000,- Kč

Průběh výzvy: V průběhu výzvy bylo přijato celkem 13 žádostí o podporu. Celková požadovaná výše příspěvku činila 451.164,-Kč, což bylo o 101 tis. Kč více, než umožňovala výzva POV PK. Všechny žádosti prošly kontrolou formálních náležitostí s kladným výsledkem.

Tabulka 11 – Přijaté žádosti o dotaci v rámci výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2021

Registrační číslo žádosti	Název žadatele	Název projektu	Místo realizace projektu (NUTS 5)	Počet bodů	Status	Výše schválené dotace
ML-2020/1	Obec Pobežovice u Holic	Modernizace topení v dětském centru Rákosníček	Pobežovice u Holic	50	Vybraný MAS	35.000,-Kč
ML-2020/6	Obec Radhošť	Vybavení nástavby půdního prostoru obecního úřadu v Radhošti	Radhošť	50	Vybraný MAS	35.000,-Kč
ML-2020-13	Obec Ostřetín	Modernizace MŠ - výměna elektrické instalace	Ostřetín	45	Vybraný MAS	35.000,-Kč
ML-2020/9	Obec Horní Ředice	Oprava bývalé hasičské zbrojnice	Horní Ředice	45	Vybraný MAS	35.000,-Kč
ML-2020/7	Obec Dolní Ředice	Zkvalitnění spolkového života	Dolní Ředice	45	Vybraný MAS	35.000,-Kč
ML-2020/3	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Holice	Vysoušecí skříň	Holice	40	Vybraný MAS	35.000,-Kč
ML-2020/10	Obec Dolní Roveň	Oprava osvětlení multifunkčního sportoviště	Dolní Roveň	40	Vybraný MAS	35.000,-Kč
ML-2020/4	Obec Jaroslav	Ozvučení a dovybavení prostoru altánu za bývalou školou	Jaroslav	40	Vybraný MAS	35.000,-Kč
ML-2020/8	Spolek rodičů a přátel LMŠ Hlubáček	Přístřešek zázemí LMŠ Hlubáček	Holice	40	Vybraný MAS	35.000,-Kč
ML-2020/12	Obec Chvojenec	Úpravy u objektu č.p. 115 Chvojenec	Chvojenec	35	Vybraný MAS	35.000,-Kč
ML-2020/5	Obec Uhersko	Oprava občanské vybavenosti v obci Uhersko	Uhersko	30	Náhradník	34.300,-Kč
ML-2020/2	Obec Býšť	Hoděšovice - Oprava oplocení pomníku padlých	Býšť	25	Náhradník	35.000,-Kč
ML-2020/11	Obec Chvojenec	Výměna plotu u č.p. 141 Chvojenec	Chvojenec	25	Náhradník	31.864,-Kč

Výběrová komise zasedala v termínech 5.11.2020 a 19.11.2020. Obodovala jednotlivé projekty a seřadila je sestupně dle získaných bodů v rámci preferenčních kritérií, dle počtu dosud podpořených žádostí z předchozích výzev Malého LEADERu a dle data a času podání žádosti na MAS. Dne 9.12.2020 proběhl Programový výbor MAS Holicko, který schválil pořadí projektů a rozhodl o zařazení prvních 10 projektů do žádosti MAS Holicko do POV PK. S tím, že další 3 projekty byly schváleny jako náhradníci

pro případ, že by se některý z vybraných projektů nerealizoval (např. z důvodu odstoupení žadatele). Výběr případného náhradníka bude probíhat dle pořadí uvedeném v tabulce výše.

Dne 14.12.2020 byly všechny vybrané a náhradní žádosti o podporu předány na Pardubický kraj ke schválení.

Tabulka 12 – Parametry schválených žádostí o dotaci v rámci výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2021

Malý LEADER Pro Holicko	Měrná jednotka	Hodnota
Počet schválených projektů celkem	Počet	10
Počet projektů zaměřených na zařízení pro spolkovou činnost	Počet	5
Počet projektů zaměřených na obnovu sportovního zařízení	Počet	1
Počet projektů zaměřených na obnovu multifunkčního zařízení	Počet	0
Počet projektů zaměřených na obnovu kulturního zařízení	Počet	0
Počet projektů zaměřených na obnovu sakrálních staveb a památek	Počet	0
Počet projektů zaměřených na obnovu hasičské zbrojnice	Počet	1
Počet projektů zaměřených na obnovu MŠ	Počet	3
Počet projektů zaměřených na obnovu dětského hřiště	Počet	0
Počet projektů zaměřených na úpravu veřejného prostranství	Počet	1
Počet projektů zaměřených na podporu péče o krajinu	Počet	0
Počet projektů, jejichž výstupy podpoří komunitní život v obci (např. spolková činnost)	Počet	10
Počet projektů, jejichž výstupy podpoří práci s dětmi	Počet	8
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	<ul style="list-style-type: none"> • 3x: do 500 obyvatel, • 4x: 501 – 2.000 obyvatel, • 1x: 2.001 – 5.000 obyvatel, • 2x: Nad 5.000 obyvatel.
Typ žadatele	-	<ul style="list-style-type: none"> • 8x: Obce a jejich organizace, • 2x: NNO.
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	57,43%

2.2. Průběh administrace výzev

Následující tabulka shrnuje administraci všech výzev MAS Holicko vyhlášených od začátku realizace Strategie CLLD, tj. od 18.8.2016. Samostatně je zde vypíchnut sledovaný rok 2020. V tabulce je možné vyčíst, kolik žádostí o podporu bylo přijato a hodnoceno, kolik jich bylo schváleno, kolik jich je v realizaci, apod.

V období 2016 – 2019 proběhly každoročně 4 výzvy pro předkládání žádostí o dotaci (1x programový rámec PRV, 2x programový rámec IROP a 1x Malý LEADER pro Holicko). Ve sledovaném roce 2020 to byly pouze 3 výzvy (1x programový rámec PRV, 1x programový rámec IROP a 1x Malý LEADER pro Holicko).

Letos jsme hodnotili 29 nových projektů (administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti, věcné hodnocení), z toho 16 projektů bylo z výzev pro programové rámce PRV a IROP. Dalších 40 projektů bylo v realizaci (30 projektů z výzev pro programové rámce). U těchto projektů jsme přijali 21 hlášení o změně, 36 monitorovacích zpráv a 15 žádostí o proplacení.

Tabulka 13 – Průběh administrace výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 - 2020

Průběh administrace výzev	Rok 2020			Celkem 2016 - 2020
	Výzvy prog.rámců PRV a IROP	Výzvy Malý LEADER	Celkem rok 2020	
Počet podaných projektů	16	13	29	119
Počet projektů vyřazených ve formálním hodnocení	0	0	0	5
Počet projektů vyřazených ve věcném hodnocení	0	0	0	0
Počet vybraných projektů	14	10	24	96
Počet náhradníků	0	3	3	6
Počet podaných odvolání na MAS	0	0	0	0
Počet vyřazených projektů ŘO	2	0	2	2
Počet projektů s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace	17	10	27	79
Počet projektů v realizaci (neukončené k 31.12. daného roku)	15	8	23	79
Počet podaných Hlášení o změnách	21	0	21	59
Počet podaných Monitorovacích zpráv	36	0	36	63
Kontrola na místě realizace projektu	31	0	31	98
Počet podaných Závěrečných Žádostí o proplacení	15	2	17	57
Počet projektů v době udržitelnosti (k 31.12. daného roku)	17	0	17	32

2.3. Kategorie schválených žadatelů

Níže uvedená tabulka uvádí kategorie žadatelů, kteří projekt podali a kteří byli schváleni v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených od začátku realizace Strategie CLLD, tj. od 18.8.2016. Samostatně je zde uveden právě sledovaný rok 2020.


Ze zjištěných výsledků je patrné, že nejvíce schválených žadatelů jsou obce (57,4%). Ostatních typů žadatelů je podstatně méně: podnikatelské subjekty – 19,1%, NNO – 13,8% a zemědělci – 9,5%.

V případě srovnání částek schválené dotace to vypadá obdobně: obce získaly 65,2% dotace, podnikatelské subjekty 16,9% a zemědělci 14,5%. Rozdíl je ale u NNO, které získaly pouhých 3,4% dotace, a to i přesto, že počet schválených projektů je podobný jako u podnikatelů a zemědělců. Rozdíl je způsoben tím, že NNO mohly do roku 2019 žádat pouze v rámci výzev Malého LEADERu, kde je maximální výše dotace pouze 35 tis. Kč. Teprve v letošním roce (2020) jim byla otevřena nová Fiche v rámci programového rámce PRV. Díky tomu se jim průměrná výše schválené dotace navýšila na 88 tis. Kč. Ostatní kategorie žadatelů (podnikatelé, zemědělci, obce) mají průměrnou výši schválené dotace mezi 312 - 538 tis. Kč.

Tabulka 14 – Kategorie schválených žadatelů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2020

Monitoring typu schválených žadatelů	Rok 2020			Celkem 2016 - 2020	%
	Výzvy prog.rámců PRV a IROP	Výzvy Malý LEADER	Celkem rok 2020		
Stát a jeho organizace	0	0	0	0	0%
Obce, svazky obcí nebo jejich organizace	1.166.332,59Kč (2 projekty)	280.000,-Kč (8 projektů)	1.446.332,59Kč (10 projektů)	21.760.138,63Kč (54 projektů)	65,20%
Círky a jejich organizace	0	0	0	0	0%
Nestátní neziskové organizace	860.449,-Kč (4 projekty)	70.000,-Kč (2 projekty)	930.449,-Kč (6 projektů)	1.139.983,-Kč (13 projektů)	3,42%

Monitoring typu schválených žadatelů	Rok 2020			Celkem 2016 - 2020	%
	Výzvy prog.rámců PRV a IROP	Výzvy Malý LEADER	Celkem rok 2020		
Zemědělci	0	0	0	4.843.723,-Kč (9 projektů)	14,52%
Podnikatelské subjekty	1.628.716,-Kč (6 projektů)	0	1.628.716,-Kč (6 projektů)	5.624.637,-Kč (18 projektů)	16,86%
Celkem	3.655.497,59Kč (12 projektů)	350.000,-Kč (10 projektů)	4.005.497,59Kč (22 projektů)	33.368.481,63Kč (94 projektů)	100%

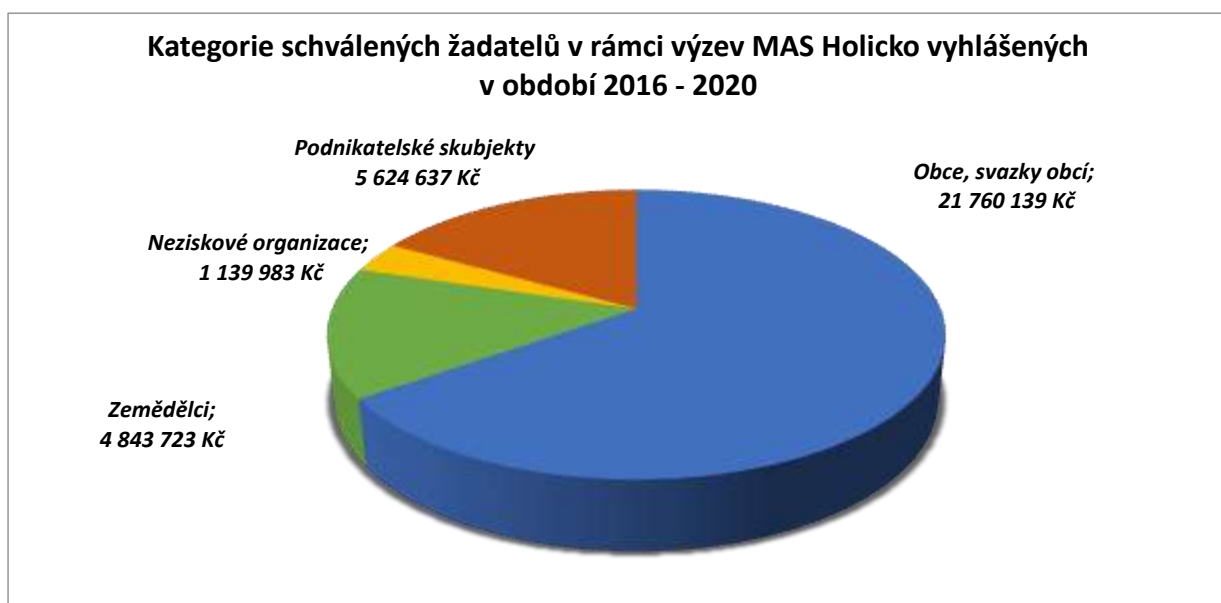

2.4. Místa realizace schválených projektů

Následující tabulka uvádí místa realizace schválených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených od začátku realizace Strategie CLLD, tj. od 18.8.2016.

Počet míst realizace neodpovídá zcela přesně počtu schválených projektů, neboť některé projekty jsou realizovány na více místech (oplocenky).


Jak je vidět, daří se nám pokrýt skoro celé území MAS. Zatím jediná obec, která nevyužila dotací MAS Holicko je obec Týništko. Dále nejméně čerpají obce Radhošť, Uhersko, Vysoké Chvojno a Jaroslav. Naopak nejvíce peněz poputuje do obcí Horní Ředice, Dolní Roveň, Ostřetín, Chvojenec a Horní Jelení.


Tabulka 15 – Místa realizace schválených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2020

Místo realizace schválených projektů	Rok 2020			Celkem 2016 - 2020	%
	Výzvy prog.rámců PRV a IROP	Výzvy Malý LEADER	Celkem rok 2020		
Býšť	0	0	0	2.024.216,86Kč (4,31 projekty)	6,07%
Dolní Roveň	0	35.000,-Kč (1 projekt)	35.000,-Kč (1 projekt)	4.544.574,71Kč (6 projektů)	13,62%
Dolní Ředice	0	35.000,-Kč (1 projekt)	35.000,-Kč (1 projekt)	2.157.339,46 Kč (7 projektů)	6,47%
Holice	626.116,-Kč (3 projekty)	70.000,-Kč (2 projekty)	696.116,-Kč (5 projektů)	1.556.692,55Kč (15 projektů)	4,67%

Místo realizace schválených projektů	Rok 2020			Celkem 2016 - 2020	%
	Výzvy prog.rámců PRV a IROP	Výzvy Malý LEADER	Celkem rok 2020		
Horní Jelení	161.600,-Kč (1 projekt)	0	161.600,-Kč (1 projekt)	3.622.635,80Kč (6 projektů)	10,86%
Horní Ředice	499.579,-Kč (2 projekty)	35.000,-Kč (1 projekt)	534.579,-Kč (3 projekty)	5.216.483,31Kč (12 projektů)	15,63%
Chvojenec	601.870,-Kč (3 projekty)	35.000,-Kč (1 projekt)	636.870,-Kč (4 projekty)	3.531.458,37Kč (12,06 projektů)	10,58%
Jaroslav	0	35.000,-Kč (1 projekt)	35.000,-Kč (1 projekt)	955.378,22Kč (3 projekty)	2,86%
Ostřetín	0	35.000,-Kč (1 projekt)	35.000,-Kč (1 projekt)	4.108.920,13Kč (10 projektů)	12,31%
Poběžovice u Holic	0	35.000,-Kč (1 projekt)	35.000,-Kč (1 projekt)	1.085.081,57Kč (3,68 projekty)	3,25%
Radhošť	0	35.000,-Kč (1 projekt)	35.000,-Kč (1 projekt)	94.900,-Kč (3 projekty)	0,28%
Trusnov	0	0	0	2.021.889,14Kč (3 projekty)	6,06%
Týništko	0	0	0	0	0%
Uhersko	0	0	0	345.835,65Kč (2 projekty)	1,04%
Vysoké Chvojno	712.288,-Kč (2 projekty)	0	712.288,-Kč (2 projekty)	889.522,16Kč (4,61 projekty)	2,67%
Nová Ves	1.054.044,59Kč (1 projekt)	0	0	1.213.553,70Kč (2,34 projektu)	3,64%
Celkem	3.655.497,59Kč (12 projektů)	350.000,-Kč (10 projektů)	4.005.497,59Kč (22 projektů)	33.368.481,63Kč (94 projektů)	100%

Místa realizace schválených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených období 2016 - 2020

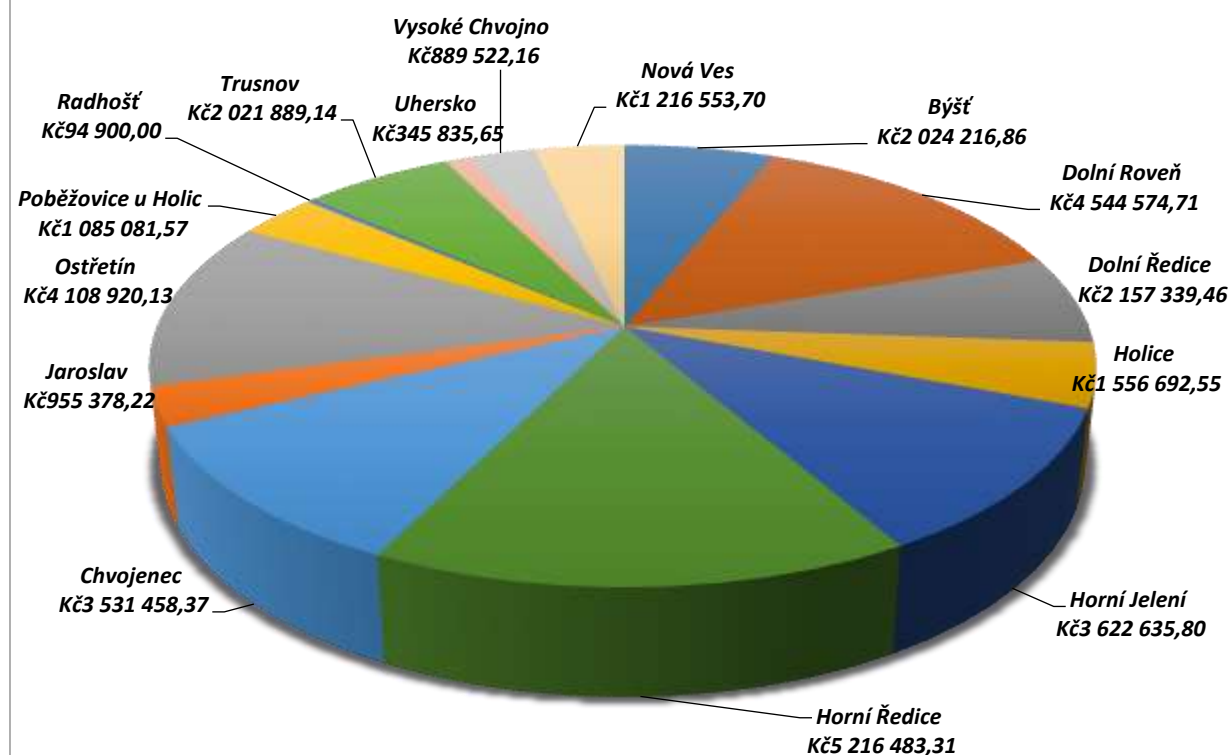

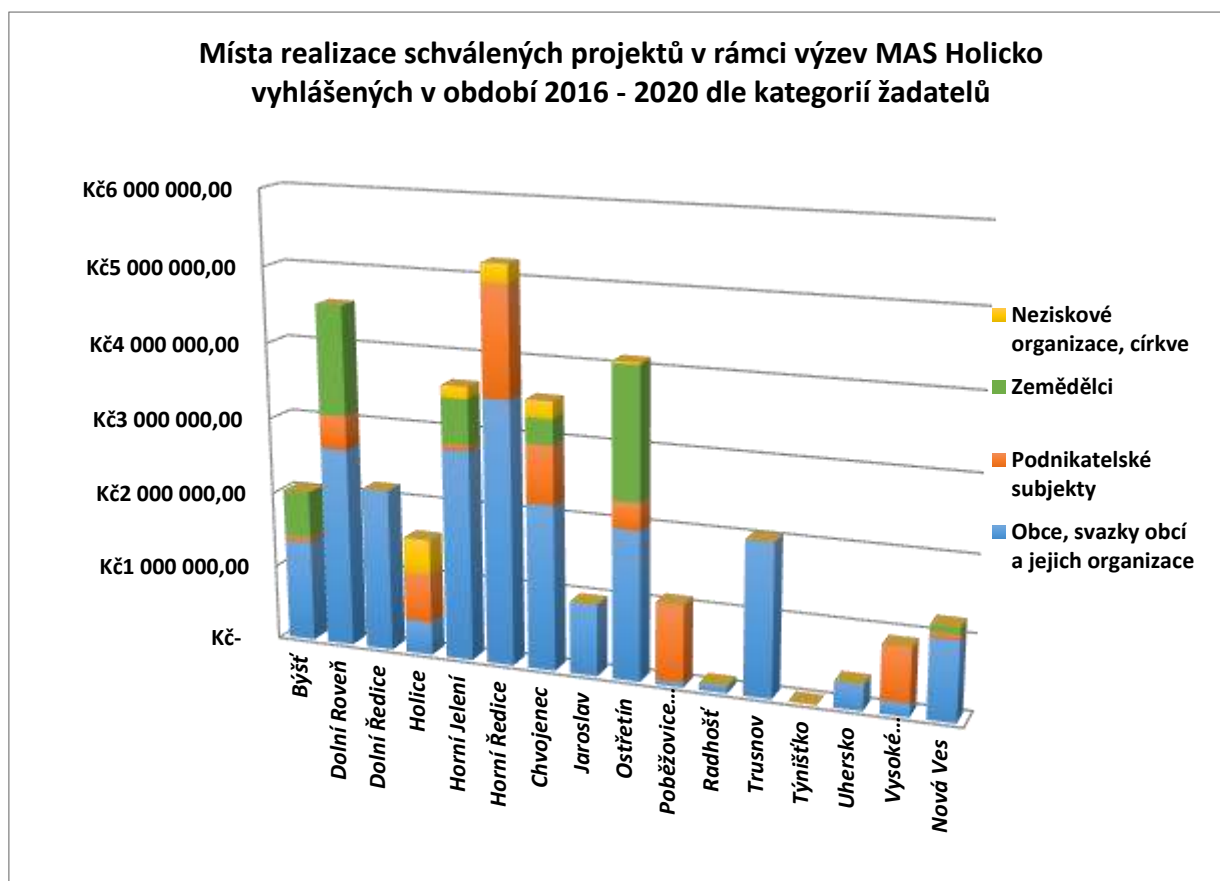

3. Věcný pokrok v plnění cílů strategie CLLD

Ve sledovaném období bylo 40 projektů v realizaci, z toho 30 projektů z výzev programových rámců PRV a IROP. 15 projektů z výzev programových rámců podalo závěrečnou žádost o proplacení. 2 projekty z výzvy Malého LEADERu podalo závěrečné vyúčtování.

K 31.12.2020 bylo celkem v udržitelnosti 32 projektů z programových rámců, z toho 17 projektů přešlo do udržitelnosti v roce 2020.

3.1. Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce PRV

Dosavadní plnění SCLLD ve vztahu k jednotlivým Fichím Programového rámce PRV probíhalo následovně:

Fiche 1 - Podpora zemědělských podniků: 5 projektů je v udržitelnosti (3.884.583,-Kč). Poslední 1 projekt (525.000,-Kč) z důvodu komplikací s opatřeními proti COVID nepodal závěrečnou ŽoP. S tím ale souvisí i komplikace pro MAS - neplnění indikátorového plánu: tento žadatel se zavázal k vytvoření 0,5 pracovního místa, což je povinný indikátor pro MAS č. 94800. V tuto chvíli zde zbývá volná finanční alokace ve výši 772.875,-Kč (včetně částky z nepodané ŽoP, která se v průběhu roku 2021 vrátí do „finančního balíčku“ MAS).

Fiche 2 - Podpora potravinářských podniků: 4 projekty jsou v udržitelnosti (693.497,-Kč), z toho 2 projekty přešly do tohoto stavu ve sledovaném období (podaly ŽoP a byly proplaceny). Poslední 1 projekt (95.000,-Kč) z důvodu komplikací s opatřeními proti COVID nepodal závěrečnou ŽoP. S tím ale

souvisí i komplikace pro MAS – neplnění indikátorového plánu: tento žadatel se zavázal k vytvoření 1,0 pracovního místa, což je povinný indikátor pro MAS č. 94800. V tuto chvíli zde zbývá volná finanční alokace ve výši 113.900,-Kč (včetně částky z nepodané ŽoP, která se v průběhu roku 2021 vrátí do „finančního balíčku“ MAS).

Fiche 3 – Podpora malých podniků: 6 projektů je v udržitelnosti (1.463.718,-Kč), z toho 3 projekty přešly do tohoto stavu ve sledovaném období (podaly ŽoP a byly proplaceny). 2 projekty (1.795.050,-Kč) jsou stále v realizaci. Dalších 6 projektů (1.474.216,-Kč) vybraných v rámci vyhlášené výzvy č. 6-PRV jsou v procesu závěrečného ověření na SZIF, z toho u 1 projektu (445.500,-Kč) byla v rámci této kontroly ukončena administrace. Naopak 3 projekty již podepsaly Dohodu o poskytnutí dotace (445.066,-Kč) a další 2 projekty jsou těsně před podpisem Dohody. V tuto chvíli zde zbývá volná finanční alokace ve výši 461.076,-Kč.

Fiche 4 – Ochrana lesních porostů: 2 projekty jsou v udržitelnosti (382.746,-Kč). V tuto chvíli zde zbývá volná finanční alokace ve výši 48.226,-Kč.

Tabulka 16 – Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce PRV k 31.12.2020

Věcný pokrok v plnění cílů programového rámce PRV	1 - Podpora zemědělských podniků	2 - Podpora potravinářských podniků	3 - Podpora malých podniků	4 - Ochrana lesních porostů	5 - Zpřístupnění lesa návštěvníkům	6 - Spolupráce MAS	7 - Podpora spolkového života	Celkem Programový rámec PRV
Finanční alokace pro celé období uvedená v SCLLD	4.657.458,-Kč	807.397,-Kč	4.748.560,-Kč	430.972,-Kč	980.000,-Kč	0Kč	1.132.373,-Kč	12.756.760,-Kč
Vyhlášená alokace	3.031.207,-Kč	912.850,-Kč	9.571.496,-Kč	1.535.042,-Kč	1.588.790,-Kč	0Kč	1.132.373,-Kč	17.771.758,-Kč
Počet podaných projektů	7	5	18	2	3	0	5	40
Výše požadované dotace (<i>Žádost o dotaci</i>)	5.532.708,-Kč	907.397,-Kč	6.390.468,-Kč	439.351,-Kč	980.000,-Kč	0Kč	972.737,-Kč	15.222.661,-Kč
Počet schválených projektů	6	5	11	2	0	0	4	28
Výše schválené dotace (<i>Dohoda o poskytnutí dotace</i>)	4.657.458,-Kč	807.397,-Kč	3.719.268,-Kč	382.746,-Kč	0Kč	0Kč	811.137,-Kč	10.378.006,-Kč
Počet podpořených projektů	5	4	6	2	0	0	0	17
Výše proplacené dotace	3.884.583,-Kč	693.497,-Kč	1.463.718,-Kč	382.746,-Kč	0Kč	0Kč	0Kč	6.424.544,-Kč
Výše sankcí a korekcí	247.875,-Kč	0Kč	0Kč	0Kč	0Kč	0Kč	0Kč	247.875,-Kč
Volná alokace využitelná pro další výzvy	247.875,-Kč (772.875,-Kč)*	18.900,-Kč (113.900,-Kč)*	461.076,-Kč	48.226,-Kč	380.000,-Kč	0Kč	159.636,-Kč	1.315.713,-Kč (1.935.713,-Kč)*

*Při započtení částek z nepodaných závěrečných ŽoP, které měli žadatelé podat v roce 2020, ale z důvodu komplikací s opatřeními proti Covid projekty nezrealizovali a ŽoP nepodali. Tyto částky by se v průběhu roku 2021 měly vrátit (po ukončení administrace ze strany SZIF) zpět do „finančního balíčku“ MAS Holicko.

Fiche 5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům: Na tuto Fichi byly vyhlášeny 3 výzvy (2018, 2019 a 2020). V roce 2018 se do výzvy nepřihlásil žádný projekt. V roce 2019 byla do výzvy podána 1 žádost, která ale byla vyřazena při formálním hodnocení. V rámci poslední vyhlášené výzvy č. 6-PRV se do této Fiche přihlásily 2 projekty (980.000,-Kč). Ty byly následně MAS vybrány a předány na SZIF k závěrečnému ověření. Bohužel 1 projektu (380.000,-Kč) byla v rámci tohoto ověření ukončena administrace. Druhý projekt je těsně před podpisem Dohody. V tuto chvíli zde zbývá volná finanční alokace ve výši 380.000,-Kč.

Fiche 6 – Spolupráce místních akčních skupin: V průběhu mid-term evaluace, která proběhla v roce 2019, byla tato Fiche zrušena.

Fiche 7 - Podpora spolkového života: Tato Fiche byla vytvořena na základě mid-term evaluace v roce 2019, tzn. že na tuto Fichi mohla být vyhlášena první výzva až v roce 2020. Ve sledovaném období bylo vybráno 5 projektů (972.737,-Kč) a následně byly předány na závěrečné ověření SZIF. Z toho 4 projekty již podepsaly Dohodu o poskytnutí dotace (811.137,-Kč) a zbylý 1 projekt je těsně před jejím podepsáním. V tuto chvíli zde zbývá volná finanční alokace ve výši 159.636,-Kč.

V tuto chvíli v rámci Programového rámce PRV zbývá volná finanční alokace v celkové výši 1.315.713,-Kč (v případě započtení částek z nepodaných ŽoP u Fichí 1 a 2 je to už 1.935.713,-Kč) + očekáváme finance z přechodného období. Valná hromada MAS Holicko v průběhu příštího sledovaného období rozhodne o tom, na které Fiche budou tyto volné finanční prostředky převedeny a následně bude počátkem roku 2022 vyhlášena výzva. Rozhodovat se bude jak podle zájmu území, tak i podle toho, aby byl naplněn indikátorový plán Strategie CLLD.

3.1.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce PRV

Ve sledovaném období 4 projekty z Programového rámce PRV podaly závěrečnou žádost o proplacení. Konkrétně se jednalo o 1 projekt z výzvy č. 3-PRV a 3 projekty z výzvy č. 5-PRV. Všechny tyto projekty byly proplaceny ještě v tomtéž roce.

Dále v roce 2020 byly proplaceny i 3 projekty, které podaly ŽoP na konci roku předcházejícího. Všechny tyto projekty byly z výzvy č. 5-PRV.

Tabulka 17 – Podpořené projekty v rámci Programového rámce PRV v roce 2020

Fiche	Registrační číslo	Žadatel	Název projektu	Místo realizace	Poskytnutá dotace	Proplacení projektu
Výzva č. 3 - PRV						
3	18/003/19210/453/088/001462	Mgr. Leona Málková	Jezdecká škola	Horní Jelení	67.824,-Kč	21.4.2020
Výzva č. 5 - PRV						
2	19/005/19210/453/088/001126	Věra Skutilová	Nákup přívěsu	Chvojenec	89.140,-Kč	31.3.2020
3	19/005/19210/453/088/001128	Tomáš Pražák	nákup technologie a strojů	Holice	43.691,-Kč	6.4.2020
3	19/005/19210/453/088/001125	Josef Branda	Pepe Zmrzlina	Holice	220.050,-Kč	21.4.2020
3	19/005/19210/453/088/001122	Vít Binko	Obnova strojního vybavení truhlářské dílny	Dolní Roveň	450.000,-Kč	25.5.2020
3	19/005/19210/453/088/001123	Jana Vondroušová	Výměna podlahy v tanečním sálu a v lokále Hostince u Červinků - Horní Ředice č. 47	Horní Ředice	294.253,-Kč	22.6.2020
2	19/005/19210/453/088/001127	Vladimíra Krejčíková	Uvádění ZEGITY na trh	Ostřetín	227.160,-Kč	12.10.2020

Všechny projekty byly bez uložené sankce/korekce.

Všechny projekty dodržely indikátory a preferenční kritéria, ke kterým se zavázaly.

Níže uvedené tabulky shrnují parametry, které MAS Holicko sleduje u podpořených projektů, pro každou Fichi zvlášť. Jsou zde uvedeny souhrnně všechny projekty, které byly realizovány od začátku realizace Strategie CLLD, tj. od 18.8.2016. Samostatně je zde uveden právě sledovaný rok 2020.

Můžeme konstatovat, že v rámci Fiche 1 bylo podpořeno 5 projektů, z toho 4x se podpora týkala živočišné výroby a 1x rostlinné výroby. 3 projekty byly zaměřeny na nákup mobilních strojů pro zemědělskou výrobu. 3 projekty byly inovativního charakteru a 3 projekty byly šetrné k životnímu prostředí. Díky realizaci projektu bylo vytvořeno 1,0 pracovní místo.

V případě podrobnějšího pohledu na žadatele je dobré zmínit, že byly podpořeny 2 začínající podnikatelé a 1x byla žadatelem žena. 1 žadatel byl podpořen dokonce dvakrát (Zemědělská společnost Ostřetín, a.s.).

Tabulka 18 – Parametry podpořených projektů Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2020

Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků	Měrná jednotka	Hodnota	
		Rok 2020	Celkem 2016 - 2020
Počet podpořených projektů celkem	Počet	0	5
Počet podpořených žadatelů celkem	Počet	0	4
Počet projektů týkající se živočišné výroby	Počet	0	4
Počet projektů týkající se rostlinné výroby nebo školkařské produkce	Počet	0	1
Počet projektů týkající se pořízení peletovacího zařízení	Počet	0	0
Počet projektů týkající se pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu	Počet	0	3
Počet inovativních projektů	Počet	0	3
Počet projektů šetrných k životnímu prostředí	Počet	0	3
Počet projektů využívajících stávající zařízení a objekty	Počet	0	5
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	Pracovní místa	0	1
Modernizace nevyužitých prostor	m ²	0	0
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	0	<ul style="list-style-type: none"> • 1x: do 500 obyvatel, • 4x: 501 – 5.000 obyvatel.
Typ žadatele	-	0	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Zemědělec – PO (střední podnik) – podal 2 žádosti, • 3x Zemědělec – FO (mikropodnik).
Počet začínajících podnikatelů	Žadatel	0	2
Počet žen (v případě FO)	Žadatel	0	1
Počet držitelů regionální značky „KRAJ PERŠTEJNŮ regionální produkt“	Žadatel	0	0
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	0	56,82%

V rámci Fiche 2 byly podpořeny 4 projekty zaměřené na výrobu potravin. 3 projekty se týkaly investice do zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů. 1 projekt byl inovativního charakteru a 1 projekt byl šetrný k životnímu prostředí. V rámci této Fiche nebylo vytvořeno žádné pracovní místo.

V případě podrobnějšího pohledu na žadatele je dobré zmínit, že byli podpořeni 2 začínající podnikatelé. V obou případech se jednalo o ženy, které byly podpořeny dvakrát (Věra Skutilová a Vladimíra Krejčíková). V jednom případě díky realizaci projektu vzniklo nové živnostenské oprávnění.

Tabulka 19 – Parametry podpořených projektů Fiche 2 – Podpora potravinářských podniků v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2020

Fiche 2 – Podpora potravinářských podniků	Měrná jednotka	Hodnota	
		Rok 2020	Celkem 2016 - 2020
Počet podpořených projektů celkem	Počet	2	4
Počet podpořených žadatelů celkem	Počet	2	2
Počet projektů týkající se výroby potravin	Počet	2	4
Počet projektů týkající se výroby krmiv	Počet	0	0
Počet projektů, jejichž součástí je investice do zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů	Počet	2	3
Počet inovativních projektů	Počet	0	1
Počet projektů šetrných k životnímu prostředí	Počet	0	1
Počet projektů využívajících stávající zařízení a objekty	Počet	2	4
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	Pracovní místa	0	0
Modernizace nevyužitých prostor	m ²	0	0
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	• 2x: 501 – 5.000 obyvatel.	• 4x: 501 – 5.000 obyvatel.
Typ žadatele	-	• 2x Podnikatel – FO (mikropodnik).	• 2x Zemědělec – FO (mikropodnik) – podal 2 žádosti, • 2x Podnikatel – FO (mikropodnik) – podal 2 žádosti.
Počet začínajících podnikatelů	Žadatel	2	2
Počet žen (v případě FO)	Žadatel	2	2
Počet držitelů regionální značky „KRAJ PERŠTEJNŮ regionální produkt“	Žadatel	0	0
Počet nově vzniklých živnostenských oprávnění	Živnostenské oprávnění	0	1
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	56,84%	59,55%

V rámci Fiche 3 bylo podpořeno 5 projektů, které byly zaměřeny na tyto ekonomické činnosti: 1x truhlářství, 3x ubytování, stravování a pohostinství, 1x sportovní nebo rekreační činnosti a 1x čalounictví. 2 projekty byly inovativního charakteru a 1 projekt byl šetrný k životnímu prostředí. Bohužel žádný projekt nebyl zaměřen na zlepšení poskytovaných služeb v obci. Na druhou stranu bylo vytvořeno 1,0 pracovní místo.

V případě podrobnějšího pohledu na žadatele je dobré zmínit, že byli podpořeni 2 začínající podnikatelé a 2x byla žadatelem žena. V jednom případě díky realizaci projektu vzniklo nové živnostenské oprávnění.

Tabulka 20 – Parametry podpořených projektů Fiche3 – Podpora malých podniků v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2020

Fiche 3 – Podpora malých podniků	Měrná jednotka	Hodnota	
		Rok 2020	Celkem 2016 - 2020
Počet podpořených projektů celkem	Počet	5	6
Počet podpořených žadatelů celkem	Počet	5	6
Ekonomická činnost žadatele	-	<ul style="list-style-type: none"> • 1x C - Zpracovatelský průmysl, • 2x I – Ubytování, stravování a pohostinství, • 1x R - Sportovní, zábavní a rekreační činnosti, • 1 x S 95 - Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost. 	<ul style="list-style-type: none"> • 1x C - Zpracovatelský průmysl, • 3x I – Ubytování, stravování a pohostinství, • 1x R - Sportovní, zábavní a rekreační činnosti, • 1 x S 95 - Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost.
Počet inovativních projektů	Počet	2	2
Počet projektů šetrných k životnímu prostředí	Počet	1	1
Počet projektů zlepšujících základní vybavení nebo služby v obci	Počet	0	0
Počet projektů využívajících stávající zařízení a objekty	Počet	5	6
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	Pracovní místa	0	1
Modernizace nevyužitých prostor	m ²	0	0
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	<ul style="list-style-type: none"> • 3x: 501 – 5.000 obyvatel, • 2x: nad 5.000 obyvatel. 	<ul style="list-style-type: none"> • 4x: 501 – 5.000 obyvatel, • 2x: nad 5.000 obyvatel.
Typ žadatele	-	<ul style="list-style-type: none"> • 4x Podnikatel – FO (mikropodnik), • 1x Zemědělec – FO (mikropodnik). 	<ul style="list-style-type: none"> • 5x Podnikatel – FO (mikropodnik), • 1x Zemědělec – FO (mikropodnik).
Počet začínajících podnikatelů	Žadatel	2	2
Počet žen (v případě FO)	Žadatel	2	2
Počet držitelů regionální značky „KRAJ PERŠTEJNŮ regionální produkt“	Žadatel	0	0
Počet nově vzniklých živnostenských oprávnění	Živnostenské oprávnění	1	1
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	65,33%	64,59%

V rámci Fiche 4 byly podpořeny 2 projekty. Jedná se již o finální verzi tabulky, protože již žádné projekty nejsou v realizaci a MAS neplánuje vyhlásit žádnou další výzvu. Oba dva projekty byly zrealizovány v hospodářských lesích, kde bylo oploceno 8,59 ha melioračních a zpevňujících dřevin. V obou případech šlo o projekt šetrný k životnímu prostředí. Průměrná výše finanční spoluúčasti byla 33,68%.

V případě podrobnějšího pohledu na žadatele je dobré zmínit, že se v obou případech jednalo o toho samého žadatele - Lesní družstvo Vysoké Chvojno, s.r.o. (společnost vlastněná obcemi).

Tabulka 21 – Parametry podpořených projektů Fiche 4 – Ochrana lesních porostů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2020

Fiche 4 - Ochrana lesních porostů	Měrná jednotka	Hodnota	
		Rok 2020	Celkem 2016 - 2020
Počet podpořených projektů celkem	Počet	0	2
Počet podpořených žadatelů celkem	Počet	0	1
Počet inovativních projektů	Počet	0	0
Počet projektů šetrných k životnímu prostředí	Počet	0	2
Počet projektů, jejichž místo realizace jsou lesy hospodářské	Počet	0	2
Počet projektů, jejichž místo realizace jsou lesy zvláštního určení	Počet	0	0
Celková plocha	ha	0	8,59
Typ žadatele	-	0	• Podnikatel – PO (velký podnik)
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	0	33,68%

V případě Fiche 5 ještě nebyl zrealizován žádný projekt.

Tabulka 22 – Parametry podpořených projektů Fiche 5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2020

Fiche 5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům	Měrná jednotka	Hodnota	
		Rok 2020	Celkem 2016 - 2020
Počet podpořených projektů celkem	Počet	0	0
Počet podpořených žadatelů celkem	Počet	0	0
Počet projektů zaměřených na posílení rekreační funkce lesa (např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty, značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků)	Počet-	0	0
Počet projektů zaměřených na usměrňování návštěvnosti území (např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory)	Počet	0	0
Počet projektů zaměřených na údržbu lesního prostředí (např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně)	Počet	0	0
Počet inovativních projektů	Počet	0	0
Počet projektů šetrných k životnímu prostředí	Počet	0	0
Počet projektů zaměřených na regionální tematiku	Počet	0	0
Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela cílová skupina	Počet	0	0
Počet projektů, jejichž místo realizace jsou lesy zvláštního určení	Počet	0	0
Délka nově vybudovaných stezek pro turisty	m	0	0
Délka zrekonstruovaných stezek pro turisty	m	0	0
Počet herních, naučných a fitness prvků	ks	0	0
Počet odpočinkových stanovišť	ks	0	0
Počet přístřešků	ks	0	0

Fiche 5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům	Měrná jednotka	Hodnota	
		Rok 2020	Celkem 2016 - 2020
Počet informačních tabulí	ks	0	0
Typ žadatele	-	0	0
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	0	0

V případě Fiche 7 ještě nebyl zrealizován žádný projekt.

Tabulka 23 – Parametry podpořených projektů Fiche 7 – Podpora spolkového života v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2020

Fiche 7 – Podpora spolkového života	Měrná jednotka	Hodnota	
		Rok 2020	Celkem 2016 - 2020
Počet podpořených projektů celkem	Počet	0	0
Počet podpořených žadatelů celkem	Počet	0	0
Počet projektů, jejichž výstupy budou sloužit pro více aktivit/účelů v obci	Počet	0	0
Počet projektů, jejichž výstupy jsou efektivně využívány: 30 – 49 hodin/rok	Počet	0	0
Počet projektů, jejichž výstupy jsou efektivně využívány: min 50 hodin/rok a více	Počet	0	0
Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela cílová skupina	Počet	0	0
Počet projektů, které podpořily činnost spolkových a neziskových organizací (NNO nebo církev a její organizace jsou buď žadatelem, nebo mají předmět realizace projektu v dlouhodobém pronájmu)	Počet	0	0
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	Pracovní místa	0	0
Velikost obce, kde je projekt realizován	Počet	0	0
Typ žadatele	Počet	0	0
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	0	0

3.1.2. Plnění indikátorového plánu Programového rámce PRV

V roce 2019 proběhla aktualizace indikátorového plánu. Většina indikátorů byla nastavena podle vybraných projektů.

Bohužel v případě Fichí 1 a 2 z důvodů komplikací s opatřeními proti COVID nebyl ve sledovaném období zrealizován v každé Fichi 1 projekt (žadatel nepodal v termínu ŽoP). To má dopad na neplnění indikátorového plánu u obou těchto Fichí, a to jak u indikátoru Počet podpořených příjemců/podniků (- 2), tak bohužel i u indikátoru Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (- 1,5). Indikátor č. 94800 týkající se vytvořených pracovních míst je pro MAS povinný. Jediným možným řešením je v příští výzvě nastavit preferenční kritéria tak, aby vybrané projekty pokud možno umožnily naplnit tyto indikátory na 100%.

U ostatních Fichí, pokud nedojde k podobnému odstoupení projektů od realizace, tak by v průběhu příštích dvou let mělo dojít k plnění na 100%. V případě Fiche 4 splňujeme 100% již v letošním roce.

Tabulka 24 – Plnění indikátorového plánu Programového rámce PRV uvedeného v SCLLD v období 2016 – 2020

Název indikátoru	Plán uvedený v SCLLD	Plnění		
		Rok 2020	Celkem 2016 - 2020	%
Fiche 1 - Podpora zemědělských podniků				
Počet podpořených podniků / příjemců	6	0	5	83,33%
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	1,5	0	1	66,67%
Fiche 2 - Podpora potravinářských podniků				
Počet podpořených podniků/příjemců	5	1	4	80,00%
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	1	0	0	0%
Fiche 3 - Podpora malých podniků				
Počet podpořených podniků / příjemců	11	3	6	54,55%
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	1	0	1	100,00%
Fiche 4 - Ochrana lesních porostů				
Počet podpořených operací (akcí)	2	0	2	100,00%
Celková plocha (ha)	8,59	0	8,59	100,00%
Fiche 5 - Zpřístupnění lesa návštěvníkům				
Počet podpořených operací (akcí)	2	0	0	0%
Celková plocha (ha)	12,69	0	0	0%
Fiche 6 - Spolupráce místních akčních skupin				
Celkové veřejné výdaje (O.1)	0	0	0	-
Fiche 7 - Podpora spolkového života				
Počet podpořených operací (akcí)	5	0	0	0%
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	0	0	0	-

3.1.3. Plnění finančního plánu Programového rámce PRV

V 10/2019 byla schválena změna finančního plánu programového rámce PRV jejímž obsahem byla jeho úprava dle skutečného čerpání v roce 2018 a dle zjištěných potřeb území z provedeného šetření v průběhu mid-term evaluace. Přesto už letos dochází k rozdílu v jeho plnění. I když v průměru jde o pomalejší čerpání o pouhých 3,36%.

Rychleji je čerpaná pouze Fiche 7, u ostatních Fichí naopak dochází ke zpoždění. To je způsobeno jednak úsporou projektů díky provedenému výběrovému řízení. Projevila se zde i uložená sankce z druhé poloviny roku 2019 u projektu Zemědělské společnosti Ostřetín nebo ukončení administrace 2 projektů z výzvy č.6-PRV v rámci závěrečné kontroly SZIF.

Zatím se zde neprojevilo, že 2 projekty z důvodu komplikací s opatřeními proti COVID nepodaly v roce 2020 závěrečnou žádost o proplacení. To bude vidět ve finančním plánu až v roce 2021, až SZIF zadministruje ukončení těchto projektů.

Tabulka 25 – Plnění finančního plánu Programového rámce PRV uvedeného v SCLLD v období 2016 – 2020

FINANČNÍ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD – OBDOBÍ 2016 - 2020						
Opatření/Fiche SCLLD	PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)				Nezpůsobilé výdaje (Kč)	Kumulativní % čerpání alokace
	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
		Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje			
1. Podpora zemědělských podniků	8.908.457,-	2.980.772,-	1.676.686,-	4.250.999,-	1.901.459,-	100%
2. Podpora potravinářských podniků	1.874.441,-	516.734,-	290.663,-	1.067.044,-	222.180,-	100%
3. Podpora malých podniků	11.534.205,12	2.527.078,-	1.421.482,-	7.585.645,12	2.006.323,40	83,15%
4. Ochrana lesních porostů	617.704,-	275.821,-	155.151,-	186.732,-	51.290,-	100%
5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům	380.000,-	243.200,-	136.800,-	0	0	38,78%
6. Spolupráce místních akčních skupin	0	0	0	0	0	-
7. Podpora spolkového života	380.000,-	192.000,-	108.000,-	0	80.000,-	26,49%
Celkem	23.694.807,12	6.735.605,-	3.788.782,-	13.170.420,12	4.181.252,40	82,50%
SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ – OBDOBÍ 2016 - 2020						
Opatření/Fiche SCLLD	PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)				Nezpůsobilé výdaje (Kč)	Kumulativní % čerpání alokace
	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
		Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje			
1. Podpora zemědělských podniků	8.908.457,-	2.822.132,-	1.587.451,-	4.498.874,-	1.901.459,-	94,68%
2. Podpora potravinářských podniků	1.833.743,-	504.637,-	283.860,-	1.045.246,88	219.719,80	97,66%
3. Podpora malých podniků	9.196.673,12	2.370.451,-	1.333.383,-	5.492.839,12	2.328.242,60	78,00%
4. Ochrana lesních porostů	569.478,-	244.956,-	137.790,-	186.732,-	0	88,81%
5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům	0	0	0	0	0	0%
6. Spolupráce místních akčních skupin	0	0	0	0	0	-
7. Podpora spolkového života	1.042.170,-	519.126,-	292.011,-	231.033,-	0	71,63%
Celkem	21.550.522,-	6.461.302,-	3.634.495,-	11.454.725,-	4.449.421,40	79,14%
SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI S PLÁNEM – OBDOBÍ 2016 - 2020						
Opatření/Fiche SCLLD	PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)				Nezpůsobilé výdaje (Kč)	Kumulativní % čerpání alokace
	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
		Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje			
1. Podpora zemědělských podniků	-	- 158.640,-	- 89.235,-	+ 247.875,-	-	- 5,32%
2. Podpora potravinářských podniků	- 40.697,12	- 12.097,-	- 6.803,-	- 21.797,12,-	- 2.460,20	- 2,34%
3. Podpora malých podniků	- 2.337.532,-	- 156.627,-	- 88.099,-	- 2.092.806,-	+ 321.919,20	- 5,15%
4. Ochrana lesních porostů	- 48.226,-	- 30.865,-	- 17.361,-	-	- 51.290,-	- 11,19%
5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům	- 380.000,-	- 243.200,-	- 136.800,-	-	-	- 38,78%
6. Spolupráce místních akčních skupin	-	-	-	-	-	-
7. Podpora spolkového života	+ 662.170,-	+ 327.126,-	+ 184.011,-	+ 151.033,-	-	+ 45,14%
Celkem	- 2.144.285,12	- 274.303,-	- 154.287,-	- 1.715.695,12	+ 268.169,-	- 3,36%

*Veškeré částky jsou v případě Programového rámce PRV počítány ze žádostí o dotaci schválených SZIF do 31.12.2020

Jako nejvhodnější řešení se teď jeví, počkat, až se veškeré tyto finance vrátí zpět do volné alokace MAS + očekáváme finance z přechodného období. Valná hromada MAS Holicko v průběhu příštího sledovaného období rozhodne o tom, na které Fiche budou tyto volné finanční prostředky převedeny a následně bude počátkem roku 2022 vyhlášena výzva. Rozhodovat se bude jak podle zájmu území, tak i podle toho, aby byl naplněn indikátorový plán Strategie CLLD.

3.2. Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce IROP

Dosavadní plnění SCLLD ve vztahu k jednotlivým opatřením Programového rámce IROP probíhalo následovně:

Opatření 1 – Vzdělávání: 6 projektů je v udržitelnosti (6.514.737,12Kč). Všechny projekty přešly do tohoto stavu ve sledovaném období (podaly ŽoP a byly proplaceny). 1 projekt (1.027.099,63Kč) je stále v realizaci. V tuto chvíli v tomto opatření zbývá volná finanční alokace ve výši 94.898,49Kč (uspořené finance z již zrealizovaných projektů). Ta bude v příští žádosti o změnu SCLLD (1/2021) převedena na Opatření 2 - Bezpečnost silničního provozu, tak aby mohla být využita v příští výzvě.

Opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu: 9 projektů je v udržitelnosti (8.682.944,23 Kč), z toho 3 projekty přešly do tohoto stavu ve sledovaném období (podaly ŽoP a byly proplaceny). Další 1 projekt (2.031.837,62Kč) ve sledovaném období podal žádost o proplacení, ale byl proplacen až v 1/2021. Další 2 projekty (1.268.541,44Kč) jsou v realizaci. V 6/2020 byla na toto opatření vyhlášena nová výzva č.7-IROP, v rámci které byl přijat a následně i programovým výborem MAS schválen 1 projekt (1.054.044,59Kč). Ten byl v 12/2020 předán na závěrečné ověření na CRR. V tuto chvíli zde zbývá volná finanční alokace ve výši 1.145.279,88Kč + sem bude přesunuta alokace z Opatření 1. Vzdělávání (94.898,49Kč). Vyhlášení výzvy na tuto zbývající částku je naplánováno na 6/2021.

Tabulka 26 – Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce IROP k 31.12.2020

Věcný pokrok v plnění cílů programového rámce IROP	1 - Vzdělávání	2 – Bezpečnost silničního provozu	Celkem Programový rámec IROP
Finanční alokace pro celé období uvedená v SCLLD	7.636.735,24Kč	14.182.647,76Kč	21.819.383,-Kč
Vyhlášená alokace	9.834.143,59Kč	20.641.814,83Kč	30.475.958,42Kč
Počet podaných projektů	7	14	21
Výše požadované dotace (<i>Žádost o podporu</i>)	7.636.735,24Kč	14.739.628,91Kč	22.376.364,15Kč
Počet schválených projektů	7	12	19
Výše schválené dotace (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)	7.514.737,12Kč	13.275.368,97Kč	20.790.106,09Kč
Počet podpořených projektů	6	9	17
Výše proplacené dotace	6.514.737,12Kč	8.682.944,23Kč	15.197.681,35Kč
Výše sankcí a korekcí	58.613,26Kč	0Kč	58.613,26Kč
Volná alokace využitelná pro další výzvy	94.898,49Kč	1.145.279,88Kč	1.240.178,37Kč

3.2.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce IROP

Ve sledovaném období 10 projektů z Programového rámce IROP podalo závěrečnou žádost o proplacení. Z toho 9 projektů bylo ještě v letošním roce proplaceno (podpořeno) a 1 projekt byl proplacen až v 1/2021.

Dále v roce 2020 byl proplacen i 1 projekt z výzvy č. 4-IROP, který podal ŽoP na konci roku předcházejícího.

Tabulka 27 – Podpořené projekty v rámci Programového rámce IROP v roce 2020

Opatření	Registrační číslo	Žadatel	Název projektu	Místo realizace	Poskytnutá dotace	Proplacení projektu
1. výzva MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2017)						
1	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005563	Obec Dolní Ředice	Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání v ZŠ Dolní Ředice	Dolní Ředice	984.271,55Kč	27.10.2020
3. výzva MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2018)						
1	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009399	Základní škola Eduarda Nápravníka Býšť, okres Pardubice	Rekonstrukce odborné učebny školních dílen ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice	Býšť	1.310.255,45Kč	3.4.2020
1	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009424	Obec Ostřetín	Přístavba základní školy	Ostřetín	1.103.570,33Kč	13.5.2020
1	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009422	Obec Dolní Roveň	Stavební úpravy dílen ZŠ Masarykova Dolní Roveň	Dolní Roveň	473.392,83Kč	8.12.2020
4. výzva MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2018)						
2	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009421	Obec Trusnov	Zvýšení bezpečnosti v obci Trusnov	Trusnov	1.039.283,35Kč	6.2.2020
2	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009419	Obec Dolní Roveň	Chodník Dolní Roveň	Dolní Roveň	1.110.754,25Kč	30.6.2020
2	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009380	Město Horní Jelení	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Dolním Jelení výstavbou a rekonstrukcí chodníků	Horní Jelení	1.256.920,30Kč	8.10.2020
5. výzva MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2019)						
1	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012301	Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace	Vybavení učebny informatiky a učebny cizího jazyka Základní školy Horní Jelení	Horní Jelení	1.503.650,50Kč	24.11.2020
1	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012311	Obec Horní Ředice	Stavební úpravy a pořízení vybavení učebny informatiky a venkovní učebny při ZŠ Horní Ředice	Horní Ředice	1.139.596,46Kč	7.12.2020
6. výzva MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2019)						
2	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012291	Obec Horní Ředice	Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Horní Ředice rekonstrukcí chodníků podél silnice III/3051	Horní Ředice	1.071.939,15Kč	10.12.2020

Všechny projekty až na jeden byly bez uložení sankce/korekce. Korekce dotace byla uložena pouze projektu Obce Dolní Ředice s názvem „Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání v ZŠ Dolní Ředice“ ve výši 58.613,26Kč za porušení Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tato částka se poté vrátila zpět do volné finanční alokace Opatření 1 – Vzdělávání.

Všechny projekty dodržely indikátory a preferenční kritéria, ke kterým se zavázaly.

Níže uvedené tabulky shrnují parametry, které MAS Holicko sleduje u podpořených projektů, pro každé opatření zvlášť. Jsou zde uvedeny souhrnně všechny projekty, které byly realizovány od začátku realizace Strategie CLLD, tj. od 18.8.2016. Samostatně je zde uveden právě sledovaný rok 2020.

V rámci opatření 1 bylo podpořeno 6 projektů týkajících se základních škol, z toho většina (5) byla zaměřena na výuku více předmětů: 3 projekty byly zaměřeny na učebny cizích jazyků, 5x se řešila učebna technických nebo řemeslných oborů, 3x učebna přírodních věd a 3 projekty byly zaměřeny na práci s digitálními technologiemi. Navíc výstupy všech projektů budou využívány i k mimoškolním

zájmovým aktivitám dětí a mládeže. 1 projekt navíc řešil bezbariérovost celé školy a 2 projekty byly zaměřeny i na úpravu venkovního prostranství. Na přípravě všech projektů se podílela cílová skupina.

V případě podrobnějšího pohledu na žadatele je dobré zmínit, že přímo si žádaly 2 základní školy. V ostatních případech byl žadatelem zřizovatel školy, tj. obec.

Tabulka 28 – Parametry podpořených projektů Opatření 1 – Vzdělávání rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2020

Opatření 1 - Vzdělávání	Měrná jednotka	Hodnota	
		Rok 2020	Celkem 2016 - 2020
Počet podpořených projektů celkem	Počet	6	6
Počet podpořených žadatelů celkem	Počet	6	6
Počet podpořených základních škol	Zařízení	6	6
Počet podpořených zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání	Zařízení	0	0
Počet podpořených zařízení pro celoživotní vzdělávání	Zařízení	0	0
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení	Osoby	470	470
Počet projektů týkající se komunikace v cizích jazycích	Počet	3	3
Počet projektů týkající se technických a řemeslných oborů	Projekt	5	5
Počet projektů týkající se přírodních věd	Projekt	3	3
Počet projektů týkající se schopnosti práce s digitálními technologiemi	Projekt	3	3
Počet projektů základních škol, jejichž výstupy budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže	Projekt	6	6
Počet projektů základních škol, jejichž výstupy budou sloužit pro výuku více předmětů (kroužků)	Projekt	5	5
Počet projektů týkající se bezbariérovosti	Projekt	1	1
Počet projektů týkající se vnitřní konektivity škol a školských zařízení a připojení k internetu	Projekt	0	0
Počet projektů, jejichž součástí byly úpravy venkovního prostranství	Projekt	2	2
Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela cílová skupina	Projekt	6	6
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	• 6x: 501 – 5.000 obyvatel.	• 6x: 501 – 5.000 obyvatel.
Typ žadatele	-	• 2x školy, • 4x obce.	• 2x školy, • 4x obce.
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	5,85%	5,85%

V rámci opatření 2 bylo podpořeno 9 projektů týkající se chodníků. Konkrétně bylo vybudováno 755,19 m nových chodníků a zrekonstruováno 2.071,16 m chodníků ve špatném stavu. 5 projektů řešilo místa pro přecházení a 3 projekty realizovaly prvky zvyšující bezpečnost silniční a pěší dopravy. 7 projektů zlepšilo přístup k občanské vybavenosti v obcích - zpravidla se jednalo o budování nebo rekonstrukce chodníků u škol nebo autobusových zastávek. Součástí 6 chodníků byla výsadba zeleně. Příprava všech projektů byla veřejně projednána s cílovou skupinou a její připomínky byly zapracovány do konečného řešení.

Tabulka 29 – Parametry podpořených projektů Opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2020

Opatření 2 - Bezpečnost silničního provozu	Měrná jednotka	Hodnota	
		Rok 2020	Celkem 2016 - 2020
Počet podpořených projektů celkem	Počet	4	9
Počet podpořených žadatelů celkem	Počet	4	9
Počet projektů týkající se chodníků nebo stezek pro pěší	Počet	4	9
Počet projektů řešících místa pro přecházení	Počet	3	5
Počet projektů týkající se realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy	Počet	0	3
Počet projektů, jež zajišťují přístup k centru, či občanské vybavenosti	Počet	4	7
Počet projektů šetrných k životnímu prostředí	Počet	2	6
Délka nově vybudovaných chodníků nebo stezek pro pěší	m	299,58	755,19
Délka zrekonstruovaných chodníků nebo stezek pro pěší	m	2.549,39	2.701,16
Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela cílová skupina	Počet	4	9
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	<ul style="list-style-type: none"> • 1x: do 500 obyvatel, • 3x: 501 – 5.000 obyvatel. 	<ul style="list-style-type: none"> • 2x: do 500 obyvatel, • 6x: 501 – 5.000 obyvatel, • 1x: nad 5.000 obyvatel.
Typ žadatele	-	<ul style="list-style-type: none"> • 4x obce. 	<ul style="list-style-type: none"> • 9x obce.
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	5,00%	5,00%

3.2.2. Plnění indikátorového plánu Programového rámce IROP

Protože indikátorový plán programového rámce IROP vznikl na přelomu let 2015/2016, tak dle počtu zaregistrovaných projektů je již teď vidět, že dojde k jeho několikanásobnému překročení.

V případě opatření 1 – Vzdělávání je v současné chvíli zrealizováno 6 projektů (plnění indikátoru na 120%) a další 1 projekt je ještě v realizaci (plánované plnění indikátoru na 140%). Ještě větší rozdíl je v kapacitě podpořených vzdělávacích zařízení. V tuto chvíli plníme původní výši indikátoru na 261%. Největší podíl na tomto indikátoru má ZŠ Býšť, která v rámci realizace projektu řešila mimo jiné i bezbariérovost celé školy. Tím pádem se do tohoto indikátoru započítala kapacita celé školy, místo kapacity pouze řešené učebny. Navíc některé školy řeší v rámci 1 projektu modernizaci 2 učeben, čímž se opět navyšuje řešená kapacita.

V případě opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu je v současné chvíli zrealizováno 9 projektů (plnění indikátoru na 150%) a další 4 projekty jsou ještě v realizaci (plánované plnění indikátoru na 217%).

Na základě konzultace s Řídicím orgánem IROP bude indikátorový plán upraven dle skutečnosti až na konci období, tj. až všechny projekty budou proplaceny.

Tabulka 30 – Plnění indikátorového plánu Programového rámce IROP uvedeného v SCLLD v období 2016 – 2020

Název indikátoru	Plán uvedený v SCLLD	Plnění		
		Rok 2020	Celkem 2016 - 2020	%
Opatření 1 - Vzdělávání				
Počet podpořených vzdělávacích zařízení	5	6	6	120,00%
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	180	470	470	261,11%
Opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu				
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	6	4	9	150,00%

3.2.3. Plnění finančního plánu Programového rámce IROP

Přestože MAS Holicko provedla aktualizaci finančního plánu v 1/2020 (podle skutečného plnění v letech 2018 a 2019), tak skutečné plnění k 31.10.2020 tomuto plánu neodpovídá. Ve sledovaném období totiž došlo k rychlejšímu čerpání, než jak bylo očekáváno, a to u obou dvou opatření.

Tabulka 31 – Plnění finančního plánu Programového rámce IROP uvedeného v SCLLD v období 2016 – 2020

FINANČNÍ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD – OBDOBÍ 2016 - 2020						
Opatření/Fiche SCLLD	PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)				Nezpůsobilé výdaje (Kč)	Kumulativní % čerpání alokace
	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
		Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje			
1. Vzdělávání	5.282.587,37	5.018.458,00	0	264.129,37	0	65,71%
2. Bezpečnost silničního provozu	8.770.150,12	8.331.642,62	0	438.507,50	0	58,75%
Celkem	14.052.737,49	13.350.100,62	0	702.636,87	0	61,18%
SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ – OBDOBÍ 2016 - 2020						
Opatření/Fiche SCLLD	PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)				Nezpůsobilé výdaje (Kč)	Kumulativní % čerpání alokace
	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
		Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje			
1. Vzdělávání	6.857.618,05	6.514.737,12	0	342.880,93	58.613,26	85,31%
2. Bezpečnost silničního provozu	11.302.548,30	10.714.781,85	0	587.766,45	452.772,75	75,55%
Celkem	18.160.166,35	17.229.518,97	0	930.647,38	511.386,01	78,96%
SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI S PLÁNEM – OBDOBÍ 2016 - 2020						
Opatření/Fiche SCLLD	PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)				Nezpůsobilé výdaje (Kč)	Kumulativní % čerpání alokace
	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
		Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje			
1. Vzdělávání	+1.575.030,68	+1.496.279,12	-	+78.751,56	+58.613,26	+19,59%
2. Bezpečnost silničního provozu	+2.532.398,18	+2.383.139,23	-	+149.258,95	+452.772,75	+16,80%
Celkem	+4.107.428,66	+3.879.418,35	-	+228.010,51	+511.386,01	+17,78%

*Veškeré částky jsou v případě Programového rámce IROP počítány ze Žadosti o platbu podaných na CRR do 31.10.2020

To také znamená, že nebyl problém s dosažením milníku IROP pro rok 2020, který byl stanoven řídicím orgánem: předložené žádosti o platbu do 31.10.2020 ve výši 55,44% celkové alokace SCLLD. V případě MAS Holicko jsme dosáhli na 78,96%, což je dokonce vyšší hodnota než je milník pro rok 2021 (70%)

Pro rekapitulaci uvádíme, že v 1/2021 bude opět MAS Holicko podávat žádost o změnu finančního plánu, jehož součástí bude jeho narovnání podle skutečného čerpání v roce 2020 a převod volné alokace z opatření 1 – Vzdělávání (uspořené finance z již zrealizovaných projektů - 94.898,49Kč) do opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu.

3.3. Místa realizace podpořených projektů

Následující tabulka uvádí místa realizace podpořených (již proplacených) projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených od začátku realizace Strategie CLLD, tj. od 18.8.2016.


Počet míst realizace neodpovídá zcela přesně počtu podpořených projektů, neboť některé projekty jsou realizovány na více místech (oplocenky).


Jak je vidět, již teď se daří pokrýt skoro celé území MAS. Zatím jediná obec, která nevyužila dotací MAS Holicko je obec Týništko. Prozatím je nejméně podpořených projektů z území obcí Uhersko, Radhošť, Nová Ves a Vysoké Chvojno. Naopak nejvíce peněz prozatím získalo území obcí Ostřetín, Horní Ředice, Dolní Roveň a Horní Jelení.

Tabulka 32 – Místa realizace podpořených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2020

Místo realizace podpořených projektů	Rok 2020			Celkem 2016 - 2020	%
	Výzvy prog.rámčů PRV a IROP	Výzvy Malý LEADER	Celkem rok 2020		
Býšť	1.310.255,45Kč (1 projekt)	0	1.310.255,45Kč (1 projekt)	1.404.216,86Kč (2,31 projektu)	6,21%
Dolní Roveň	2.034.147,08Kč (3 projekty)	0	2.034.147,08Kč (3 projekty)	3.482.475,08Kč (4 projekty)	15,40%
Dolní Ředice	984.271,55Kč (1 projekt)	24.900,-Kč (1 projekt)	1.009.171,55Kč (2 projekty)	2.122.339,46Kč (6 projektů)	9,38%
Holice	263.741,-Kč (2 projekty)	74.700,-Kč (3 projekty)	338.441,-Kč (1 projekt)	860.576,55Kč (10 projektů)	3,80%
Horní Jelení	2.828.394,80Kč (3 projekty)	0	2.828.394,80Kč (3 projekty)	3.461.035,80Kč (5 projektů)	15,30%
Horní Ředice	2.505.788,61Kč (3 projekty)	24.900,-Kč (1 projekt)	2.530.688,61Kč (4 projekty)	3.782.354,31Kč (8 projektů)	16,72%
Chvojenec	89.140,-Kč (1 projekt)	24.900,-Kč (1 projekt)	114.040,-Kč (2 projekty)	862.750,75Kč (7,06 projektů)	3,81%
Jaroslav	0	0	0	920.378,22Kč (2 projekty)	4,07%
Ostřetín	1.330.730,33Kč (2 projekty)	0	1.330.730,33Kč (2 projekty)	4.073.920,13Kč (9 projektů)	18,01%
Poběžovice u Holic	0	24.900,-Kč (1 projekt)	24.900,-Kč (1 projekt)	154.531,57Kč (1,68 projektu)	0,68%
Radhošť	0	24.900,-Kč (1 projekt)	24.900,-Kč (1 projekt)	59.900,-Kč (2 projekty)	0,26%
Trusnov	1.039.283,35Kč (1 projekt)	0	1.039.283,35Kč (1 projekt)	1.074.283,35Kč (2 projekty)	4,75%
Týništko	0	0	0	0	0%
Uhersko	0	24.900,-Kč (1 projekt)	24.900,-Kč (1 projekt)	24.900,-Kč (1 projekt)	0,11%

Místo realizace podpořených projektů	Rok 2020			Celkem 2016 - 2020	%
	Výzvy prog.rámců PRV a IROP	Výzvy Malý LEADER	Celkem rok 2020		
Vysoké Chvojno	0	24.900,-Kč (1 projekt)	24.900,-Kč (1 projekt)	177.234,16Kč (2,62 projektu)	0,78%
Nová Ves	0	0	0	159.509,11Kč (1,34 projektu)	0,71%
Celkem	12.385.752,17Kč (17 projektů)	249.000,-Kč (10 projektů)	12.634.752,17Kč (27 projektů)	22.620.405,35Kč (64 projektů)	100%

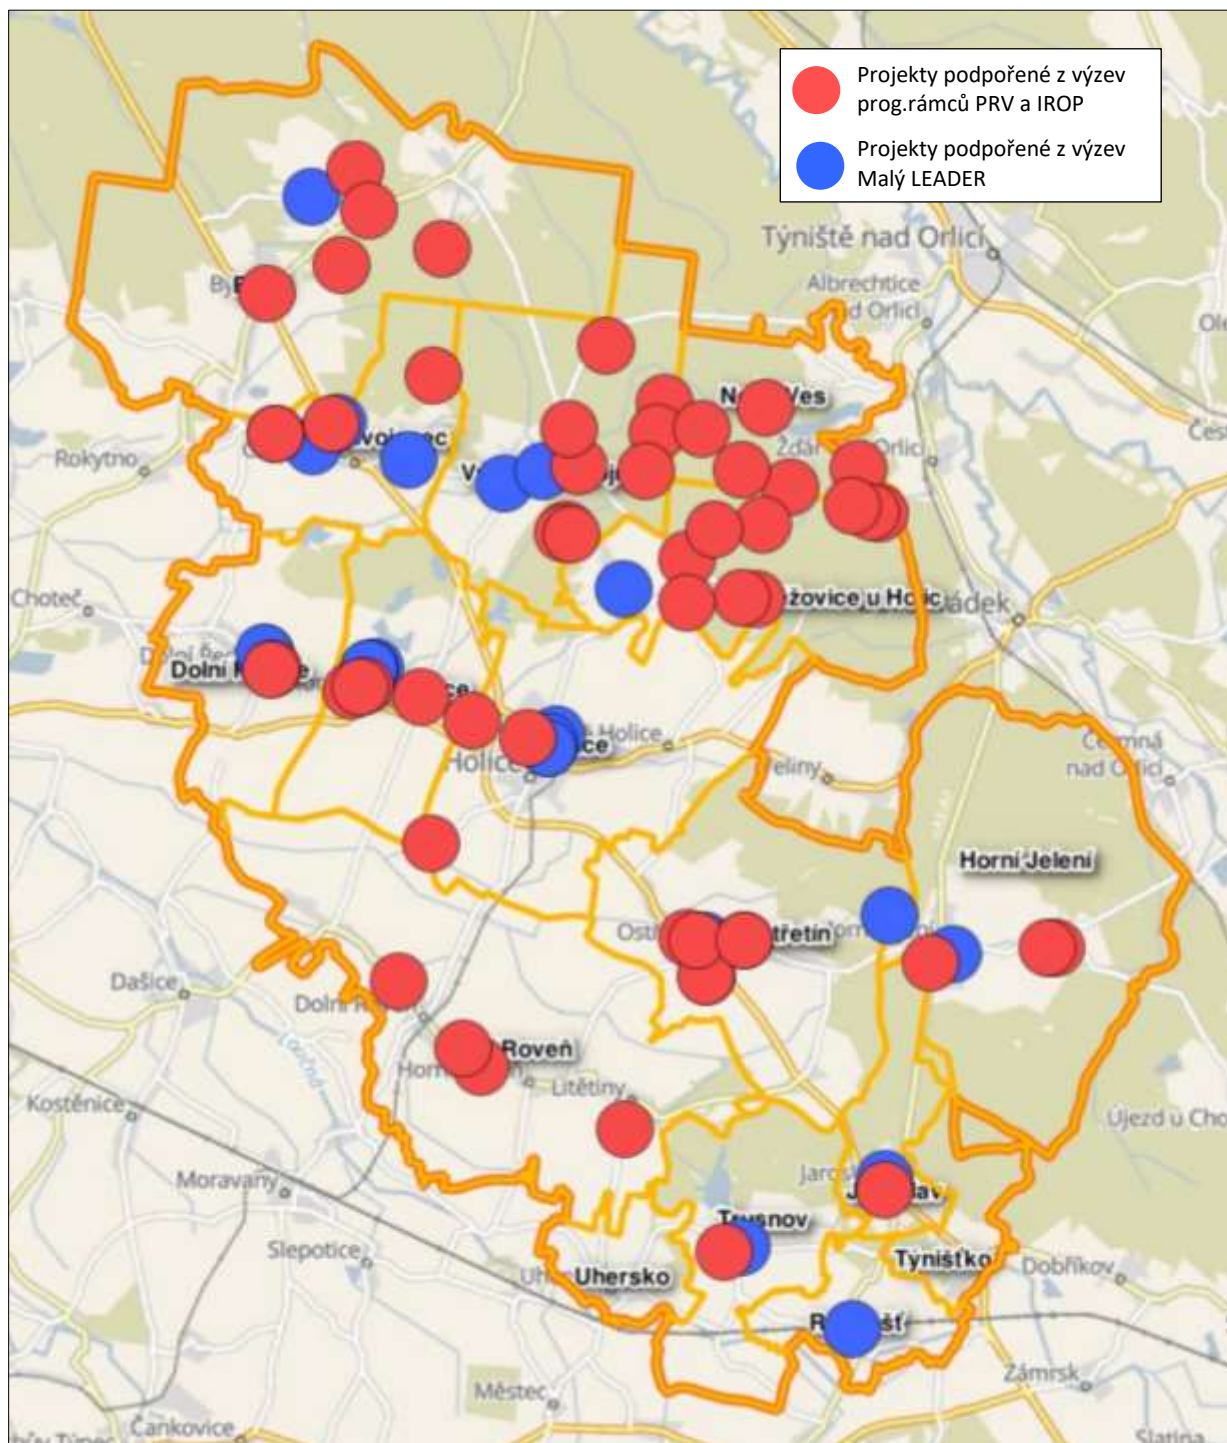

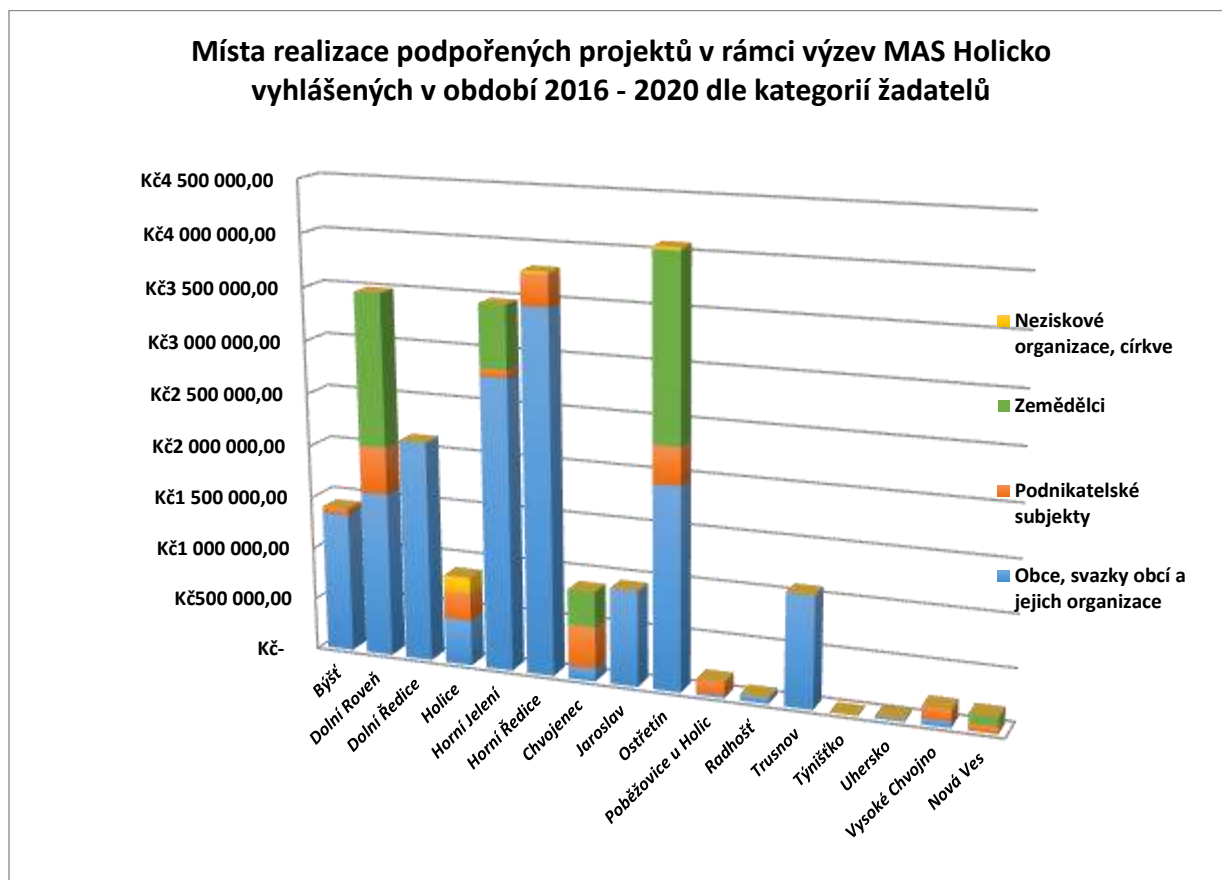

3.4. Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo programové rámce

Ihned po ukončení sledovaného období bylo provedeno šetření na území Holicka o naplňování cílů strategie CLLD MAS Holicko, které si stanovila MAS mimo programové rámce PRV a IROP.

Počátkem 2/2021 byli osloveni všichni starostové obcí z územní působnosti MAS, členové MAS a další aktéři z území, jež má MAS ve svém adresáři se žádostí o vyplnění údajů do vytvořeného dotazníku. Ten byl zaměřen na zjištění počtu projektů, které se na Holicku ve sledovaném období realizovaly. Mohlo se jednat o projekty realizované z evropských fondů, národních dotací, dotací Pardubického kraje nebo i třeba z vlastních zdrojů.

Protože návratnost dotazníků byla malá (odpovědělo pouze 20 respondentů), tak kancelář MAS zjišťovala informace o realizovaných projektech ještě na těchto portálech:

- IS CEDR III (Centrální registr dotací) - <http://cedr.mfcr.cz/Cedr3InternetV419/CommonPages/ConditionPage.aspx?queryType=1>
- DotInfo (Informace o Dotacích a návratných finančních výpomocích EDS) - <https://www.dotinfo.cz/Default.aspx>
- DotaceEU - <https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznamy-prijemcu>

Na základě výsledků těchto šetření můžeme konstatovat, že skutečnost předčila předpoklady z přelomu let 2015/2016, kdy Strategie CLLD vznikala. Protože již teď 3 roky před ukončením programového období (2023) jsou indikátory plněny na cca 102 %. Toto je potřeba vzít v potaz při

tvorbě nové Strategie CLLD 2021-2027 a pro příští programové období lépe (pozitivněji) naplánovat plnění indikátorů.

V rámci klíčové oblasti A. Partnerská spolupráce je největší rozdíl mezi předpokladem a skutečným plněním. Indikátory jsou plněny na 533%. Důvodem je to, že projekty založené na spolupráci několika jiných subjektů, ať již na regionální, národní nebo mezinárodní úrovni realizovaly i jiné subjekty v území než pouze MAS Holicko (Dobrovolný svazek obcí Holicka, Rodinné centrum Holoubek, ZUŠ Karla Malicha, Dětský domov Holice).

Konkrétně ve sledovaném období pokračovala na území Holicka realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II“ (partnerství MŠ, ZŠ, školských zařízení a jejich zřizovatelů z Holicka), a nově se rozjela realizace „Komunitního plánování sociálních služeb“ (partnerství poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Holicka). V rámci mimoregionálních projektů navázala MAS Holicko spolupráci v rámci projektu „Zájmové vzdělávání nás baví!“ s NNO řešícími zájmové vzdělávání dětí, a to jak z území Holicka, tak i z území Poličska a Kunětické hory.

Tabulka 33 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo programové rámce k 31.12.2020 – Klíčová oblast A. Partnerská spolupráce

Název opatření / indikátoru	Plán uvedený v SCLLD	Plnění		
		Rok 2020	Celkem 2016 - 2020	%
Opatření: A.1.1.1 Aktivní tvorba dostatečného prostoru na setkávání, navazování kontaktů a spolupráci nejrůznějších subjektů ať již vně, či uvnitř jednotlivých sektorů a zájmových skupin místního partnerství				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	1	2	5	500,00%
Počet vytvořených partnerství v rámci regionu MAS Holicko	2	1	2	100,00%
Opatření: A.1.2.1 Přenos zkušeností a aktivní spolupráce na regionální, národní i mezinárodní úrovni				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	2	1	11	550,00%
Počet vytvořených partnerství s aktéry mimo území MAS Holicko	3	1	2	66,67%
92501 - Celkové veřejné výdaje (O.1) (EUR)	0	0	0	-
Počet realizovaných projektů v rámci Klíčové oblasti A celkem	3	1	16	533,33%

V rámci klíčové aktivity B. Kvalitní život v obcích jsme na přibližně 98% plnění indikátorů. Nejvíce zrealizovaných projektů je z opatření zaměřených na školství (103), kulturu a sport (54), volnočasové aktivity (47) a veřejná prostranství (41). Naopak nejméně projektů bylo z opatření dopravní dostupnost (2) a rozvoj komunitních služeb (6). Žádný projekt se netýkal zlepšení dohledu nad veřejným pořádkem

Tabulka 34 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo programové rámce k 31.12.2020 – Klíčová oblast B. Kvalitní život v obcích

Název opatření /indikátoru	Plán uvedený v SCLLD	Plnění		
		Rok 2020	Celkem 2016 - 2020	%
Opatření: B.1.1.1 Obnova a kultivace veřejných prostranství a center obcí				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	60	6	41	68,33%
Opatření: B.1.1.2 Rozvoj komunitních služeb a vybavenosti obcí				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	10	1	6	60,00%
Opatření: B.1.1.3 Podpora školství a celoživotního vzdělávání				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	60	25	103	171,67%

Název opatření /indikátoru	Plán uvedený v SCLLD	Plnění		
		Rok 2020	Celkem 2016 - 2020	%
50000 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení	5	6	6	120,00%
50001 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení	180	470	470	261,11%
50030 - Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,00%	-	-	-
Opatření: B.1.1.4 Podpora sociálních služeb a zapojení sociálně a jinak znevýhodněných skupin občanů do života v obcích a v regionu				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	10	2	13	130,00%
Opatření: B.2.1.1 Volnočasové aktivity a spolkový život				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	30	6	47	156,67%
92702 - Počet podpořených operací	3	0	0	0%
94800 - Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	0	0	0	0%
Opatření: B.2.1.2 Kulturní, společenské a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	60	11	54	90,00%
92702 - Počet podpořených operací	2	0	0	0%
94800 - Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	0	0	0	0%
Opatření: B.3.1.1 Rozvoj technické infrastruktury				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	20	2	11	55,00%
Opatření: B.3.1.2 Rozvoj dopravní infrastruktury				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	30	1	14	46,67%
Opatření: B.3.1.3 Dopravní dostupnost a obslužnost regionu				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	5	0	2	40,00%
Opatření: B.4.1.1 Podpora bezpečnosti silničního provozu a rozvoj cyklo dopravy v obcích regionu				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	20	4	20	100,00%
75001 - Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	6	4	10	166,67%
75120 - Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	35%	-	-	-
Opatření: B.4.1.2 Zlepšení dohledu nad veřejným pořádkem				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	5	0	0	0%
Opatření: B.4.1.3 Protipovodňová a požární prevence				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	20	3	13	65,00%
Počet realizovaných projektů v rámci Klíčové oblasti B celkem	330	61	324	98,18%

V rámci klíčové aktivity C. Podpora podnikání a zaměstnanosti jsme na 100% plnění indikátorů. Oznámené zrealizované projekty jsou z opatření zaměřených na zemědělské podnikání (16), drobné nezemědělské podnikání (16), lesní hospodářství (7), na podporu zaměstnanosti (7) i na podporu regionálních produktů a řemesel (1).

Tabulka 35 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo programové rámce k 31.12.2020 – Klíčová oblast C. Podpora podnikání a zaměstnanosti

Název opatření	Plán uvedený v SCLLD	Plnění		
		Rok 2020	Celkem 2016 - 2020	%
Opatření: C.1.1.1 Podpora rozvoje zemědělského podnikání				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	15	2	16	106,67%
93701 - Počet podpořených podniků / příjemců	6	0	5	83,33%
94800 - Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	1,5	0	1	66,67%
Opatření: C.1.1.2 Podpora lesního hospodářství				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	10	0	7	70,00%
92702 - Počet podpořených operací	4	0	2	50,00%
93001 - Celková plocha (ha)	21,28	0	8,59	40,37%
Opatření: C.1.2.1 Podpora drobného podnikání, rozvoje služeb a tradičních řemesel				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	20	7	16	80,00%
93701 - Počet podpořených podniků / příjemců	16	7	10	62,50%
94800 - Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	2	0	1	50,00%
Opatření: C.1.2.2 Podpora regionálních produktů, řemesel a služeb včetně jejich propagace				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	1	1	1	100,00%
Opatření: C.2.1.1 Podpora zaměstnanosti a rozvoj vzdělanosti v souladu s potřebami regionu				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	1	3	7	700,00%
Počet realizovaných projektů v rámci Klíčové oblasti C celkem	47	13	47	100,00%

V rámci klíčové aktivity D. Rozvoj cestovního ruchu jsme na přibližně 46% plnění indikátorů, tj. jedná se o nejméně řešenou oblast na Holicku. A to bohužel i přesto, že původní plán byl pouze v počtu jednotek realizovaných projektů. Jednak se jedná o dlouhodobý trend, který byl zřetelný při každém hodnocení realizace Strategie CLLD. Ale navíc ve sledovaném roce byla tato oblast jako nejvíce ze všech zasažena celostátními opatřeními proti COVIDU.

Oznámené zrealizované projekty jsou z opatření zaměřených na propagaci regionu (6), infrastrukturu cestovního ruchu (3), podporu turisticky významných objektů (3) a rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit (1). Žádný projekt se netýkal cykloturistiky a informačních center.

MAS Holicko se také snaží přispět k plnění této klíčové aktivity prostřednictvím založení a fungování destinační společnosti Pardubicko – perníkové srdce Čech, díky které je oblast Pardubicka propagována nejen po celé ČR, ale i v jiných evropských zemích.

Z tohoto pohledu je jasné, že by MAS i její partneři měli iniciovat území k další podpoře cestovního ruchu v regionu, např. zlepšení služeb informačního centra, pokrok v přípravě budování sítě cyklostezek, hipposteze nebo naučných stezek, příprava budování nových turistických atraktivit (např. vyhlídky, rozhledny, obecní muzea,...), rozvoj ubytovacích a stravovacích zařízení, vydání nových propagačních a informačních materiálů, mapování kulturního a historického dědictví nebo místních tradic.

Tabulka 36 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo programové rámce k 31.12.2020 – Klíčová oblast D. Rozvoj cestovního ruchu

Název opatření	Plán uvedený v SCLLD	Plnění		
		Rok 2020	Celkem 2016 - 2020	%
Opatření: D.1.1.1 Infrastruktura pro cestovní ruch (rozhledny, pěší stezky, naučné stezky, půjčovny sportovních potřeb, servis, apod.)				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	5	1	3	60,00%
Opatření: D.1.1.2 Podpora turisticky a historicky významných objektů				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	15	1	3	20,00%
Opatření: D.1.2.1 Rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit v oblasti venkovské turistiky				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	3	0	1	33,33%
Opatření: D.1.2.2 Podpora cykloturistiky				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	3	0	0	0%
Opatření: D.2.1.1 Podpora informačních a návštěvnických center a jejich spolupráce				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	1	0	0	0%
Opatření: D.2.1.2 Propagace regionu (i mimo jeho území) a v něm působících subjektů				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	1	1	6	600,00%
Počet realizovaných projektů v rámci Klíčové oblasti D celkem	28	3	13	46,43%

V rámci klíčové aktivity E. Životní prostředí jsou indikátory naplňovány lépe, než bylo při tvorbě strategie očekáváno (200%). Důvodem je to, že původně bylo odhadováno plnění v rámci jednotek (18 projektů), tudíž i když se zrealizovalo ve sledovaném období 36 projektů, tak procentní překročení plánovaného plnění je veliké.

Oznámené zrealizované projekty jsou z opatření zaměřených na hospodaření s odpady (12), udržitelné nakládání s přírodními zdroji (11), zachování a obnovu krajinných hodnot (7), zlepšení vodního režimu krajiny (5) a udržitelné obhospodařování krajiny (1). Naopak žádný projekt se netýkal revitalizace černých skládek a vzdělávání v oblasti životního prostředí.

Tabulka 37 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo programové rámce k 31.12.2020 – Klíčová oblast E. Životní prostředí

Název opatření	Plán uvedený v SCLLD	Plnění		
		Rok 2020	Celkem 2016 - 2020	%
Opatření: E.1.1.1 Zachování a obnova krajinných hodnot a přírodního dědictví				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	5	1	7	140,00%
Opatření: E.1.1.2 Udržitelné obhospodařování krajiny				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	2	0	1	50,00%
Opatření: E.1.1.3 Zlepšování vodního režimu v krajině a hospodaření s vodou				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	2	1	5	250,00%
Opatření: E.2.1.1 Zkvalitnění hospodaření s odpady				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	3	2	12	400,00%
Opatření: E.2.1.2 Revitalizace černých skládek a zátěží				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	2	0	0	0%
Opatření: E.3.1.1 Udržitelné nakládání s přírodními zdroji				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	2	5	11	550,00%

Název opatření	Plán uvedený v SCLLD	Plnění		
		Rok 2020	Celkem 2016 - 2020	%
Opatření: E.3.1.2 Vzdělávání, informovanost, výchova a zapojování veřejnosti v oblasti životního prostředí				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	2	0	0	0%
Počet realizovaných projektů v rámci Klíčové oblasti E celkem	18	9	36	200,00%

3.5. Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie

Vzhledem k tomu, že jsme na počátku druhé poloviny realizace Strategie CLLD, tak se synergické efekty začínají projevovat, i když zatím pouze v omezeném rozsahu. To je způsobeno i nízkou finanční alokací, kterou má MAS Holicko k dispozici na celé období 2016 - 2023 (34,5 mil. Kč). Takže ani po zrealizování všech podpořených projektů nebudou efekty tak zřetelné, jako kdybychom měli financí dvojnásobek.

Synergický efekt je asi nejvýraznější v oblasti podpory vzdělávání. Je zde vidět provázanost animačních aktivit MAS Holicko v animaci škol v OP VVV s aktivitami projektu Místního akčního plánu vzdělávání (realizátor MAS Holicko) a samozřejmě i s letos zrealizovanými projekty z opatření 1 - Vzdělávání zaměřenými na podporu jazykového, přírodovědného a polytechnického vzdělávání.

Další oblastí je bezpečnost silničního provozu. Zde se díky realizaci jednotlivých projektů postupně zvyšuje bezpečnost silniční a pěší dopravy v jednotlivých obcích regionu Holicka, který je celý zatížen intenzivní automobilovou dopravou (především podél silnic I/35 a I/36 a návazných komunikací). Navíc řešené chodníky zlepšují přístup k občanské vybavenosti v obcích - mimo jiné se jedná o chodníky u základních škol, které jsou podporovány v rámci opatření 1 nebo o chodníky u mateřských škol, sportovišť, kulturních zařízení, apod., jejichž rekonstrukce byla podporována v předchozím programovém období 2007 - 2013 a v současném období je podporována jejich údržba v rámci výzev Malého LEADERu (přerozdělení financí Programu obnovy venkova Pardubického kraje prostřednictvím MAS).

V případě fichí PRV je podporován rozvoj drobného podnikání na Holicku, ať už se jedná o zemědělce nebo nezemědělské podnikatele. Bohužel, zde se kvůli opravdu nízké finanční alokaci Strategie CLLD a různých typů žadajících podnikatelů (zemědělci, jezdecká stáj, výrobci potravin, catering, pohostinství, truhlářství, stavební firma, zámečnictví,...), synergické efekty až tolik neprojevují. Jedinou spojující aktivitou je propojení místních výrobců podpořených z výzev PRV s aktivitami projektu Kraj Pernštejnů - regionální produkt (MAS Holicko je jedním z realizátorů) a kampaní na podporu lokální ekonomiky Regiony sobě!. Další vazbu lze vysledovat v propojení podnikatelů zaměřených na cestovní ruch a pohostinství s aktivitami Turistické oblasti Pardubicko (MAS Holicko je jedním ze zakládajících členů).

3.6. Horizontální principy

Strategie CLLD MAS Holicko nemá negativní vliv na žádné z horizontálních témat. Jednotlivé specifické cíle a opatření jsou naplňovány dílčími projekty zohledňujícími požadavky na horizontální témata (Udržitelný rozvoj, Rovné příležitosti a zákaz diskriminace a Rovnost mezi muži a ženami). Povinností konečných žadatelů je zajištění alespoň neutrálního vztahu k daným tématům.

Nadto v rámci hodnocení a výběru projektů jsou zvýhodňovány ty projekty, jež mají pozitivní vliv na horizontální témata (především udržitelný rozvoj). Z tohoto důvodu byly podpořeny žádosti zaměřené

na pořízení technologií a strojů šetrných k životnímu prostředí nebo jejichž součástí je i výsadba zeleně. A například projekty z programového rámce IROP (školy, chodníky) musí splňovat podmínky bezbariérovosti, jež je základním požadavkem na přijatelnost projektu.

4. Animace strategie CLLD

Animační aktivity MAS jsou všechny činnosti MAS v rámci SCLLD, které nezahrnují vyhlášení výzev a administraci projektů konečných žadatelů/příjemců. Jedná se především o používané komunikační strategie a z nich vycházející komunikační aktivity, které slouží k informování veřejnosti o SCLLD, dále k přenosu informací ke konkrétním žadatelům či zájemcům o podání žádosti o podporu v rámci SCLLD, podpoře žadatelů při realizaci svých projektů či nastavení celkových procesů toku informací mezi všeobecnou veřejností, zájemci, žadatelem a dalšími aktéry na území.

V roce 2020 byly uspořádány 2 semináře v rámci výzvy MAS Holicko č. 6 - PRV (22.1.2020 a 3.2.2020) a 1 valná hromada MAS Holicko (17.6.2020). Všechny tři akce byly veřejně přístupné a přítomní zde byli informováni o průběhu realizace CLLD.

Tabulka 38 – Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí

	Plán uvedený v SCLLD	Plnění		
		Rok 2020	Celkem 2016 - 2020	%
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	26	3	23	88,46%

Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitolách níže.

4.1. Propagace strategie CLLD

Ve sledovaném období bylo cílem informovat území o tom, že MAS Holicko realizuje SCLLD a také všechny potencionální předkladatele projektů seznámit se zaměřením jednotlivých opatření a s pravidly administrace. Pro toto období byly voleny následující prostředky propagace:

- Využití **roll-upu, propagačních předmětů a letáků**, které si MAS Holicko nechala vyrobit v předcházejících letech. Mimoto ve sledovaném období byly pořízeny nové propagační předměty (deštníky, bublifuky), které jsou distribuovány do území.
- **Informační tabule pro projekty podpořené MAS** jsou rozdávány všem příjemcům dotace po úspěšné realizaci jejich projektu. Příjemce dotace má povinnost tuto tabulku umístit na viditelném místě v místě realizace projektu. Tímto krokem se zvyšuje informovanost území o činnosti MAS Holicko a samotné realizaci SCLLD.
- **Webové stránky (www.holicko.cz) a facebook (<https://www.facebook.com/mas.holicko>)** MAS Holicko – informace o připravovaných a právě vyhlášených výzvách a realizovaných akcích v rámci SCLLD.
- **Vizitky** manažerek pro SCLLD – rozdávány jak na osobních konzultacích, tak i na kulturních, propagačních a vzdělávacích akcích, kterých se pracovníci MAS účastní.

- **Zpravodaj MAS Holicko** (duben a září 2020) – informace o připravovaných a právě vyhlášených výzvách a realizovaných akcích v rámci SCLLD. Distribuce probíhá prostřednictvím partnerů MAS a obecních úřadů na území MAS a dále na webu MAS.
- **Výroční zpráva MAS Holicko** za rok 2020 – zveřejnění výsledků, kterých bylo za příslušný rok dosaženo.
- **Tiskové zprávy** – krátké přehledné informace v místních zpravodajích nebo na letáčcích, jež jsou pojmenovány jako **Maskoviny** (avíza výzev, nová Fiche, vybrané projekty, apod.).
- **Rozesílání důležitých informací do e-mailových schránek** partnerům MAS, klíčovým aktérům z území MAS a všem subjektům, které má MAS v adresáři – informace o vyhlášení výzvy a jejich důležitých milnících (např. přijaté žádosti o podporu, schválené žádosti o podporu, apod.).
- **Účast na regionálních akcích** – Sportovní den v Dolních Ředvicích (29.8.2020), 100 let skautingu v Holicích (5.9.2020) a Holice ve víru zábavy (12.9.2020) – prezentace realizace SCLLD na Holicku.
- **Pořádání valných hromad MAS Holicko, které byly veřejně přístupné** (17.6.2020) – Zde byli přítomni informováni o průběhu realizace CLLD.

4.2. Podpora žadatelů

Telefonické, e-mailové a osobní konzultace s pracovníky MAS. – Konečným žadatelům, resp. příjemcům je poskytnuta podpora ze strany pracovníků MAS. Žadatelům jsou zprostředkovávány přes pracovníky MAS informace z řídicích orgánů a naopak. Na druhou stranu pracovníci MAS u příjemců zjišťují informace o průběhu realizace projektu a reagují na možné problémy.

Příručky pro žadatele – Manažerky MAS zpracovaly pro každou vyhlášenou Fichi / opatření samostatnou Příručku pro žadatele. V nich žadatel najde informace jak vyplnit žádost o podporu, seznam povinných a nepovinných příloh, seznam způsobilých a nezpůsobilých výdajů, kritéria hodnocení přijatelnosti, bodovací tabulky a další důležité informace související se zpracováním projektů. Příručky jsou zveřejněny vždy u konkrétní výzvy nebo jsou rozdávány vytištěné na seminářích pořádaných MAS.

Pořádání seminářů pro žadatele v rámci každé výzvy – V rámci výzvy č. 6 – PRV se konaly semináře 22.1.2020 v Býšti a 3.2.2020 v Holicích. V rámci výzvy č.7 – IROP nebyl uskutečněn žádný seminář. Na základě zkušeností z předchozích výzev pro opatření Bezpečnost silničního provozu, se místo semináře, kterého se stejně účastnil většinou pouze jeden starosta, realizovaly individuální konzultace s případnými zájemci o tuto výzvu.

4.3. Animace školských zařízení v OPVVV

V průběhu sledovaného období také samozřejmě probíhala animace školských zařízení v OP VVV, v rámci které manažerky MAS poskytují MŠ, ZŠ a střediskům volného času z regionu Holicka **konzultace (telefonické, e-mailové a osobní)**, zprostředkovávají kontakt s MŠMT, pomáhají se založením žádosti o dotaci, oznámením změny, žádostí o proplacení, jejím vyplněním a odesláním.

Naši pomoc využívají všechny školy na Holicku, některé více a některé méně. Školy, kterým pomáháme intenzivněji s podáváním žádostí a následnou realizací aktivit, již získaly z OP VVV cca 6 mil. Kč pro další vzdělávání pedagogů, na mzdu chůvy nebo školního asistenta, projektové dny, apod.

V roce 2020 jsme pomohli:

- 2 MŠ a 2 ZŠ podat žádost o podporu,
- 1 MŠ, 2 ZŠ a 1 ZUŠ požádat o změnu projektu,
- 1 MŠ, 2 ZŠ a 1 ZUŠ podat průběžnou zprávu o realizaci.

Samozřejmě manažerky MAS se také účastní různých školení k tomuto tématu.

4.4. Vzdělávání zaměstnanců a partnerů MAS

Ve sledovaném období se manažerky MAS **zúčastnily 29 školení (workshopy, semináře, konference, webináře,...) věnovaných realizaci CLLD:**

- Seminář „ Rozšíření podpora PRV o článek 20“ pořádaný MZe 21.1.2020 v Praze,
- Setkání příjemců IPo MAP pořádané NIDV 28.1.2020 v Pardubicích,
- Kurz „Úvod do problematiky komunitního plánování v kontextu sociálních a návazných služeb“ pořádaný Profesním institutem Jahodovka 18.2.2020 v Praze,
- Konference „Města a obce v budoucnosti“ pořádané Energeticko-technickým inovačním klastrem Pardubice, z.s. 19.2.2020 v Dřítči,
- Setkání Kraje Pernštejnů pořádaného MAS Region Kunětické hory a MAS Holicko 25.2.2020 v Holicích
- Roadshow IROP pořádaná MMR 5.3.2020 v Pardubicích,
- Veletrh „Dobrých praxí Chytrého venkova a udržitelného zemědělství“ pořádaný MZe, SZIF, Celostátní síť pro venkov, CIRI 5.3.2020 v Hradci Králové
- Webinář „Zoom bezpečně (nejen) pro začátečníky“ pořádaný Sdružením VIA, z.ú. 16.4.2020 on-line,
- Webinář „Živá výuka“ pořádaný MAP Poličsko 23.4.2020 on-line,
- Webinář „Lepení děr v podpoře lokální ekonomiky“ pořádaný NS MAS ČR 22.4.2020 on-line,
- Setkání příjemců IPo MAP pořádané NIDV ČR 13.5.2020 on-line,
- Seminář pro žadatele k výzvam 109 a 120 pořádaný MPSV 19.5.2020 on-line,
- Seminář pro příjemce k výzvě č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání pořádaný MŠMT 19.6.2020 v Praze
- Setkání aktérů cestovního ruchu pořádaném Pardubickem – Perníkové srdce Čech, z.s. 25.6.2020 v Pardubicích,
- Workshop „Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje II“ pořádaný NS MAS ČR 24.7.2020 v Proseči,
- Školení „Řešení problémových oblastí komunitně vedeného rozvoje místního rozvoje II“ pořádaný NS MAS ČR 13. 8. 2020 v Praze,
- Webinář pro realizátory MAP k tématu metodologie průzkumů a dotazníkových šetření pořádaný NPI ČR 11.9.2020 on-line,
- Setkání příjemců IPo MAP pořádané NPI ČR 16.9.2020 on-line,
- Tematický den PS Vzdělávání 23.9.2020 on-line,
- Tematický den „Současné i budoucí možnosti podpory podnikání na venkově“ pořádaný NS MAS ČR 15.10.2020 on-line,

- Setkání příjemců IPo MAP pořádané NPI ČR 21.10.2020 on-line,
- Informační seminář pro MAS se změnou územní působností mezi prog. Obdobím 2014-2020 a 2021-2027 pořádaný NS MAS ČR 6.11.2020 on-line,
- Informační seminář pro MAS k přípravě Strategii CLLD a Akčních plánů na nové prog. Období pořádaný NS MAS ČR 10.11.2020 on-line,
- Webinář „LEADER – změny v Pravidlech“ pořádaný SZIF 11.11.2020 on-line,
- Kurz „Finanční řízení“ pořádaný NS MAS ČR 26. – 27.11.2020 on-line,
- Workshop „PR a komunikace MAP navenek“ pořádaný NPI ČR 30.11.2020 on-line,
- Konference „Evropské fondy po roce 2020: Budoucnost politiky soudržnosti v ČR“ pořádaný MMR 8.12.2020 on-line,
- Setkání příjemců IPo MAP pořádané NPI ČR 11.12.2020 on-line,
- Kurz „Právní minimum“ pořádaný NS MAS ČR 14. – 15.12.2020 on-line.

Dále ve sledovaném období probíhala **výměna zkušeností a poznatků**, a to především v rámci Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje. Obsahem společných setkání byly nejen informace z výboru a pracovních skupin NS MAS ČR, ale i informace k přípravě a zkušenostem z vyhlášení výzev MAS nebo výměna informací se zástupci z CSV, SZIF, CRR, MMR a Pardubického kraje.

- 20.2.2020 Luže – zkušenosti z realizace výzev a příprava Strategie CLLD 2021-2027
- 18.5.2020 on-line – zkušenosti z realizace výzev a Střední článek vedení a podpory regionálního školství,
- 8.6.2020 on-line - Střední článek vedení a podpory regionálního školství,
- 11.6.2020 Lázně Bohdaneč – zkušenosti z realizace výzev, standardizace MAS a příprava Strategie CLLD 2021-2027,
- 25.9.2020 on-line - zkušenosti z realizace výzev a příprava Strategie CLLD 2021-2027, aktualizace minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD,
- 20.11.2020 on-line - zkušenosti z realizace výzev a příprava Strategie CLLD 2021-2027.

5. Informace o plnění doporučení Evaluační zprávy z 5/2019

V průběhu první poloviny roku 2019 probíhala mid-term evaluace Strategie CLLD, jejímž cílem bylo zhodnotit:

- relevanci nastavení jednotlivých programových rámců,
- nastavení činností a procesů implementace Strategie CLLD,
- pokrok v plnění cílů programových rámců,
- příspěvek Strategie CLLD ke vzniku přidané hodnoty v území MAS.

Jak vyplývá z tabulek uvedených níže, většina doporučení již byla splněna. Pouze zbývá dořešit napojení MAS na Hospodářskou komoru a přes ně na podnikatele. I na tomto doporučení se intenzivně pracuje, tak aby došlo k jeho naplnění co nejdříve.

Tabulka 39 – Plnění doporučení Evaluační zprávy z 5/2019

Doporučení Evaluační zprávy		Stav plnění
1	Interní procesy a postupy na úrovni nositele SCLLD	
1.1	Vedoucí manažer SCLLD se obrátí na kancelář NS MAS, aby vznesla požadavek na ŘO PRV a IROP k odstranění skutečností, které negativně ovlivňují činnosti na MAS.	Splněno
1.2	Vedoucí manažer SCLLD zajistí v jednacím řádu ošetření situace, kdy by hlasování výběrové komise skončilo rovným počtem hlasů.	Splněno
1.3	Vedoucí manažer SCLLD zajistí vyšší a lepší propagaci informací do území:	
1.3.a	- posílí vazbu na mikroregion (účast pracovníka MAS na jednání svazku obcí),	Plněno průběžně
1.3.b	- více využít propagační akce „dny Holicka“,	Plněno průběžně
1.3.c	- napojit se na Hospodářskou komoru a přes ně na podnikatele,	Pokračuje
1.3.d	- zhodnotí návštěvnost webových stránek MAS a jejich přehlednost a v případě potřeby tento komunikační kanál posílí,	Splněno
1.3.e	- zajistí lepší propagaci seminářů pro žadatele a posílí komunikační kanály do území (např. účast vedoucího pracovníka SCLLD na jednání svazku obcí, přenos informací přes starosty).	Plněno průběžně
2	Nastavení východisek pro realizaci SCLLD a řešení aktuálních problémů	
2.1	Návrhy na drobnou úpravu SWOT analýzy a Analýzy rizik vzešlé z jednání Focus group budou zapracovány při tvorbě strategie do nového programového období.	Splněno
2.2	MAS zavede do svých aktivit některá opatření (navrhovaná Focus group) na eliminaci hrozeb:	
2.2.a	- Zajišťovat monitoring dotačních titulů a zajistit informace o zdrojích do území k potenciálním žadatelům,	Plněno průběžně
2.2.b	- Využívat komunitární programy (pro hrozbu: Nedostatečné množství finančních zdrojů pro realizaci),	Plněno průběžně
2.2.c	- Články v obecních zpravodajích, osobní schůzky se starosty, leták do každé schránky (pro hrozbu: Nedostatek žadatelů při výzvách MAS),	Plněno průběžně
2.3	Jednou z možných cest, jak účinněji problémy a potřeby řešit je i rozšíření Programových rámců IROP a PRV a zavedení nových Opatření/Fichí a současně navýšení alokace na Programové rámce.	Splněno
3	Klíčové závěry k jednotlivým Programovým rámcům v rámci relevance SCLLD	
3.1	Úprava SCLLD – rozšířit programový rámec o článek 20, Fiche Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, oblast f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.	Splněno
3.2	Úprava SCLLD – úprava finančního a indikátorového plánu	Splněno
3.3	Aktivity MAS – animace území, která zajistí připravenost žadatelů do dalších výzev v rámci Programových rámců PRV a IROP.	Plněno průběžně
3.4	Aktivity MAS – realizovat dotační poradenství a pomáhat subjektům hledat zdroje na pokrytí aktuálních potřeb v území.	Plněno průběžně
4	Výstupy a výsledky implementace SCLLD	
4.1	Úprava SCLLD – úprava finančního a indikátorového plánu.	Splněno
4.2	Aktivity MAS – neustálá propagace realizace SCLLD MAS Holicko v území. Možné nové nástroje: účast manažera MAS na jednání Svazku obcí, využít dny Holicka.	Plněno průběžně
4.3	Posílení podpory neziskového sektoru v rámci realizace SCLLD. Mezi novými nástroji může být: Cílenější komunikační strategie, využití šablon pro NNO jako nástroj podpory NNO, zavedení článku 20 v rámci PR PRV.	Plněno průběžně
4.4	Zkvalitnění komunikační strategie směrem ke srozumitelnějšímu podávání informací (možné nástroje: vzdělání pracovníka MAS, využití externích služeb, využití sociálních sítí).	Plněno průběžně
4.5	Posílit synergické účinky projektů. Možné nástroje: Zavedení nového kritéria: popis synergických vazeb, vyhledávání dalších nástrojů.	Plněno průběžně
4.6	V rámci vyhlášení výzev PRV zachovat jako preferenční kritérium „Uplatňování inovačních a více odvětvových přístupů“, kde je jako inovace považována i odborná vzdělávací akce pro místní občany.	Splněno
4.7	Animace území vedoucí k zajištění dostatečného počtu kvalitních projektů v rámci PR PRV.	Plněno průběžně

6. Informace o problémech a rizicích v průběhu realizace strategie CLLD

6.1. Informace o problémech, které se vyskytly v průběhu realizace SCLLD a přijatá opatření

1) **Problémy při realizaci projektů konečných žadatelů spojených s COVID - prodlužování realizace, nedokončení projektu apod.**

Realizace některých projektů se zpožďuje díky současné situaci kolem pandemie koronaviru COVID-19. Vzhledem k současné situaci čelí někteří dodavatelé staveb úbytku pracovní síly - zahraniční zaměstnanci odjeli domů již před začátkem pandemie a není jasné, kdy budou moci přijet pracovat do ČR. Stavby se také zpožďují vlivem chybějícího materiálu, dodávky zase z důvodu pozastavení výroby v zahraničních podnicích a nemožností dodat zboží do ČR.

V případě PRV - podpory podnikatelských subjektů jsme se již setkali s tím, že žadatel z důvodu omezení podnikání vlivem COVID neměl finance k tomu, aby si pořídil plánované vybavení do své provozovny a banka mu odmítla poskytnout úvěr. Proto žadatel projekt nedokončil a nepodal závěrečnou ŽoP. Navíc tímto žadatel nevytvořil pracovní místa, ke kterým se zavázal (indikátor č. 94800).

To vše může mít vliv na neplnění finančního a indikátorového plánu Strategie CLLD MAS Holicko.

Opatření: Neustálá podpora žadatelů ze strany MAS Holicko formou telefonických, e-mailových a osobních konzultací tak, aby se koneční žadatelé co nejvíce vyvarovali případným problémům a dopustili se co nejméně chyb v průběhu realizace svých projektů. Tím se alespoň trochu dopomůže k tomu, že žadatel dokončí projekt administrativně včas a bez chyb.

V případě, že i přesto nedojde k realizaci některých projektů, čímž bude ohroženo plnění finančního nebo indikátorového plánu Strategie CLLD MAS Holicko. Pak MAS Holicko musí rychle reagovat tím, že vypíše na volné finance novou výzvu.

6.2. Informace o potenciálních rizicích realizace SCLLD a opatření k jejich eliminaci

1) **Neplnění finančního a indikátorového plánu**

Realizace některých projektů se zpožďuje díky současné situaci kolem pandemie koronaviru COVID-19. Stavby se zpožďují jak vlivem chybějících pracovníků, tak i vlivem chybějícího materiálu. Dodávky se zpožďují z důvodu pozastavení výroby v zahraničních podnicích a nemožností dodat zboží do ČR.

V případě PRV - podpory podnikatelských subjektů může dojít ke zhoršení finančního zdraví žadatelů a nemožnosti poříditi si plánovanou technologii. Nebo zejména u podnikatelů s ekonomickou činností týkající se venkovské turistiky, může dojít až k ukončení podnikání žadatele vlivem celostátních opatření souvisejících s COVID. To povede k tomu, že zázavazkovaný projekt se nezrealizuje vůbec.

Tato situace může mít vliv i na plnění indikátoru 94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader), a to jak tím, že žadatel nevytvoří pracovní místo v době realizace projektu, ale i tím, že ho neudrží po dobu 3 let udržitelnosti projektu.

To vše může mít vliv na nedodržení finančního a indikátorového plánu Strategie CLLD MAS Holicko.

Opatření: Neustálá podpora žadatelů ze strany MAS Holicko formou telefonických, e-mailových a

osobních konzultací tak, aby se koneční žadatelé co nejvíce vyvarovali případným problémům a dopustili se co nejméně chyb v průběhu realizace svých projektů. Tím se alespoň trochu dopomůže k tomu, že žadatel dokončí projekt administrativně včas a bez chyb.

V případě, že i přesto nedojde k realizaci některých projektů, čímž bude ohroženo plnění finančního nebo indikátorového plánu Strategie CLLD MAS Holicko. Pak MAS Holicko musí rychle reagovat tím, že vypíše na volné finance novou výzvu.

7. Závěr

Hlavním cílem této zprávy bylo zhodnotit současnou situaci naplňování strategie CLLD v průběhu roku 2020. Jednalo se o kompletní zhodnocení všech činností, které provádí MAS a podstatou samotného hodnocení byly vyhlášené výzvy a v závislosti na tom i přijaté a zrealizované projekty. Účelem této zprávy bylo zjistit, jak bylo dosaženo stanovených cílů a zda byly realizovány stanovené výstupy.

V případě věcného pokroku stanovených cílů Strategie CLLD musíme konstatovat, že **skutečné plnění předčila předpoklady z přelomu let 2015/2016, kdy Strategie CLLD vznikala**. Protože již teď 3 roky před ukončením programového období (2023) jsou indikátory plněny na cca 102 %. Na jednu stranu je potěšující, že se na Holicku realizuje více projektů, než jsme si původně mysleli. Ale na druhou stranu je potřeba tuto skutečnost vzít v potaz při tvorbě nové Strategie CLLD 2021-2027 a naplánovat lépe plnění indikátorů tak, aby to více odpovídalo skutečnosti.

Protipól ale tvoří **klíčová aktivita D. Rozvoj cestovního ruchu**, kde jsme na přibližně 46% plnění indikátorů, tj. jedná se o nejméně řešenou oblast na Holicku. A to bohužel i přesto, že původní plán byl pouze v počtu jednotek realizovaných projektů. Jednak se jedná o dlouhodobý trend, který byl zřetelný při každém hodnocení realizace Strategie CLLD. Ale navíc ve sledovaném roce byla tato oblast jako nejvíce ze všech zasažena celostátními opatřeními proti COVIDU. MAS Holicko se také snaží přispět k plnění této klíčové aktivity prostřednictvím založení a fungování destinační společnosti Pardubicko – perníkové srdce Čech, díky které je oblast Pardubicka propagována nejen po celé ČR, ale i v jiných evropských zemích. Z tohoto pohledu se zdá, že je potřeba **více iniciovat území k podpoře cestovního ruchu v regionu**.

V případě programového rámce PRV již teď víme, že **bude problém s plněním indikátorového plánu zejména v případě tvorby pracovních míst**, a že **v rámci každé Fiche zbývá drobná volná finanční alokace**. Na druhou stranu nám bylo oznámeno, že v průběhu roku 2021 by měla MAS Holicko obdržet další **nové finance z přechodného období**. Až bude jasné, o jakou výši konkrétně půjde, pak Valná hromada MAS rozhodne o tom, na které Fiche budou veškeré zbývající, ale i nové volné finanční prostředky převedeny. Rozhodovat se bude jak podle zájmu území, tak i podle toho, aby byl naplněn indikátorový plán Strategie CLLD. Z tohoto důvodu můžeme konstatovat, že případná jiná aktualizace programového rámce PRV v mezičase se jeví jako zbytečná a je lépe **vyčkat, až bude jasné, kolik bude moci MAS Holicko rozdat v rámci přechodného období**.

V případě programového rámce IROP je situace trochu odlišná, protože se zde musí aktualizovat finanční plán každý rok vždy do konce ledna dle skutečného plnění. A tak ačkoliv MAS Holicko provedla **aktualizaci finančního plánu v 1/2020**, tak ta již opět na konci roku neodpovídala skutečnému plnění k 31.10.2020. Z tohoto důvodu kancelář MAS provedla **v 1/2021 třetí aktualizaci finančního plánu** programového rámce IROP, která upraví finanční plán podle skutečného čerpání v roce 2020 a převede volnou alokaci z opatření 1 – Vzdělávání (94.898,49Kč) do opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu.

Tyto aktualizace programového rámce IROP se v tuto chvíli jeví jako dostačující pro vyčerpání zbývajících volných finančních alokací a naplnění indikátorů a není zapotřebí dalších opatření.

I z pohledu dalšího obsahu (mimo programové rámce) se Strategie CLLD v tuto chvíli jeví jako dostatečná, a proto **Kontrolní výbor MAS Holicko nenavrhuje žádná další doporučení pro aktualizaci Strategie CLLD MAS Holicko.**

Z pohledu doporučení Evaluační zprávy (mid-term evaluace) z 5/2019 byla většina doporučených aktivit splněna. Už zbývá dořešit pouze napojení MAS na Hospodářskou komoru a přes ně na podnikatele.

Dále je potřeba zmínit, že v průběhu tvorby této hodnotící zprávy byly identifikovány problémy s realizací projektů konečných žadatelů z důvodu celostátních opatření proti COVID-19, jako je např. prodloužení realizace, nedokončení projektu apod. Ty ve svém důsledku mohou mít vliv na neplnění finančního nebo indikátorového plánu MAS Holicko, a to hlavně na neplnění povinného indikátoru č. 94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader).

Kontrolní výbor MAS Holicko navrhuje tato opatření, která povedou ke zlepšení naplňování cílů strategie CLLD MAS Holicko:

- **Dořešení doporučení Evaluační zprávy (mid-term evaluace) z 5/2019:** napojení MAS na Hospodářskou komoru a přes ně na podnikatele.
- **Neustálá podpora žadatelů ze strany MAS Holicko formou telefonických, e-mailových a osobních konzultací** tak, aby se koneční žadatelé co nejvíce vyvarovali případným problémům a dopustili se co nejméně chyb v průběhu realizace svých projektů. Tím se alespoň trochu dopomůže k tomu, že žadatel dokončí projekt včas a bez chyb.
- **Rychlé vypsání výzev na případné volné finanční alokace**, tak aby byly využity pokud možno veškeré finance, které byly poskytnuty EU do území MAS Holicko.
- **V případě programového rámce PRV v průběhu roku 2021 provést aktualizaci finančního a indikátorového plánu.** – Nejprve zjistit na řídicím orgánu, kterým indikátorům půjdou změnit plánované hodnoty. Zjistit jakou částku dostane MAS Holicko pro přechodné období. Následně provést prioritizaci jednotlivých Fichí. Na základě všech těchto informací upravit v průběhu roku 2021 finanční a indikátorový plán programového rámce PRV.
- **Iniciace území k větší podpoře cestovního ruchu v regionu**, např. zlepšení služeb informačního centra, pokrok v přípravě budování sítě cyklostezek, hipposteze nebo naučných stezek, příprava budování nových turistických atrakcí (např. vyhlídky, rozhledny, obecní muzea,...), rozvoj ubytovacích a stravovacích zařízení, vydání nových propagačních a informačních materiálů, mapování kulturního a historického dědictví nebo místních tradic.

V Holicích dne 20.4.2021

.....
Lenka Bezdíčková, Obec Jaroslav
Předsedkyně Kontrolního výboru MAS Holicko
