



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ STRATEGIE CLLD MAS HOLICKO 2021-2027(2030)

v období 1.1.2024 - 31. 12. 2024

Zpracovatel: Kontrolní výbor MAS Holicko

Konzultant: Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD

Obsah

1. ÚVOD.....	2
1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE.....	2
1.2. INFORMACE O PODANÝCH/ SCHVÁLENÝCH ZMĚNÁCH STRATEGIE CLLD.....	2
1.3. OPATŘENÍ PŘI NEPLNĚNÍ ULOŽENÝCH POVINNOSTÍ.....	2
2. REALIZACE STRATEGIE CLLD	3
2.1. PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV	4
2.1.1. 1. výzva MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2023)	4
2.1.2. 2. výzva MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2024)	6
2.1.3. 3. výzva MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2024)	7
2.1.4. 1. výzva MAS Holicko – SP SZP (2024).....	9
2.2. PRŮBĚH ADMINISTRACE VÝZEV	12
2.3. KATEGORIE SCHVÁLENÝCH ŽADATELŮ	13
2.4. MÍSTA REALIZACE SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ.....	14
3. VĚCNÝ POKROK V PLNĚNÍ CÍLŮ STRATEGIE CLLD.....	15
3.1. VĚCNÝ POKROK V PLNĚNÍ CÍLŮ PROGRAMOVÉHO RÁMCE IROP.....	15
3.1.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce IROP	16
3.1.2. Plnění indikátorového plánu Programového rámce IROP.....	16
3.1.3. Plnění finančního plánu Programového rámce IROP	17
3.2. VĚCNÝ POKROK V PLNĚNÍ CÍLŮ PROGRAMOVÉHO RÁMCE OPTAK.....	17
3.2.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce OPTAK	18
3.2.2. Plnění indikátorového plánu Programového rámce OPTAK.....	19
3.2.3. Plnění finančního plánu Programového rámce OPTAK.....	20
3.3. VĚCNÝ POKROK V PLNĚNÍ CÍLŮ PROGRAMOVÉHO RÁMCE SP SZP	21
3.3.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce SP SZP.....	22
3.3.2. Plnění indikátorového plánu Programového rámce SP SZP	22
3.3.3. Plnění finančního plánu Programového rámce SP SZP.....	22
3.4. MÍSTA REALIZACE PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ.....	23
3.5. INFORMACE O POKROKU V REALIZACI KLÍČOVÝCH PROJEKTŮ.....	24
3.6. VĚCNÝ POKROK V PLNĚNÍ CÍLŮ SCLLD MIMO PROGRAMOVÉ RÁMCE.....	26
3.7. INFORMACE O DOSAŽENÝCH SYNERGICKÝCH EFEKTECH NA ÚROVNI OPATŘENÍ RESP. PODOPATŘENÍ STRATEGIE	31
3.8. HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY	32
4. ANIMACE STRATEGIE CLLD 21+	33
4.1. PROPAGACE STRATEGIE CLLD 21+	33
4.2. PODPORA ŽADATELŮ	34
4.3. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A PARTNERŮ MAS	34
5. INFORMACE O PROBLÉMECH A RIZICÍCH V PRŮBĚHU REALIZACE STRATEGIE CLLD 21+	36
5.1. INFORMACE O PROBLÉMECH, KTERÉ SE VYSKYTLY V PRŮBĚHU REALIZACE SCLLD 21+ A PŘIJATÁ OPATŘENÍ	36
5.2. INFORMACE O POTENCIÁLNÍCH RIZICÍCH REALIZACE SCLLD 21+ A OPATŘENÍ K JEJICH ELIMINACI	37
6. ZÁVĚR	38

1. Úvod

Předmětem této práce je vyhodnocení naplňování cílů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2021-2027 (SCLLD 21+) s mottem: „Holicko – region plný života“.

Výchozím časovým obdobím pro tuto zprávu je období od 1.1.2024 do 31.12.2024, během kterého byla nejprve dokončena realizace 1. výzvy OPTAK (vyhlášena ke konci roku 2023) a dále byly vyhlášeny a úspěšně zrealizovány další 3 výzvy (2x OPTAK a 1x SP SZP). Současně také v tomto roce běžela i realizace klíčového projektu MAS Holicko z Programového rámce OPZ+.

1.1. Základní údaje

Název MAS:	MAS Holicko, o.p.s
Integrovaná strategie:	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2021-2027(2030)
Registrační číslo strategie:	CLLD_040_E
Datum schválení Strategie:	5.8.2021
Pořadí hodnotící zprávy:	2
Sledované období:	1.1.2024 – 31.12.2024

1.2. Informace o podaných/ schválených změnách strategie CLLD

Ve sledovaném období byly podány 2 žádosti o změnu ISg. Obě změny se týkaly Programového rámce OPTAK.

1. **Změna Programového rámce OPTAK** byla podána 1.7.2024 a ještě téhož dne byla řídicím orgánem schválena. Jednalo se o **navýšení alokace o částku, která vznikla dodatečným rozpočítáním volných financí nezúčastněných MAS v OPTAK**, tzn. z původních 1.310.000,- Kč jsme požádali o navýšení na nových 1.400.000,-Kč (navýšení o 90.000,-Kč).
2. **Změna Programového rámce OPTAK** byla podána 13.12.2024 a byla řídicím orgánem schválena 20.1.2025. Zde jsme žádali o **prodloužení termínu pro splnění finančního milníku z 31.12.2024 do 31.3.2025**. Zároveň jsme žádali, aby byl milník 70 % vztažen na krok doporučení projektů k financování Výběrovou komisí (stav PP25 v ISKP 21+) místo vydání právních aktů (stav PP30 v ISKP 21+).

1.3. Opatření při neplnění uložených povinností

Nerelevantní – žádná opatření ŘO nebyla vůči MAS Holicko uplatněna.


2. Realizace strategie CLLD

MAS Holicko vyhláší výzvy pro programové období 2021+ od 4/2023. Od 12/2023 máme schválené všechny 4 Programové rámce (OPZ+, IROP, OP TAK a SP SZP). Od té doby se nám **podařilo zazávazkovat 61% alokace**, kterou má MAS Holicko pro toto programové období k dispozici.

Tabulka 1 – Výše zazávazkované finanční alokace v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2021 – 2030

Programový rámec	IROP	OPZ+	OPTAK	SP SZP	Celkem
Finanční alokace pro celé období uvedené v SCLLD21+	22.573.424,00 Kč	11.749.753,48 Kč	1.400.000,00 Kč	13.457.200,00 Kč	49.180.377,48 Kč
Výše schválené dotace na MAS	22.573.424,00 Kč	6.996.903,48 Kč	1.400.000,00 Kč	4.457.533,00 Kč	35.427.860,48 Kč
%	100,00 %	59,55 %	100,00 %	33,12 %	72,04 %
Výše schválené dotace (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)	22.573.424,00 Kč	6.996.903,48 Kč	634.086,82 Kč	0 Kč	30.204.414,30 Kč
%	100,00 %	59,55 %	45,29 %	0 %	61,42 %
Výše proplacené dotace	0 Kč	2.677.025,67 Kč	326.461,82 Kč	0 Kč	3.003.487,49 Kč
%	0 %	22,78 %	23,32 %	0 %	6,11 %

Tím se MAS Holicko **dostala do první desítky MAS v rámci celé ČR**, které mají zazávazkováno v právních aktech více jak 50% alokace.

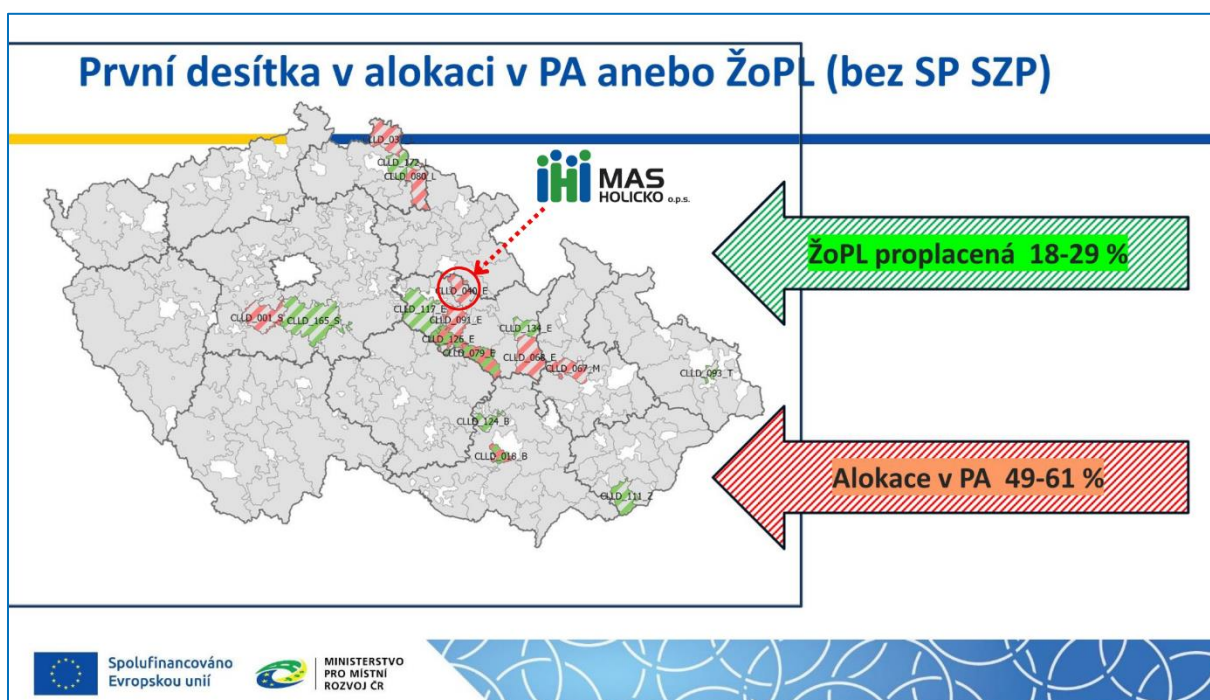

V případě **Programového rámce IROP** již máme zazávazkovanou celou alokaci přidělenou naší **MAS** (22.573.424,-Kč), a to na podporu 1 klíčového projektového záměru "Centrum sociálních služeb Holice – ambulantní odlehčovací služby". Jde sice o podporu pouze jednoho projektu, ale za to unikátního a pro území Holicka velmi důležitého. Na jeho potřebnosti se u jednoho stolu shodli jak poskytovatelé sociálních služeb, starostové obcí, tak i zástupci cílových skupin (uživatelé sociálních služeb). Z tohoto

důvodu v tuto chvíli již **neplánujeme vyhlásit žádné další výzvy** týkající se Programového rámce IROP (pouze až po uvolnění zbylých 30% po splnění milníku v roce 2025).

Od 4/2023 běží **realizace klíčového projektu v rámci Programového rámce OPZ+ s názvem "Holicko - vlídné místo pro život"**. Jde o projekt, který svými aktivitami jednak předchází tomu, než dojde k postavení samotného centra sociálních služeb v Holicích (např. zlepšení sociální práce na obcích, poskytování poradenství, edukace a psychologické a duchovní podpory seniorům a neformálním pečujícím), ale zahrnuje i komunitní aktivity pro rodiny s dětmi nebo komunitní plánování sociálních služeb.

V případě **Programového rámce OPTAK** byly v roce 2024 **postupně vyhlášeny 3 výzvy** v rámci, kterých bylo **vybráno k podpoře 5 projektů** (z toho 1 projekt vyřadilo API v rámci závěrečné kontroly). MAS Holicko poskytovala potencionálním příjemcům podporu, a to hlavně formou konzultací (osobní, telefon, e-mail), ale i realizací 2 seminářů (Horní Jelení, Holice) a 4 konzultačních dní ve své kanceláři. Díky poslední 3. výzvě jsme zazávazkovali celou alokaci MAS pro tento programový rámec (1.400.000,- Kč). Poslední vybraný projekt prošel závěrečným ověřením na Řídícím orgánu v 2/2025, čímž **jsme splnili finanční milník OPTAK a mohli si tak požádat o navýšení alokace o druhou polovinu** (1.400.000,-Kč), na kterou můžeme v roce 2025 vyhlásit další výzvy.

Co se týče **Programového rámce SP SZP**, tak probíhal **sběr projektových záměrů v rámci 1. výzvy na necelou polovinu alokace** MAS Holicko (6.000.000,-Kč). V rámci této výzvy bylo přijato celkem 16 projektů, z toho **11 projektů bylo vybráno** (4.457.533,-Kč) a nyní prochází závěrečným ověřením na Řídícím orgánu. Dále je připravována 2. výzva na zbývající část alokace, která je plánována vyhlásit v 2/2025.

2.1. Přehled vyhlášených výzev

Ve sledovaném období MAS Holicko dokončila realizaci 1. výzvy OPTAK, kterou vyhlásila ke konci roku 2023. V roce 2024 vyhlásila a úspěšně zrealizovala další 3 výzvy (2x OPTAK a 1x SP SZP). Ukončená výzva znamená, že Programový výbor na základě hodnocení Výběrové komise schválil k financování minimálně 1 projekt, který byl následně předán k závěrečnému ověřením na Řídící orgán.

Tabulka 2 – Počet úspěšně zrealizovaných výzev MAS

	Rok 2024	Celkem 2021 - 2030
Vyhlášené výzvy nositele	3	5
Ukončené výzvy nositele	4	5

2.1.1. 1. výzva MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2023)

Vyhlášení výzvy: 7.11.2023

Příjem žádostí: 7.11.2023 – 9.1.2024

Vyhlášené opatření: 1 – Technologie CLLD

Finanční alokace: 1.310.000,-Kč

Tabulka 3 – Finanční alokace pro 1. výzvu MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2023)

1.výzva MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2023)	Finanční alokace výzvy	Počet přijatých projektů	Výše požadované dotace	Počet schválených projektů	Výše schválené dotace – MAS
1 – Technologie CLLD	1.310.000,- Kč	3	908.253,68 Kč	3	908.253,68 Kč

Průběh výzvy: Byly přijaty 3 projektové záměry, které prošly administrativní kontrolou MAS s kladným výsledkem.

Tabulka 4 – Přijaté projektové záměry v rámci 1. výzvy MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2023)

Registrační číslo projektu	Název žadatele	Název projektu	Místo realizace projektu (NUTS 5)	Počet bodů	Status	Výše schválené dotace
Opatření 1 – Technologie CLLD						908.253,68 Kč
2023/01-OPTAK/001	Round Wood CZ s.r.o.	Automatizace plánování zakázek a objednávání dopravy	Horní Jelení	85	Vydán právní akt	307.625,- Kč
2023/01-OPTAK/002	PENTA - servis spol. s r.o.	Automatizace výroby ve společnosti PENTA - servis spol. s r.o.	Holice	80	Nesplnění formálního hodnocení API	274.166,85 Kč
2023/01-OPTAK/003	RTG diagnostika Holice s.r.o.	Pořízení nového archivačního systému PACS včetně souvisejícího HW a nových funkcionalit	Holice	65	Vydán právní akt	326.461,83 Kč

Výběrová komise zasedala v termínech 28.2.2024 a 6.3.2024. Projektové záměry splnily minimální bodovou hranici. Programový výbor rozhodl 18.3.2024 o jejich schválení.

V průběhu 4-5/2024 byly žádosti o podporu předány k hodnocení na API. 2 projekty bez problémů prošly hodnocením API a od 8/2024 jsou ve stavu „Projekt s právním aktem“. Bohužel projekt žadatele PENTA – servis spol. s r.o. i přes konzultace s API (prováděné ještě před podáním záměru na MAS) neprošel formálním hodnocením API (nesplnění podmínky robotizace jako náhrady fyzického úkonu člověka při nevýrobní manipulaci). Důvodem bylo upřesnění některých podmínek mezi API a řídicím orgánem OPTAK (MPO) až v průběhu výzvy.

Tabulka 5 – Parametry schválených projektových záměrů v rámci 1. výzvy MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2023)

Opatření 1 – Technologie CLLD	Měrná jednotka	Hodnota
Počet schválených projektů celkem	Počet	2
Ekonomické zaměření projektu	CZ-NACE	<ul style="list-style-type: none"> • 1x: F 43 – Specializované stavební činnosti • 1x: Q – Zdravotní a sociální péče
Projekty, díky kterým bude podpořena diverzifikace podnikatelské činnosti a/nebo rozšíření dosavadních aktivit žadatele	Počet	0
Počet instalovaných technologií	Zařízení	4
Podniky podpořené granty	Podniky	2
Přidaná hodnota (= přidaná hodnota z VZZ za účetní období po ukončení projektu – přidaná hodnota z VZZ za poslední uzavřené účetní období před podáním žádosti o podporu)	Tis. Kč/rok	7.986
Podniky s vyšším obrátem	Podniky	2

Opatření 1 – Technologie CLLD	Měrná jednotka	Hodnota
Obrat (= obrat z VZZ za účetní období po ukončení projektu – obrat z VZZ za poslední uzavřené účetní období před podáním žádosti o podporu)	Tis. Kč/rok	+ 4.979
Typ žadatele	-	<ul style="list-style-type: none"> • 1x mikropodnik • 1x malý podnik
Prvožadatel na MAS	Počet	2
Začínající podnikatelé (5 let od zahájení podnikání)	Počet	0
Společensky odpovědní žadatelé (sociální oblast, environmentální oblast, zaměstnávání osob ze sociálně znevýhodněných skupin)	Počet	1
Podpořené ženy	Počet	1
Podpoření držitelé regionální značky „KRAJ PERŠTEJNŮ regionální produkt“	Počet	0
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	<ul style="list-style-type: none"> • 1x: 2.000 - 5.000 obyvatel • 1x: nad 5.000 obyvatel
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	54,34 %

Bohužel celková výše vybraných projektů nestačila na naplnění finančního milníku MAS stanoveného OPTAK (minimálně 70% celkové alokace v právních aktech = 917.000,- Kč). Proto MAS Holicko vzápětí po ukončení administrace této výzvy vyhlásila 2. výzvu na celou zbývající alokaci.

2.1.2. 2. výzva MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2024)

Vyhlášení výzvy: 26.3.2024

Příjem žádostí: 26.3.2024 – 29.4.2024

Vyhlášené opatření: 1 – Technologie CLLD

Finanční alokace: 401.746,32 Kč

Tabulka 6 – Finanční alokace pro 2. výzvu MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2024)

2.výzva MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2024)	Finanční alokace výzvy	Počet přijatých projektů	Výše požadované dotace	Počet schválených projektů	Výše schválené dotace – MAS
1 – Technologie CLLD	401.746,32 Kč	1	213.732,50 Kč	1	213.732,50 Kč

Průběh výzvy: Byl přijat 1 projektový záměr, který prošel administrativní kontrolou MAS s kladným výsledkem.

Tabulka 7 – Přijaté projektové záměry v rámci 2. výzvy MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2024)

Registrační číslo projektu	Název žadatele	Název projektu	Místo realizace projektu (NUTS 5)	Počet bodů	Status	Výše schválené dotace
Opatření 1 – Technologie CLLD						213.732,50 Kč
2024/02-OPTAK/001	K-Dent Holice s.r.o.	Digitalizace ordinace – intraorální skener	Holice	65	Vydán právní akt	213.732,50 Kč

Výběrová komise zasedala v termínech 12.6.2024 a 19.6.2024. Projektový záměr splnil minimální bodovou hranici. Programový výbor rozhodl 26.6.2024 o jeho schválení.

V průběhu 8/2024 byla žádost o podporu předána k hodnocení na API a v 2/2025 jí byl vydán právní akt.

Tabulka 8 – Parametry schválených projektových záměrů v rámci 2. výzvy MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2024)

Opatření 1 – Technologie CLLD	Měrná jednotka	Hodnota
Počet schválených projektů celkem	Počet	1
Ekonomické zaměření projektu	CZ-NACE	• 1x: Q – Zdravotní a sociální péče
Projekty, díky kterým bude podpořena diverzifikace podnikatelské činnosti a/nebo rozšíření dosavadních aktivit žadatele	Počet	0
Počet instalovaných technologií	Zařízení	1
Podniky podpořené granty	Podniky	1
Přidaná hodnota (= přidaná hodnota z VZZ za účetní období po ukončení projektu - přidaná hodnota z VZZ za poslední uzavřené účetní období před podáním žádosti o podporu)	Tis. Kč/rok	1.772
Podniky s vyšším obrátem	Podniky	1
Obrat (= obrat z VZZ za účetní období po ukončení projektu - obrat z VZZ za poslední uzavřené účetní období před podáním žádosti o podporu)	Tis. Kč/rok	+ 121
Typ žadatele	-	• 1x mikropodnik
Prvožadatel na MAS	Počet	1
Začínající podnikatelé (5 let od zahájení podnikání)	Počet	0
Společensky odpovědní žadatelé (sociální oblast, environmentální oblast, zaměstnávání osob ze sociálně znevýhodněných skupin)	Počet	0
Podpořené ženy	Počet	0
Podpoření držitelé regionální značky „KRAJ PERŠTEJNŮ regionální produkt“	Počet	0
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	• 1x: nad 5.000 obyvatel
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	50,00 %

Bohužel v průběhu administrace této výzvy API vyřadilo projekt žadatele PENTA – servis spol. s r.o. z 1. výzvy OPTAK. Což znamenalo opětovnou hrozbu neplnění finančního milníku. Proto MAS Holicko vzápětí po ukončení administrace této výzvy vyhlásila 3. výzvu.

2.1.3. 3. výzva MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2024)

Vyhlášení výzvy: 15.7.2024

Příjem žádostí: 15.7.2024 – 30.9.2024

Vyhlášené opatření: 1 – Technologie CLLD

Finanční alokace: 552.180,68 Kč

Tabulka 9 – Finanční alokace pro 3. výzvu MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2024)

3.výzva MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2024)	Finanční alokace výzvy	Počet přijatých projektů	Výše požadované dotace	Počet schválených projektů	Výše schválené dotace – MAS
1 – Technologie CLLD	552.180,68 Kč	1	552.180,68 Kč	1	552.180,68 Kč

Průběh výzvy: Byl přijat 1 projektový záměr, který prošel administrativní kontrolou MAS s kladným výsledkem.

Tabulka 10 – Přijaté projektové záměry v rámci 3. výzvy MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2024)

Registrační číslo projektu	Název žadatele	Název projektu	Místo realizace projektu (NUTS 5)	Počet bodů	Status	Výše schválené dotace
Opatření 1 – Technologie CLLD						552.180,68 Kč
2024/03-OPTAK/001	ekoDEM Pardubice s.r.o.	Pořízení přenosného FTIR spektrometru	Dolní Ředice	70	Formální hodnocení na API	552.180,68 Kč

Výběrová komise zasedala v termínech 12.11.2024 a 19.11.2024. Projektový záměr splnil minimální bodovou hranici. Programový výbor rozhodl 26.11.2024 o jeho schválení.

V průběhu 12/2024 byla žádost o podporu předána k hodnocení na API a v 2/2025 byla výběrovou komisí MPO vybrána k podpoře.

Tabulka 11 – Parametry schválených projektových záměrů v rámci 3. výzvy MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2024)

Opatření 1 – Technologie CLLD	Měrná jednotka	Hodnota
Počet schválených projektů celkem	Počet	1
Ekonomické zaměření projektu	CZ-NACE	• 1x: M 71 – Architektonické a inženýrské činnosti, technické zkoušky a analýzy
Projekty, díky kterým bude podpořena diverzifikace podnikatelské činnosti a/nebo rozšíření dosavadních aktivit žadatele	Počet	0
Počet instalovaných technologií	Zařízení	1
Podniky podpořené granty	Podniky	1
Přidaná hodnota (= přidaná hodnota z VZZ za účetní období po ukončení projektu - přidaná hodnota z VZZ za poslední uzavřené účetní období před podáním žádosti o podporu)	Tis. Kč/rok	3.596
Podniky s vyšším obratem	Podniky	1
Obrat (= obrat z VZZ za účetní období po ukončení projektu - obrat z VZZ za poslední uzavřené účetní období před podáním žádosti o podporu)	Tis. Kč/rok	+ 1.353
Typ žadatele	-	• 1x mikropodnik
Prvožadatel na MAS	Počet	1
Začínající podnikatelé (5 let od zahájení podnikání)	Počet	1
Společensky odpovědní žadatelé (sociální oblast, environmentální oblast, zaměstnávání osob ze sociálně znevýhodněných skupin)	Počet	1
Podpořené ženy	Počet	0

Opatření 1 – Technologie CLLD	Měrná jednotka	Hodnota
Podpoření držitelé regionální značky „KRAJ PERŠTEJNŮ regionální produkt“	Počet	0
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	• 1x: 500 – 2.000 obyvatel
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	63,92 %

Dne 14.2.2025 se poslední vybraný projekt MAS dostal do stavu PP25 (žádost o podporu doporučena k financování), čímž jsme zazávazkovali 100% první části přidělené alokace MAS Holicko v rámci programového rámce OPTAK. Díky tomu jsme si v 2/2025 požádali o navýšení alokace o dalších 1.400.000 Kč, na které budeme následně vyhlášovat výzvy.

2.1.4. 1. výzva MAS Holicko – SP SZP (2024)

Vyhlášení výzvy: 3.6.2024

Příjem žádostí: 3.6.2024 – 2.8.2024

Vyhlášené Fiche: 2 – Lesnické podnikání a hospodaření v lese, 4 – Podnikání malých a středních podniků, 5 – Základní služby a obnova venkova

Finanční alokace: 6.000.000,-Kč

Tabulka 12 – Finanční alokace pro 1. výzvu MAS Holicko – SP SZP (2024)

1.výzva MAS Holicko – SP SZP (2024)	Finanční alokace výzvy	Počet přijatých projektů	Výše požadované dotace	Počet schválených projektů	Výše schválené dotace – MAS
2 – Lesnické podnikání a hospodaření v lese	500.000,- Kč	0	0 Kč	0	0 Kč
4 – Podnikání malých a středních podniků	2.000.000,- Kč	7	3.144.012,- Kč	4	1.160.000,- Kč
5 – Základní služby a obnova obcí	3.500.000,- Kč	9	4.395.780,- Kč	7	3.297.533,- Kč
Celkem	6.000.000,- Kč	16	7.539.792,- Kč	11	4.457.533,- Kč

Průběh výzvy: Bylo přijato 16 projektových záměrů. 1 projekt byl podán na MAS po ukončení příjmu žádostí a z toho důvodu byla jeho administrace ihned ukončena. Všechny ostatní projekty prošly administrativní kontrolou MAS s kladným výsledkem.

Tabulka 13 – Přijaté projektové záměry v rámci 1. výzvy MAS Holicko – SP SZP (2024)

Registrační číslo projektu	Název žadatele	Název projektu	Místo realizace projektu (NUTS 5)	Počet bodů	Status	Výše schválené dotace
Fiche 2 – Lesnické podnikání a hospodaření v lese						0 Kč
-	-	-	-	-	-	-
Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků						1.160.000,- Kč
24/001/52774/467/005001	Jiří Trojan	Pořízení mulčovače	Horní Ředice	70	Formální hodnocení na SZIF	250.000,- Kč
24/001/52774/467/005089	Pepe projekt s.r.o.	Pepe projekt 2025	Holice	85	Formální hodnocení na SZIF	260.000,- Kč
24/001/52774/467/005217	Pavel Špaček	oplocení zahradnictví a prodejní stoly	Vysoké Chvojno	70	Formální hodnocení na SZIF	150.000,- Kč
24/001/52774/467/005577	Martin Štěpánek	Investice do podnikání - Dolní Ředice	Dolní Ředice	80	Formální hodnocení na SZIF	500.000,- Kč

Registrační číslo projektu	Název žadatele	Název projektu	Místo realizace projektu (NUTS 5)	Počet bodů	Status	Výše schválené dotace
24/001/52774/467/005367	STAVEKO TRADE s.r.o.	Zefektivnění výroby pořízením svařovacího zařízení	Horní Ředice	60	Nevybrán MAS	0 Kč
24/001/52774/467/005561	Zemědělská společnost Ostřetín, a.s.	Zlepšení napájení a odchovu telat s možností vzdáleného přístupu	Ostřetín	50	Nevybrán MAS	0 Kč
24/001/52774/467/005571	Ing. František Pýcha	Novostavba otevřené stodoly pro traktor/traktorové příslušenství	Dolní Roveň	60	Nevybrán MAS	0 Kč
Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí						3.297.533,- Kč
24/001/52775/467/005318	Mateřská škola Holice, Holubova 39, okres Pardubice	Herní prvek	Holice	75	Formální hodnocení na SZIF	160.000,- Kč
24/001/52775/467/005413	Obec Chvojenec	Sociální zázemí pro multifunkční hřiště a MŠ Chvojenec	Chvojenec	70	Formální hodnocení na SZIF	1.600.000,- Kč
24/001/52775/467/005424	TJ Sokol Vysoké Chvojno, z.s.	Vybavení zázemí sportoviště 2024	Vysoké Chvojno	100	Formální hodnocení na SZIF	251.680,- Kč
24/001/52775/467/005487	Mateřská škola Horní Ředice, okres Pardubice	Doplnění herních a vzdělávacích prvků zahrady MŠ Horní Ředice	Horní Ředice	70	Formální hodnocení na SZIF	560.000,- Kč
24/001/52775/467/005569	Myslivecké sdružení Chvojenec, z.s.	Pořízení dronu	Chvojenec	70	Formální hodnocení na SZIF	152.000,- Kč
24/001/52775/467/005580	Mateřská škola Horní Jelení, příspěvková organizace	Zahradní altán	Horní Jelení	65	Formální hodnocení na SZIF	400.000,- Kč
24/001/52775/467/005583	Mateřská škola Holice, Staroholická 236, okres Pardubice	MŠ Staroholická	Holice	85	Formální hodnocení na SZIF	173.853,- Kč
24/001/52775/467/005473	Obec Horní Ředice	Oprava kapličky v Horních Ředicích včetně terénních úprav	Horní Ředice	55	Nevybrán MAS	0 Kč
24/001/52775/467/005606	Obec Ostřetín	Obec Ostřetín - investice do drobné infrastruktury	Ostřetín	-	Ukončení administrace – podání po termínu	0 Kč

Výběrová komise zasedala v termínech 4.9.2024 a 9.9.2024. Projektové záměry splnily minimální bodovou hranici. Programový výbor rozhodl 23.9.2024 o podpoření všech projektů, na které vystačily alokace jednotlivých Fichí v plné výši.

Do 6.11.2024 byly všechny vybrané žádosti o podporu předány k hodnocení na SZIF a nyní probíhá hodnocení formálních náležitostí.

Tabulka 14 – Parametry schválených projektových záměrů v rámci 1. výzvy MAS Holicko – SP SZP (2023): Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků

Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků	Měrná jednotka	Hodnota
Počet schválených projektů celkem	Počet	4
Projekty zaměřené na a) Zemědělské podnikání	Počet	3
Projekty zaměřené na b) Zpracování a uvádění na trh produktů	Počet	1
Projekty zaměřené na d) Nezemědělské podnikání	Počet	3

Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků	Měrná jednotka	Hodnota
Ekonomické zaměření projektu	CZ-NACE	<ul style="list-style-type: none"> • 3x: A – Zemědělství, lesnictví a rybnářství • 1x: C 10 – Výroba potravinářských výrobků • 1x: G 47 – Maloobchod kromě motorových vozidel • 1x: E 38 – Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů; úprava odpadů k dalšímu využití
Projekty zaměřené na pořízení vozidla	Počet	2
Inovativní projekty	Počet	2
Projekty s přidanou hodnotou	Počet	4
Projekty, díky kterým bude podpořena diverzifikace podnikatelské činnosti a/nebo rozšíření dosavadních aktivit žadatele	Počet	1
Projekty zlepšující základní vybavení nebo služby v obci	Počet	1
Typ žadatele	-	<ul style="list-style-type: none"> • 3x zemědělec mikropodnik • 1x mikropodnik
Prvožadatel na MAS	Počet	3
Začínající podnikatelé (5 let od zahájení podnikání)	Počet	2
Společensky odpovědní žadatelé (sociální oblast, environmentální oblast, zaměstnávání osob ze sociálně znevýhodněných skupin)	Počet	1
Podpořené ženy	Počet	0
Podpoření držitelé regionální značky „KRAJ PERŠTEJNŮ regionální produkt“	Počet	2
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	<ul style="list-style-type: none"> • 1x: do 500 obyvatel • 2x: 500 - 2.000 obyvatel • 1x: nad 5.000 obyvatel
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	52,40 %

Tabulka 15 – Parametry schválených projektových záměrů v rámci 1. výzvy MAS Holicko – SP SZP (2023): Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí

Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí	Měrná jednotka	Hodnota
Počet schválených projektů celkem	Počet	7
Projekty zaměřené na a) Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven	Počet	1
Projekty zaměřené na b) Drobná infrastruktura a základní služby	Počet	2
Projekty zaměřené na c) Drobné památky místního významu	Počet	0
Projekty zaměřené na d) Školská zařízení	Počet	5
Inovativní projekty	Počet	1
Projekty s přidanou hodnotou	Počet	7
Projekty, jejichž výstupy podpoří komunitní život v obci	Počet	2
Projekty, jejichž výstupy podpoří práci s dětmi a mládeží	Počet	6
Projekty, jejichž výstupy budou sloužit pro více aktivit/účelů v obci	Počet	4

Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí	Měrná jednotka	Hodnota
Počet obyvatel, kteří mají prospěch ze zlepšených služeb / infrastruktur	Počet obyvatel	0
Typ žadatele	-	<ul style="list-style-type: none"> • 1x obec • 4x škola • 2x NNO
Prvožadatel na MAS	Počet	6
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	<ul style="list-style-type: none"> • 1x: do 500 obyvatel • 4x: 500 - 2.000 obyvatel • 2x: nad 5.000 obyvatel
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	26,74 %

2.2. Průběh administrace výzev

Následující tabulka shrnuje administraci všech výzev MAS Holicko vyhlášených od začátku realizace Strategie CLLD 21+, tj. od 6.8.2021. Samostatně je zde zdůrazněn sledovaný rok 2024. V tabulce je možné vyčíst, kolik žádostí o podporu bylo přijato a hodnoceno, kolik jich bylo schváleno, kolik jich je v realizaci, apod.

V roce 2024 již započala intenzivní realizace SCLLD, tak aby MAS Holicko stihla veškeré finanční milníky, které nám stanovili jednotlivé řídicí orgány. Z tohoto důvodu jsme postupně vyhlásili 4 výzvy pro předkládání projektových záměrů (3x Programový rámec OPTAK a 1x Programový rámec SP SZP).

V letošním roce jsme tedy hodnotili celkem 21 projektů (administrativní kontrola, věcné hodnocení). 16 z nich bylo předáno na řídicí orgány k závěrečnému ověření způsobilosti, z toho 1 byl vyřazen řídicím orgánem v rámci formálního hodnocení (důvodem bylo upřesnění některých podmínek mezi API a řídicím orgánem OPTAK (MPO) až v průběhu výzvy), 2 podepsaly smlouvu o poskytnutí dotace a dokonce 1 projekt ještě před koncem roku podal žádost o platbu.

1 projekt z předchozí výzvy IROP vyhlášené v roce 2023 podepsal smlouvu o poskytnutí dotace a podal žádost o změnu.

Tabulka 16 – Průběh administrace výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2021 - 2030

Průběh administrace výzev	Rok 2024	Celkem 2021 - 2030
Počet podaných projektů	21	22
Počet projektů vyřazených v administrativní kontrole	1	1
Počet projektů vyřazených ve věcném hodnocení	0	0
Počet vybraných projektů	16	17
Počet náhradníků	0	0
Počet podaných odvolání na MAS	0	0
Počet vyřazených projektů ŘO	1	1
Počet projektů s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace	3	3
Počet projektů v realizaci (neukončené k 31.12. daného roku)	2	3
Počet podaných Žádostí o změnu	1	1
Počet podaných Monitorovacích zpráv	1	1
Kontrola na místě realizace projektu	21	22
Počet podaných Závěrečných Žádostí o platbu	1	1
Počet projektů v době udržitelnosti (k 31.12. daného roku)	0	0

2.3. Kategorie schválených žadatelů


Níže uvedená tabulka uvádí kategorie žadatelů, kteří projekt podali a kteří byli schváleni v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených od začátku realizace Strategie CLLD 21+, tj. od 6.8.2021.

Z tabulky je patrné, že nejvíce schválených žadatelů jsou obce a podnikatelské subjekty (oboje mají po 5 projektech). Ostatních typů žadatelů je podstatně méně: zemědělci – 3 projekty, NNO – 2 projekty a církevní organizace – 1 projekt.

V případě srovnání částek schválené dotace je ale rozložení úplně jiné. U církevních organizací je podíl 79,55% alokace. To je způsobeno tím, že Oblastní charita Pardubice realizuje klíčový projekt zaměřený na výstavbu centra sociálních služeb, který byl komunitně projednán a na jehož realizaci padla celá alokace Programového rámce IROP ve výši 22.573.424,- Kč. Další pořadí je už ale obdobné jako u počtu podpořených projektů: obce – 10,00 %, podnikatelské subjekty – 5,85 %, zemědělci – 3,17 %, NNO – 1,42 %.

Tabulka 17 – Kategorie schválených žadatelů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2021 – 2030

Monitoring typu schválených žadatelů	Rok 2024	Celkem 2021 - 2030	%
Stát a jeho organizace	0	0	0 %
Obce, svazky obcí nebo jejich organizace	2.837.697,- Kč (5 projektů)	2.837.697,- Kč (5 projektů)	10,00 %
Círky a jejich organizace	0	22.573.424,- Kč (1 projekt)	79,56 %
Nestátní neziskové organizace	403.680,- Kč (2 projekty)	403.680,- Kč (2 projekty)	1,42 %
Zemědělci	900.000,- Kč (3 projekty)	900.000,- Kč (3 projekty)	3,17 %
Podnikatelské subjekty	1.660.000,- Kč (5 projektů)	1.660.000,- Kč (5 projektů)	5,85 %
Celkem	5.801.377,- Kč (15 projektů)	28.374.801,- Kč (16 projektů)	100 %

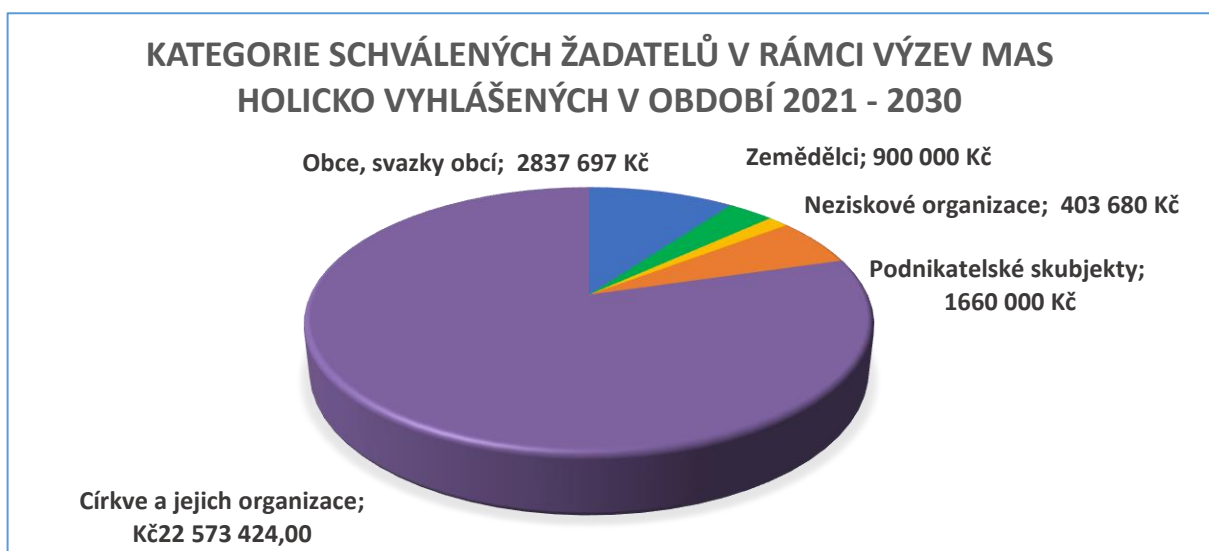

2.4. Místa realizace schválených projektů

Následující tabulka uvádí místa realizace schválených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených od začátku realizace Strategie CLLD 21+, tj. od 6.8.2021.

I zde nám vyčnívá klíčový projekt Oblastní charity Pardubice, který se realizuje v Holicích.

Tabulka 18 – Místa realizace schválených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2021 – 2030

Místo realizace schválených projektů	Rok 2024	Celkem 2021 - 2030	%
Býšť	0	0	0 %
Dolní Roveň	0	0	0 %
Dolní Ředice	1.052.180,68 Kč (2 projekty)	1.052.180,68 Kč (2 projekty)	3,71 %
Holice	1.134.047,32 Kč (5 projektů)	23.707.471,32 Kč (6 projektů)	83,55 %
Horní Jelení	707.625,- Kč (2 projekty)	707.625,- Kč (2 projekty)	2,49 %
Horní Ředice	753.844,- Kč (2 projekty)	753.844,- Kč (2 projekty)	2,66 %
Chvojenec	1.752.000,- Kč (2 projekty)	1.752.000,- Kč (2 projekty)	6,17 %
Jaroslav	0	0	0 %
Nová Ves	0	0	0 %
Ostřetín	0	0	0 %
Poběžovice u Holic	0	0	0 %
Radhošť	0	0	0 %
Trusnov	0	0	0 %
Týništko	0	0	0 %
Uhersko	0	0	0 %
Veliny	0	0	0 %
Vysoké Chvojno	401.680,- Kč (2 projekty)	401.680,- Kč (2 projekty)	1,42 %
Celkem	5.801.377,- Kč (15 projektů)	28.374.801,- Kč (16 projektů)	100 %

Výše schválené podpory ze Strategie CLLD MAS Holicko 2021-2027(2030) dle obcí



Schválená výše podpory v Kč k 31.12.2024:

0 Kč	Býšť, Dolní Roveň, Jaroslav, Nová Ves, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Radhošť, Trusnov, Týnišťko, Uhersko, Veliny
1 - 999 999 Kč	Horní Jelení, Horní Ředice, Vysoké Chvojno
1 000 000 - 1 999 999 Kč	Dolní Ředice, Chvojenec
2 000 000 - 11 999 999 Kč	-
12 000 000 - 21 999 999 Kč	-
22 000 000 Kč a více	Holice

Výše schválené podpory ze Strategie CLLD MAS Holicko 2021-2027(2030) dle obcí v přepočtu na 1 obyvatele



Schválená výše podpory v Kč / 1 obyvatele k 31.12.2024:

0 Kč	Býšť, Dolní Roveň, Jaroslav, Nová Ves, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Radhošť, Trusnov, Týnišťko,
1 - 999 Kč	Horní Jelení, Horní Ředice, Vysoké Chvojno
1 000 - 1 999 Kč	Dolní Ředice
2 000 - 2 999 Kč	Chvojenec
3 000 - 3 999 Kč	Holice
4 000 Kč a více	-

3. Věcný pokrok v plnění cílů strategie CLLD

Ve sledovaném období byly 4 projekty v realizaci (1x OPZ+, 1x IROP, 2x OPTAK), z toho 1 projekt (OPTAK) podal závěrečnou žádost o platbu.

3.1. Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce IROP

Dosavadní plnění SCLLD 21+ ve vztahu k jednotlivým opatřením Programového rámce IROP probíhalo následovně:

Opatření 1 – Sociální služby: V 2/2024 jediný klíčový projekt "Centrum sociálních služeb Holice – ambulantní odlehčovací služby" z předchozí výzvy IROP vyhlášené v roce 2023 získal pravomocné stavební povolení a následně v 3/2024 bylo podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Poté bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby (VALC, s.r.o.) a v létě 2024 byly započaty stavební práce.

Tímto projektem je celá alokace MAS Holicko Programového rámce IROP zazávazkována. Z tohoto důvodu již v rámci tohoto Programového rámce neplánujeme vyhlásit žádné další výzvy (pouze až po případném uvolnění zbylých 30% po splnění milníku v roce 2025).

Indikátorový plán by měl být tímto projektem naplněn na 100%.

Tabulka 19 – Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce IROP k 31.12.2024

Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce IROP	1 – Sociální služby	Celkem Programový rámec IROP
Finanční alokace pro celé období uvedená v SCLLD 21+	22.573.424,- Kč	22.573.424,- Kč
Vyhlášená alokace	22.573.424,- Kč	22.573.424,- Kč
Počet podaných projektů	1	1
Výše požadované dotace (<i>Projektový záměr</i>)	22.573.424,- Kč	22.573.424,- Kč
Počet schválených projektů	1	1
Výše schválené dotace (<i>Rozhodnutí o poskytnutí dotace</i>)	22.573.424,- Kč	22.573.424,- Kč
Počet podpořených projektů	0	0
Výše proplacené dotace	0 Kč	0 Kč
Výše sankcí a korekcí	0 Kč	0 Kč
Volná alokace využitelná pro další výzvy	0 Kč	0 Kč

3.1.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce IROP

Ve sledovaném období teprve započala realizace vybraného projektu a do konce roku 2024 nebyla podána žádná průběžná, natož pak závěrečná zpráva o realizaci projektu.

3.1.2. Plnění indikátorového plánu Programového rámce IROP

Ve sledovaném období nebyla ukončena realizace žádného projektu, tzn. že nebyly plněny žádné indikátory Programového rámce IROP.

Tabulka 20 – Plnění indikátorového plánu Programového rámce IROP uvedeného v SCLLD 21+ v období 2021-2030

Název indikátoru	Plán uvedený v SCLLD 21+	Plnění	
		Celkem 2021 - 2024	%
Opatření 1 – Sociální služby			
323000 - Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů (GJ/rok)	0	0	0 %
554010 - Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	1	0	0 %
554101 - Nová kapacita podpořených zařízení pobytových sociálních služeb (osoby)	0	0	0 %
554201 - Rekonstruovaná či modernizovaná kapacita podpořených zařízení pobytových sociálních služeb (osoby)	0	0	0 %
554301 - Nová kapacita podpořených zařízení nepobytových sociálních služeb (osoby)	10	0	0 %
554401 - Rekonstruovaná či modernizovaná kapacita podpořených zařízení nepobytových sociálních služeb (osoby)	0	0	0 %
554601 - Počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče za rok	30	0	0 %

*Datum cílové hodnoty všech indikátorů je již 31.12.2026

3.1.3. Plnění finančního plánu Programového rámce IROP

Finanční plán uvedený ve Strategii CLLD 21+ je plněn. A to z důvodu toho, že se při jeho tvorbě neočekávalo, že by některý projekt mohl podat žádost o proplacení do 30.6.2024.

Tabulka 21 – Plnění finančního plánu Programového rámce IROP uvedeného v SCLLD 21+ v období 2021–2023

FINANČNÍ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD 21+ – OBDOBÍ 2021 - 2024						
Opatření	Podpora – příspěvek EU	Podpora – státní rozpočet	Podpora celkem	Vlastní zdroje příjemce	Celkové způsobilé výdaje	Kumulativní % čerpání alokace
1. Sociální služby	0	0	0	0	0	0 %
SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ – OBDOBÍ 2021 - 2024						
Opatření	Podpora – příspěvek EU	Podpora – státní rozpočet	Podpora celkem	Vlastní zdroje příjemce	Celkové způsobilé výdaje	Kumulativní % čerpání alokace
1. Sociální služby	0	0	0	0	0	0 %
SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI S PLÁNEM – OBDOBÍ 2021 - 2024						
Opatření	Podpora – příspěvek EU	Podpora – státní rozpočet	Podpora celkem	Vlastní zdroje příjemce	Celkové způsobilé výdaje	Kumulativní % čerpání alokace
1. Sociální služby	-	-	-	-	-	-

*Veškeré částky jsou v případě Programového rámce IROP počítány ze žádostí o platbu podaných na CRR do 30.6.2024

Nejbližší finanční milník, který musí MAS Holicko splnit: K 30.6.2025 musí být minimálně 24,4% celkové alokace (5.507.916,-Kč) předložených žádostech o platbu. Pokud se ho MAS podaří splnit, pak může získat až dalších cca 9,5 mil. Kč pro využití ve svém území.

3.2. Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce OPTAK

Dosavadní plnění SCLLD 21+ ve vztahu k jednotlivým opatřením Programového rámce OPTAK probíhalo následovně:

Opatření 1 – Technologie CLLD: MAS Holicko ve sledovaném období postupně vyhlásila 3 výzvy Programového rámce OPTAK, v rámci kterých bylo vybráno k podpoře 5 projektů. Z toho 1 projekt vyřadilo API v rámci závěrečné kontroly, a to i přes konzultace mezi MAS a API ještě před podáním záměru na MAS. Důvodem bylo upřesnění některých podmínek mezi API a řídicím orgánem OPTAK (MPO) až v průběhu výzvy. 2 z vybraných projektů ve sledovaném období podepsaly Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jsou tedy v realizaci a dokonce 1 z nich stihl svou realizaci dokončit a v 12/2024 podal závěrečnou žádost o platbu (a v 3/2025 byl proplacen). 1 projekt je ve stavu „žádost o podporu doporučena k financování“ a API čeká na doložení potřebných příloh, aby mohl být vydán právní akt (byl vydán v 2/2025). A poslední projekt byl teprve v druhé polovině 12/2024 předán k hodnocení na API, prošel hodnocením formálních náležitostí a v 2/2025 byl výběrovou komisí MPO doporučen k financování.

V 7/2024 jsme požádali o navýšení alokace o částku na kterou jsme měli nárok a která vznikla dodatečným rozpočítáním volných financí nezúčastněných MAS v OPTAK, tzn. z původních 1.310.000,-Kč jsme požádali o navýšení na nových 1.400.000,-Kč (navýšení o 90.000,-Kč).

Díky poslední 3. výzvě jsme zazávazkovali celou alokaci MAS pro tento Programový rámec (v 7/2024 byla navýšena z 1.310.000,- Kč na 1.400.000,- Kč). Dne 14.2.2025 se poslední vybraný projekt MAS dostal do stavu PP25 (žádost o podporu doporučena k financování), čímž jsme zazávazkovali 100% první části přidělené alokace MAS Holicko v rámci programového rámce OPTAK. Díky tomu jsme si v 2/2025 požádali o navýšení alokace o dalších 1.400.000,- Kč, na které následně vyhlásíme výzvy.

Indikátorový plán by měl být naplněn těmito projekty min. na 150%.

Tabulka 22 – Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce OPTAK k 31.12.2024

Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce OPTAK	1 – Technologie CLLD	Celkem Programový rámec OPTAK
Finanční alokace pro celé období uvedená v SCLLD 21+	1.400.000,- Kč	1.400.000,- Kč
Vyhlášená alokace	2.263.927,- Kč	2.263.927,- Kč
Počet podaných projektů	5	5
Výše požadované dotace (<i>Projektový záměr</i>)	1.674.166,86 Kč	1.674.166,86 Kč
Počet schválených projektů	2	2
Výše schválené dotace (<i>Rozhodnutí o poskytnutí dotace</i>)	634.086,82 Kč	634.086,82 Kč
Počet podpořených projektů	1	1
Výše proplacené dotace	326.461,82 Kč	326.461,82 Kč
Výše sankcí a korekcí	0 Kč	0 Kč
Volná alokace využitelná pro další výzvy	0 Kč	0 Kč

3.2.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce OPTAK

Ve sledovaném období podal závěrečnou žádost o platbu 1 projekt z výzvy č. 1-OPTAK. Protože žádost o platbu byla podána až v průběhu prosince, tak k jejímu schválení a následnému proplacení došlo až v průběhu 2-3/2025. Projekt byl bez uložené sankce/korekce a dodržel indikátory a preferenční kritéria, ke kterým se zavázal.

Tabulka 23 – Podpořené projekty v rámci Programového rámce OPTAK v roce 2024

Opatření	Registrační číslo	Žadatel	Název projektu	Místo realizace	Poskytnutá dotace	Proplacení projektu
1. výzva MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2023)						
1	2023/01-OPTAK/003	RTG diagnostika Holice s.r.o.	Pořízení nového archivačního systému PACS včetně souvisejícího HW a nových funkcionalit	Holice	326.461,82 Kč	1.3.2025

Níže uvedené tabulky shrnují parametry, které MAS Holicko sleduje u podpořených projektů pro dané opatření. Jsou zde uvedeny souhrnně všechny projekty, které byly realizovány od začátku realizace Strategie CLLD 21+, tj. od 6.8.2021. Samostatně je zde uveden právě sledovaný rok 2024.

V rámci opatření 1 – Technologie CLLD byl od začátku realizace Strategie CLLD 21+ podpořen 1 projekt, který byl zaměřen na oblast zdravotnictví. V rámci tohoto projektu byly instalovány 2 technologie, které sice umožnily navýšení obrátu podpořenému podniku, ale bohužel nebyly zaměřeny na rozšíření aktivit žadatele. Výše finanční spoluúčasti žadatele byla 50%.

V případě podrobnějšího pohledu na žadatele je dobré zmínit, že se jednalo o mikropodnik – ženu, prvožadatelku na MAS z obce o velikosti větší než 5.000 obyvatel.

Tabulka 24 – Parametry podpořených projektů Opatření 1 – Technologie CLLD v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2021–2024

Opatření 1 – Technologie CLLD	Měrná jednotka	Hodnota	
		Rok 2024	Celkem 2021 - 2024
Počet podpořených projektů celkem	Počet	1	1
Ekonomické zaměření projektu	CZ-NACE	• 1x: Q – Zdravotní a sociální péče	• 1x: Q – Zdravotní a sociální péče
Projekty, díky kterým bude podpořena diverzifikace podnikatelské činnosti a/nebo rozšíření dosavadních aktivit žadatele	Počet	0	0
Počet instalovaných technologií	Zařízení	2	2
Podniky podpořené granty	Podniky	1	1
Přidaná hodnota (= přidaná hodnota z VZZ za účetní období po ukončení projektu - přidaná hodnota z VZZ za poslední uzavřené účetní období před podáním žádosti o podporu)	Tis. Kč/rok	Tyto indikátory budou vykázány až v rámci 1. ZoU, důvodem je to, že od podání ŽoD do podání ŽoPI nedošlo k uzavření dalšího účetního období	-
Podniky s vyšším obratem	Podniky		-
Obrat (= obrat z VZZ za účetní období po ukončení projektu - obrat z VZZ za poslední uzavřené účetní období před podáním žádosti o podporu)	Tis. Kč/rok		-
Typ žadatele	-	• 1x mikropodnik	• 1x mikropodnik
Prvožadatel na MAS	Počet	1	1
Začínající podnikatelé (5 let od zahájení podnikání)	Počet	0	0
Společensky odpovědní žadatelé (sociální oblast, environmentální oblast, zaměstnávání osob ze sociálně znevýhodněných skupin)	Počet	0	0
Podpořené ženy	Počet	1	1
Podpoření držitelé regionální značky „KRAJ PERŠTEJNŮ regionální produkt“	Počet	0	0
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	• 1x: nad 5.000 obyvatel	• 1x: nad 5.000 obyvatel
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	50,00 %	50,00 %

3.2.2. Plnění indikátorového plánu Programového rámce OPTAK

Indikátorový plán Programového rámce OPTAK byl nastaven tak, abychom splňovali minimální hodnoty, které nám stanovil řídicí orgán dle výše přidělené alokace. Ale z plánovaných hodnot u vybraných projektů vidíme, že bychom měli naplnit indikátorový plán na min. 150 %.

Do 31.12.2024 2 projekty podepsaly právní akt (plnění indikátoru na 100 %), další 2 projekty jsou v hodnocení na API (plánované plnění indikátoru na 200 %).

Očekáváme, že projekty s právním aktem nainstalují celkem 4 technologie (plnění indikátoru na 100 %) a další 2 právě hodnocené projekty nainstalují další 2 technologie (plnění indikátoru na 150 %).

Tabulka 25 – Plnění indikátorového plánu Program. rámce OPTAK uvedeného v SCLLD 21+ v období 2021-2030

Název indikátoru	Plán uvedený v SCLLD 21+	Plnění	
		Celkem 2021 - 2024	%
Opatření 1 – Technologie CLLD			
101022 – Podniky podpořené granty (počet)	2	2	100 %
243010 – Počet instalovaných technologií	4	4	100 %

*Datum cílové hodnoty obou indikátorů v případě Programového rámce OPTAK je počítán ze žádostí o podporu, které mají podepsaný právní akt do 31.3.2025 (v 12/2024 jsme si požádali o prodloužení termínu pro splnění milníku z 31.12.2024 do 31.3.2025)

3.2.3. Plnění finančního plánu Programového rámce OPTAK

K 31.12.2024 máme v projektech s právním aktem zazávazkováno 634.086,82 Kč (45,29 %), což je o 345.913,18 Kč (24,71 %) méně než je uvedeno v aktualizovaném finančním plánu. Z tohoto důvodu MAS Holicko v 12/2024 požádala o prodloužení milníku do 31.3.2025. Nakonec jsme zvládli zazávazkovat celou alokaci MAS, tj. 1.400.000,- Kč k 14.2.2025.

Tabulka 26 – Plnění finančního plánu Programového rámce OPTAK uvedeného v SCLLD 21+ v období 2021–2024

FINANČNÍ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD 21+ – OBDOBÍ 2021 - 2024						
Opatření	Podpora – příspěvek EU	Podpora – státní rozpočet	Podpora celkem	Vlastní zdroje příjemce	Celkové způsobilé výdaje	Kumulativní % čerpání alokace
1. Technologie CLLD	980.000,00	0	980.000,00	980.000,00	1.960.000,00	70.00 %
SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ – OBDOBÍ 2021 - 2024						
Opatření	Podpora – příspěvek EU	Podpora – státní rozpočet	Podpora celkem	Vlastní zdroje příjemce	Celkové způsobilé výdaje	Kumulativní % čerpání alokace
1. Technologie CLLD	634.086,82	0	634.086,82	634.086,81	1.268.173,63	45,29 %
SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI S PLÁNEM – OBDOBÍ 2021 - 2024						
Opatření	Podpora – příspěvek EU	Podpora – státní rozpočet	Podpora celkem	Vlastní zdroje příjemce	Celkové způsobilé výdaje	Kumulativní % čerpání alokace
1. Technologie CLLD	-345.913,18	0	-345.913,18	-345.913,19	-691.826,37	-24,71 %

*Veškeré částky jsou v případě Programového rámce OPTAK počítány ze žádostí o podporu, které mají podepsaný právní akt do 31.12.2024

Nejbližší finanční milník, který musí MAS Holicko splnit: K 31.3.2025 musí být minimálně 70% celkové alokace (980.000,-Kč) zazávazkováno, tzn. v žádostech o dotaci s podepsaným právním aktem. Pokud se ho MAS podaří splnit, pak získá minimálně dalších 1.400.000,-Kč pro využití ve svém území.

3.3. Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce SP SZP

Dosavadní plnění SCLLD 21+ ve vztahu k jednotlivým opatřením Programového rámce SP SZP probíhalo následovně:

Fiche 2 – Lesnické podnikání a hospodaření v lese: V 2-4/2024 probíhala výzva. Bohužel žádný projekt týkající se této Fiche se do výzvy nepřihlásil. Další výzva je v plánu vyhlásit v 2/2025.

Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků: V 2-4/2024 probíhala výzva, v rámci které byly vybrány k podpoře celkem 4 projekty (projekty, které mohly být podpořeny v plné výši). Do 6.11.2024 byly všechny vybrané projekty předány k hodnocení na SZIF a nyní probíhá hodnocení formálních náležitostí. Další výzva je v plánu vyhlásit v 2/2025.

Co se týče indikátorového plánu, pak počet podpořených zemědělců by již měl být na 100 %, naopak máme málo podpořených nezemědělských podnikatelů (1 z plánovaných 9), kde je předpokládané plnění na pouhých 11 %.

Fiche 5 – Základní služba a obnova obcí: V 2-4/2024 probíhala výzva, v rámci které bylo vybráno k podpoře celkem 7 projektů (projekty, které mohly být podpořeny v plné výši). Do 6.11.2024 byly všechny vybrané žádosti o podporu předány k hodnocení na SZIF a nyní probíhá hodnocení formálních náležitostí. Další výzva je v plánu vyhlásit v 2/2025.

Co se týče indikátorového plánu, tak ten nelze vyčíslit. Důvod je ten, že formulář žádosti o dotaci neobsahuje pole, kde by žadatel měl vyčíslit počet osob, které budou využívat výstupy projektu. Doufáme, že tyto údaje budou uvedeny v žádosti o platbu.

Fiche 6 – Neproduktivní infrastruktura v krajině: Výzva pro tuto Fichi je v plánu vyhlásit v 2/2025.

Fiche 7 – Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER: ke konci roku 2024 započala diskuse nad možnými tématy spolupráce. Podání žádosti o dotaci se plánuje v průběhu let 2025 nebo 2026.

Tabulka 27 – Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce SP SZP k 31.12.2024

Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce SP SZP	2 – Lesnické podnikání a hospodaření v lese	4 – Podnikání malých a středních podniků	5 – Základní služby a obnova obcí	6 – Neproduktivní infrastruktura v krajině	7 – Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER	Celkem Programový rámec SP SZP
Finanční alokace pro celé období uvedená v SCLLD 21+	1.000.000,- Kč	4.000.000,- Kč	6.957.200,- Kč	500.000,- Kč	1.000.000,- Kč	13.457.200,- Kč
Vyhlášená alokace	500.000,- Kč	2.000.000,- Kč	3.500.000,- Kč	0 Kč	0 Kč	6.000.000,- Kč
Počet podaných projektů	0	7	9	0	0	16
Výše požadované dotace (Projektový záměr)	0 Kč	3.144.012,- Kč	4.395.780,- Kč	0 Kč	0 Kč	7.539.792,- Kč
Počet schválených projektů	0	4	70	0	0	11
Výše schválené dotace (Dohoda o poskytnutí dotace)	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Počet podpořených projektů	0	0	0	0	0	0
Výše proplacené dotace	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Výše sankcí a korekcí	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Volná alokace využitelná pro další výzvy	1.000.000,- Kč	2.840.000,- Kč	3.659.667,- Kč	500.000,- Kč	1.000.000,- Kč	8.999.667,- Kč

3.3.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce SP SZP
Ve sledovaném období nebyl žádný projekt realizován, tzn. nebyla podána žádná závěrečná zpráva o realizaci projektu.

3.3.2. Plnění indikátorového plánu Programového rámce SP SZP

Ve sledovaném období nebyla ukončena realizace žádného projektu, tzn. že nebyly plněny žádné indikátory Programového rámce SP SZP.

Tabulka 28 – Plnění indikátorového plánu Program. rámce SP SZP uvedeného v SCLLD 21+ v období 2021-2030

Název indikátoru	Plán uvedený v SCLLD 21+	Plnění	
		Celkem 2021 - 2024	%
920251 - Rozvoj hospodářství venkova: Počet venkovských podniků, včetně biohospodářských podniků, čerpajících na rozvoj podporu poskytovanou v rámci SZP (počet podniků)	9	0	0 %
935011 - Propojení evropského venkova: Podíl venkovského obyvatelstva, které využívá výhod lepšího přístupu ke službám a infrastruktuře prostřednictvím podpory poskytnuté v rámci SZP (%)	0,135 % (11.200 obyvatel)	0	0 %
937102 - Modernizace zemědělských podniků: Podíl zemědělských podniků čerpajících investiční podporu na restrukturalizaci a modernizaci, včetně podpory na účinnější využívání zdrojů (%)	0,011 % (3 podniky)	0	0 %
943301 - Investiční podpora pro odvětví lesnictví: Celkové investice v zájmu zlepšení výkonnosti odvětví lesnictví (EUR)	67.000	0	0 %

*Datum cílové hodnoty všech indikátorů je 15.10.2029

3.3.3. Plnění finančního plánu Programového rámce SP SZP

Finanční plán uvedený ve Strategii CLLD 21+ je plněn. A to z důvodu toho, že se při jeho tvorbě neočekávalo, že by některý projekt mohl být proplacen do 15.10.2024.

Tabulka 29 – Plnění finančního plánu Programového rámce OPTAK uvedeného v SCLLD 21+ v období 2021–2024

FINANČNÍ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD 21+ – OBDOBÍ 2021 - 2024						
Opatření	Podpora – příspěvek EU	Podpora – státní rozpočet	Podpora celkem	Vlastní zdroje příjemce	Celkové způsobilé výdaje	Kumulativní % čerpání alokace
LEADER	0	0	0	0	0	0 %
SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ – OBDOBÍ 2021 - 2024						
Opatření	Podpora – příspěvek EU	Podpora – státní rozpočet	Podpora celkem	Vlastní zdroje příjemce	Celkové způsobilé výdaje	Kumulativní % čerpání alokace
LEADER	0	0	0	0	0	0 %
SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI S PLÁNEM – OBDOBÍ 2021 - 2024						
Opatření	Podpora – příspěvek EU	Podpora – státní rozpočet	Podpora celkem	Vlastní zdroje příjemce	Celkové způsobilé výdaje	Kumulativní % čerpání alokace
LEADER	-	-	-	-	-	-

*Veškeré částky jsou v případě Programového rámce SP SZP počítány z proplacených žádostí o platbu do 15.10.2024

Nejbližší finanční milník, který musí MAS Holicko splnit: Do 31.12.2025 je nutné vyhlásit výzvy na min. 50 % alokace (6.728.600,- Kč) a zároveň do 15.10.2025 musí být proplaceno min. 5 % alokace (672.860,- Kč). Pokud se tyto milníky nepodaří splnit, pak hrozí sankce z celkové alokace určené pro území Holicka ve výši 5–50 % (dle výše neplnění).

Pokud vybrané projekty dodrží naplánované termíny pro podání žádostí o platbu, pak by příští rok měly být k 15.10.2025 proplaceny 3 projekty za více jak 761 tis. Kč, čímž bychom měly nastavené milníky splnit.

3.4. Místa realizace podpořených projektů

Následující tabulka uvádí místa realizace podpořených (již proplacených) projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených od začátku realizace Strategie CLLD 21+, tj. od 6.8.2021

Prozatím byl zrealizován pouze 1 projekt z Programového rámce OPTAK.

Tabulka 30 – Místa realizace podpořených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2021–2030

Místo realizace podpořených projektů	Rok 2024	Celkem 2021 - 2030	%
Býšť	0	0	0 %
Dolní Roveň	0	0	0 %
Dolní Ředice	0	0	0 %
Holice	326.461,82 Kč (1 projekt)	326.461,82 Kč (1 projekt)	100 %
Horní Jelení	0	0	0 %
Horní Ředice	0	0	0 %
Chvojenec	0	0	0 %
Jaroslav	0	0	0 %
Nová Ves	0	0	0 %
Ostřetín	0	0	0 %
Poběžovice u Holic	0	0	0 %
Radhošť	0	0	0 %
Trusnov	0	0	0 %
Týništko	0	0	0 %
Uhersko	0	0	0 %
Veliny	0	0	0 %
Vysoké Chvojno	0	0	0 %
Celkem	326.461,82 Kč (1 projekt)	326.461,82 Kč (1 projekt)	100 %

Podpořené projekty ze Strategie CLLD MAS Holicko 2021-2027(2030) dle obcí



Čerpání podpory v Kč k 31.12.2024:

	0 Kč	Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Nová Ves, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Radhošť, Trusnov, Týniště, Uhersko, Veliny a Vysoké Chvojno
	326 461,82 Kč	Holice

Podpořené projekty ze Strategie CLLD MAS Holicko 2021-2027(2030) dle obcí v přepočtu na 1 obyvatele



Čerpání podpory v Kč / 1 obyvatele k 31.12.2024:

	0 Kč	Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Nová Ves, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Radhošť, Trusnov, Týniště, Uhersko, Veliny a Vysoké Chvojno
	48,24 Kč	Holice

3.5. Informace o pokroku v realizaci klíčových projektů

Název klíčového projektu: Holicko – vlídné místo pro život

Programový rámec: OPZ+

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000069

Termíny realizace projektu: 1.4.2023 – 31.3.2026

Realizátor projektu: MAS Holicko, o.p.s.

Partneři projektu: Oblastní charita Pardubice
SKP-CENTRUM, o.p.s.

Celková alokace projektu: 6.996.903,48 Kč, toho

- MAS Holicko – 3.842.086,48 Kč
- Oblastní charita Pardubice – 1.040.288,-Kč
- SKP-CENTRUM, o.p.s. – 2.114.529,-Kč

Popis pokroku v realizaci v roce 2024:

V rámci sledovaného období došlo k podstatným změnám v aktivitě Psychologická a duchovní podpora rodinám pečujícím o paliativní pacienty v domácím prostředí, kterou zajišťuje partner Oblastní charita Pardubice. V aktivitě se dlouhodobě nedaří čerpat přímé náklady na psychologa. Došlo k výraznému neplnění indikátorového plánu na této aktivitě a bylo přistoupeno s účinností od 1.9.2024 k přesunu finančních prostředků (356.800,-Kč) z položky psycholog. Částka 214.000,-Kč byla přesunuta na zajištění rozšíření otevírací doby Komunitního klubu pro mládež, který zajišťuje partner SKP-CENTRUM, o.p.s. Klub je od září nově otevřen na dva dny v týdnu. Částka 142.800,-Kč byla přesunuta na zvýšení úvazku pro sociálního pracovníka MAS Holicko (z 0,3 na 0,5 úvazku). Pracovník nově zajišťuje podporu mezioborové spolupráce pro ohrožené rodiny s dětmi.

V rámci aktivity Poradenství a edukace, kterou zajišťuje partner Oblastní charita Pardubice, došlo s účinností od 18.6.2024 k rozšíření aktivity o edukační besedy pro veřejnost. Je to opět opatření pro plnění indikátorového plánu.

Ve sledovaném období byly podány dvě monitorovací zprávy a čtyři žádosti o změnu.

Plnění indikátorového plánu:

V rámci sledovaného období pokračují všechny aktivity projektu. Postupně se plní indikátory 600 000 a 670 102, jedná se o počet podpořených osob, které poskytly osobní údaje. Nejhůře plněným indikátorem je 670 102, který je naplněn na 44,9 %. Pro minimalizaci rizika neplnění, byly partnerem Oblastní charita Pardubice zapojeny edukační besedy, které se konají v jednotlivých obcích a které mají zvýšit počet podpořených osob.

Indikátory 551 022 (Komunitní klub pro mládež v Holicích a Komunitní klub pro seniory v Horním Jelení), 670 021 (kapacita podpořených komunitních klubů – 45 osob) a 670 031 (sociální pracovník v úvazku 0,3, komunitní pracovník v úvazku 0,2, sociálně zdravotní konzultant v úvazku 0,5, duchovní v úvazku 0,15, psycholog v úvazku 0,15, komunitní pracovník v úvazku 0,072 a psychoterapeut v úvazku 0,3) jsou naplno plněny již od počátku realizace projektu.

Zpracování navazujícího komunitního plánu je plánované až na rok 2025 (805 000).

Tabulka 31 – Plnění indikátorového plánu Program. rámce OPZ+ uvedeného v SCLLD 21+ v období 2021-2030

Název indikátoru	Plán uvedený v SCLLD 21+	Plnění	
		Celkem 2021 - 2024	%
551022 - Počet podpořených komunitních aktivit (aktivity)	2	2	100 %
600000 - Celkový počet účastníků	40	24	60,00 %
670021 - Kapacita podpořených služeb - místa	45	45	100 %
670031 - Kapacita podpořených služeb – personál (úvazky)	1,672	1,672	100 %
670102 - Využívání podpořených služeb (osoby)	911	409	44,90 %
805000 - Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	1	0	0 %

*Datum cílové hodnoty všech indikátorů je 31.3.2026

Plnění finančního plánu:

Finanční plán uvedený ve Strategii CLLD 21+ není plněn z důvodu zpoždění realizace některých aktivit v projektu již z roku 2023. Dalším důvodem je nečerpání pozice psychologa v rámci KA: Psychologická a duchovní podpora rodinám pečujícím o paliativní pacienty v domácím prostředí. Již v roce 2024 byla učiněna opatření pro minimalizaci rizik neplnění.

Tabulka 32 – Plnění finančního plánu Programového rámce OPZ+ uvedeného v SCLLD 21+ v období 2021–2024

FINANČNÍ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD 21+ – OBDOBÍ 2021 - 2024						
Opatření	Podpora – příspěvek EU	Podpora – státní rozpočet	Podpora celkem	Vlastní zdroje příjemce	Celkové způsobilé výdaje	Kumulativní % čerpání alokace
Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny	2.738.227,68Kč	830.193,09Kč	3.568.420,77Kč	0	3.568.420,77Kč	51,00 %
SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ – OBDOBÍ 2021 - 2024						
Opatření	Podpora – příspěvek EU	Podpora – státní rozpočet	Podpora celkem	Vlastní zdroje příjemce	Celkové způsobilé výdaje	Kumulativní % čerpání alokace
Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny	2.054.215,66Kč	622.810,01Kč	2.677.025,67Kč	0	2.677.025,67Kč	38,26 %
SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI S PLÁNEM – OBDOBÍ 2021 - 2024						
Opatření	Podpora – příspěvek EU	Podpora – státní rozpočet	Podpora celkem	Vlastní zdroje příjemce	Celkové způsobilé výdaje	Kumulativní % čerpání alokace
Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny	- 684.012,02Kč	- 207.383,08Kč	- 891.395,10Kč	-	- 891.395,10Kč	- 12,74%

*Veškeré částky jsou v případě Programového rámce OPZ+ počítány z podaných žádostí o platbu do 31.12.2024

3.6. Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo Programové rámce

Ihned po ukončení sledovaného období bylo provedeno šetření na území Holicka o naplňování cílů strategie CLLD MAS Holicko, které si stanovila MAS mimo Programové rámce IROP, OPTAK, SPZP a OPZ+.

V polovině 1/2025 byli osloveni všichni starostové obcí z územní působnosti MAS, členové MAS a další aktéři z území, jež má MAS ve své adresáři se žádostí o vyplnění údajů do vytvořeného dotazníku. Ten byl zaměřen na zjištění počtu projektů, které se na Holicku ve sledovaném období realizovaly. Mohlo se jednat o projekty realizované z evropských fondů, národních dotací, dotací Pardubického kraje nebo i třeba z vlastních zdrojů.

Protože návratnost dotazníků byla malá (odpovědělo pouze 24 respondentů), tak kancelář MAS zjišťovala informace o realizovaných projektech ještě na těchto portálech:

- <https://www.szif.cz/cs/seznam-prijemcu-dotaci>
- <https://www.hlidacstatu.cz/Dotace>

Na základě údajů z těchto zdrojů můžeme tedy usuzovat, že indikátory jsou plněny na 41,64 %, což je odpovídající, pokud vezmeme v potaz, že realizace Strategie CLL21+ bude probíhat až do roku 2030 (téměř polovina programovacího období).

V rámci **strategického cíle 1. PRESTIŽNÍ REGION** jsme na cca 43 % plnění indikátorů. Ve sledovaném roce bylo nejvíce zrealizovaných projektů z opatření zaměřených na volnočasové aktivity (18), školství (16) a veřejná prostranství (13). Naopak nejméně projektů je z opatření dopravní infrastruktura (1) a sociální služby (2). Žádný projekt zrealizovaný v roce 2024 se netýkal zlepšení dohledu nad veřejným pořádkem a dopravní obslužnosti.

Opatření: 1.1.1 Veřejné budovy a veřejná prostranství – Vyhlášena výzva MAS Holicko č.1-SP SZP v rámci, které nebyl vybrán žádný projekt z této oblasti. Je plánována ale ještě výzva č.2-SP SZP (alokace 3.659.667,-Kč), kam se projekty tohoto zaměření budou moci hlásit.

Opatření: 1.1.2 Komunitní služby a vybavenost obcí – Vyhlášeny již 3 výzvy MAS Holicko z Programového rámce OPTAK v rámci, kterých byly vybrány 2 projektové záměry z oblasti zdravotnictví (dotace 540.194,32 Kč). Jeden z těchto projektů ve sledovaném období ukončil realizaci a podal ŽoP (dotace 326.461,82 Kč).

Opatření: 1.1.3 Školství, zájmové a celoživotní vzdělávání – Realizace projektu MAP 4 pro ORP Holice (dotace: 5.099.763,20Kč). Vyhlášena výzva MAS Holicko č.1-SP SZP v rámci, které byly vybrány 4 projekty z této oblasti (dotace 1.293.853,-Kč). Dále plánována ještě výzva č.2-SP SZP (alokace 3.659.667,-Kč), kam se projekty tohoto zaměření budou moci opět hlásit. Krom toho v roce 2024 díky dotaci z Pardubického kraje probíhala doprava žáků ZŠ a SŠ do vzdělávacích center v Pardubickém kraji (dotace 132.000,-Kč z Pardubického kraje, celková výše projektu 190.100,-Kč).

Opatření: 1.1.4 Sociální služby a zapojení znevýhodněných skupin občanů – Probíhá realizace vybraného klíčového projektu výstavby centra sociálních služeb – ambulantní odlehčovací služby (dotace: 22.573.424,-Kč), který realizuje Oblastní charita Pardubice. Dále MAS Holicko od 1.4.2023 realizuje v rámci Programového rámce OPZ+ klíčový projekt s názvem "Holicko – vlídné místo pro život" s celkovou alokací 6.996.903,48 Kč (podpora rodin, neformálních pečujících, aktivní začleňování seniorů, zvýšení informovanosti o sociální oblasti v území, podpora partnerství a spolupráce subjektů ze sociální oblasti, zlepšení sociální práce na obcích a komunitní plánování v území).

Opatření: 1.2.1 Volnočasové aktivity a spolkový život – Vyhlášena výzva MAS Holicko č.1-SP SZP v rámci, které byly vybrány 3 projekty z této oblasti (dotace 2.003.680,- Kč). Dále plánována ještě výzva č.2-SP SZP (alokace 3.659.667,-Kč), kam se projekty tohoto zaměření budou moci opět hlásit. MAS Holicko také každý měsíc vydává kalendář akcí pro celý region "Kam na Holicku...".

Specifický cíl: 1.3 Zlepšením stavu technické a dopravní infrastruktury a koncepční obslužnosti území na celém území regionu vyrovnat disparity mezi obcemi – Finanční potřebnost tohoto specifického cíle je nad finanční možnosti MAS Holicko. Z tohoto důvodu zapojení MAS spočívá pouze ve vyhledávání potencionálních finančních zdrojů a následném informování obcí z území MAS.

Specifický cíl: 1.4 Pomocí prevence posílit bezpečnost života v obcích – Finanční potřebnost tohoto specifického cíle je nad finanční možnosti MAS Holicko. Z tohoto důvodu zapojení MAS spočívá pouze ve vyhledávání potencionálních finančních zdrojů a následném informování obcí z území MAS.

Tabulka 33 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD 21+ mimo Programové rámce k 31.12.2024 – Strategický cíl: 1.PRESTIŽNÍ REGION

Název opatření /indikátoru	Plán uvedený v SCLLD 21+	Plnění		
		Rok 2024	Celkem 2021 - 2024	%
Opatření: 1.1.1 Veřejné budovy a veřejná prostranství				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	60	13	36	60,00 %
Opatření: 1.1.2 Komunitní služby a vybavenost obcí				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	10	7	16	160,00 %
Opatření: 1.1.3 Školství, zájmové a celoživotní vzdělávání				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	100	16	38	38,00 %
Opatření: 1.1.4 Sociální služby a zapojení znevýhodněných skupin občanů				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	30	2	13	43,33 %
Opatření: 1.2.1 Volnočasové aktivity a spolkový život				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	150	18	42	28,00 %
Opatření: 1.3.1 Technická infrastruktura				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	20	9	21	105,00 %
Opatření: 1.3.2 Dopravní infrastruktura				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	30	1	9	30,00 %
Opatření: 1.3.3 Dopravní dostupnost a obslužnost				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	5	0	2	40,00 %
Opatření: 1.4.1 Bezpečnost silničního provozu				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	30	4	7	23,33 %
Opatření: 1.4.2 Dohled nad veřejným pořádkem				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	5	0	0	0 %
Opatření: 1.4.3 Protipovodňová a požární prevence				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	20	7	14	70,00 %
Počet realizovaných projektů v rámci Strategického cíle 1.PRESTIŽNÍ REGION celkem	460	77	198	43,04 %

V rámci **strategického cíle 2. PROSPERUJÍCÍ REGION** jsme na cca 42 % plnění indikátorů. Oznámené zrealizované projekty ve sledovaném roce 2024 byly z opatření zaměřených na zemědělské podnikání (3), podporu regionálních produktů (3) a nezemědělské podnikání (6). Naopak žádný projekt se netýkal lesního hospodaření a opatření na podporu zaměstnanosti.

Specifický cíl: 2.1 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v regionu – Vyhlášeny již 3 výzvy MAS Holicko-OPTAK v rámci, kterých byly vybrány 2 projektové záměry zaměřené na podporu malých a středních podniků (dotace 859.805,68 Kč). Také byla vyhlášena výzva MAS Holicko č.1-SP SZP v rámci, které byly vybrány další 4 projekty z této oblasti (dotace 1.160.000,-Kč). Dále je plánována ještě výzva č.2-SP SZP (alokace 3.840.000,-Kč), kam se projekty tohoto zaměření budou moci opět hlásit. Dále MAS Holicko společně s MAS Region Kunětické hory, MAS Bohdanečsko a městem Pardubice podporuje místní regionální producenty prostřednictvím značky KRAJ PERNŠTEJNŮ - regionální produkt. Certifikovaní výrobci se již druhým rokem mohli účastnit výzvy "Kreativní vouchery pro KRAJ PERNŠTEJNŮ" (alokace cca 110.000,-Kč) v rámci, které mohli získat až 20 tis. Kč na zlepšení marketingu.

Opatření: 2.2.1 Zaměstnanost – Z kapacitních důvodů toto opatření prozatím není řešeno prostřednictvím MAS Holicko.

Tabulka 34 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD 21+ mimo Programové rámce k 31.12.2024 – Strategický cíl: 2.PROSPERUJÍCÍ REGION

Název opatření	Plán uvedený v SCLLD 21+	Plnění		
		Rok 2024	Celkem 2021 - 2024	%
Opatření: 2.1.1 Podnikání, služby a řemesla				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	30	2	6	20,00 %
Opatření: 2.1.2 Zemědělské podnikání				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	30	3	14	46,67 %
Opatření: 2.1.3 Lesní hospodaření				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	10	0	7	70,00 %
Opatření: 2.1.4 Regionální produkty				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	5	3	7	140,00 %
Opatření: 2.2.1 Zaměstnanost				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	10	0	2	20,00 %
Počet realizovaných projektů v rámci Strategického cíle 2.PROSPERUJÍCÍ REGION celkem	85	8	36	42,35 %

V rámci **strategického cíle 3. PŘITAŽLIVÝ REGION** jsme na 40 % plnění indikátorů. Oznámené zrealizované projekty byly z opatření zaměřených na propagaci regionu (2), infrastrukturu cestovního ruchu (1) a cykloturistiku (1). Žádný projekt se dosud netýkal venkovské turistiky.

Specifický cíl: 3.1 Vytvoření potřebného zázemí pro rozvoj cestovního ruchu – Vyhlášena výzva MAS Holicko č.1-SP SZP v rámci, které nebyl vybrán žádný projekt z této oblasti. Je plánována ale ještě výzva č.2-SP SZP (alokace 3.340.000,-Kč), kam se projekty tohoto zaměření budou moci hlásit. Dále MAS Holicko společně s MAS Region Kunětické hory, MAS Bohdanečsko a městem Pardubice jsou jedním ze zakladatelů turistické oblasti Pardubicko (od 2017), proto veškeré marketingové aktivity a spolupráce v cestovním ruchu probíhá převážně přes tuto organizaci.

Opatření: 3.2.1 Propagace regionu – I v tomto opatření je využívána činnost turistické oblasti Pardubicko, dále zde probíhá spolupráce s Kulturním domem v Holicích (informační centrum). A navíc je tento specifický cíl zahrnutý i do šetření v rámci Fiche 7 Programového rámce SP SZP. Krom toho v roce 2024 byla vydána publikace "Holicko – pověsti a povídky" (dotace 200.000,-Kč z Pardubického kraje, celková výše projektu 288. 216,-Kč).

Tabulka 35 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD 21+ mimo Programové rámce k 31.12.2024 – Strategický cíl: 3.PŘITAŽLIVÝ REGION

Název opatření	Plán uvedený v SCLLD 21+	Plnění		
		Rok 2024	Celkem 2021 - 2024	%
Opatření: 3.1.1 Infrastruktura pro cestovní ruch				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	10	1	7	70,00 %
Opatření: 3.1.2 Venkovská turistika				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	5	0	0	0 %
Opatření: 3.1.3 Cykloturistika				

Název opatření	Plán uvedený v SCLLD 21+	Plnění		
		Rok 2024	Celkem 2021 - 2024	%
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	5	1	2	40,00 %
Opatření: 3.2.1 Propagace regionu				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	10	2	3	30,00 %
Počet realizovaných projektů v rámci Strategického cíle 3.PŘÍTAŽLIVÝ REGION celkem	30	4	12	40,00 %

V rámci **strategického cíle 4. PŘÍVĚTIVÝ REGION** jsou indikátory naplňovány na téměř 37 %. Oznámené zrealizované projekty byly z opatření zaměřených na udržitelné nakládání s přírodními zdroji (8), venkovskou krajinu (1) a hospodaření s odpady (1). Žádný projekt zrealizovaný v roce 2024 neřešil vodu v krajině.

Specifický cíl: 4.1 Přívětivá a udržovaná krajina, atraktivní pro místní obyvatele i turisty – Je plánována výzva č.2-SP SZP (alokace 500.000,-Kč), kam se projekty tohoto zaměření budou moci hlásit. Navíc je tento specifický cíl je zahrnutý i do šetření v rámci Fiche 7 Programového rámce SP SZP.

Opatření: 4.2.1 Efektivní nakládání s odpady – Finanční potřebnost tohoto opatření je nad finanční možnosti MAS Holicko. Z tohoto důvodu zapojení MAS spočívá pouze ve vyhledávání potencionálních finančních zdrojů a následném informování obcí z území MAS.

Opatření: 4.2.2 Udržitelné nakládání s přírodními zdroji – K 31.12.2024 jsme zaregistrovali již 233 žádostí do NZÚ Light (požadovaná dotace 29.105.379,-Kč). Dále spolupracujeme se svazkem obcí Holicka na vzniku Místní energetické koncepce pro celý region.

Tabulka 36 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD 21+ mimo Programové rámce k 31.12.2024 – Strategický cíl: 4.PŘÍVĚTIVÝ REGION

Název opatření	Plán uvedený v SCLLD 21+	Plnění		
		Rok 2024	Celkem 2021 - 2024	%
Opatření: 4.1.1 Venkovská krajina				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	15	1	2	13,33 %
Opatření: 4.1.2 Voda v krajině				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	10	0	4	40,00 %
Opatření: 4.2.1 Efektivní nakládání s odpady				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	20	1	2	10,00 %
Opatření: 4.2.2 Udržitelné nakládání s přírodními zdroji				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	20	8	16	80,00 %
Počet realizovaných projektů v rámci Strategického cíle 4.PŘÍVĚTIVÝ REGION	65	10	24	36,92 %

V rámci **strategického cíle 5. PŘÁTELSKÝ REGION** jsou indikátory naplňovány na 30 %. Ve sledovaném období bylo uzavřeno partnerství mezi MAS Holicko a MAS Nad Orlicí z důvodu realizace projektu zaměřeného na mobilitu škol do vzdělávacích center Pardubického kraje.

Opatření: 5.1.1 Partnerská spolupráce – Probíhá předběžná konzultace projektových záměrů a zjišťování jejich vhodnosti zařazení do Fiche 7 Programového rámce SP SZP. Krom toho partnerská spolupráce probíhala i při přípravě publikace "Holicko – pověsti a povídačky" (spolupráce MAS, obcí a

ZUŠ), při tvorbě Místní energetické koncepce (spolupráce MAS a obcí) nebo při realizaci projektu MAP 4 (spolupráce škol a zřizovatelů). Dále v území spolupracovaly obce v rámci Dobrovolného svazku obcí Holicka na realizaci zábavních prvků pro akce na Holicku a MŠ Chvojenec navázala spolupráci s místními hasiči.

Tabulka 37 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD 21+ mimo Programové rámce k 31.12.2024 – Strategický cíl: 5.PŘÁTELSKÝ REGION

Název opatření / indikátoru	Plán uvedený v SCLLD 21+	Plnění		
		Rok 2024	Celkem 2021 - 2024	%
Opatření: 5.1.1 Partnerská spolupráce				
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	30	6	9	30,00 %
Počet vytvořených partnerství v rámci regionu MAS Holicko	5	0	1	20,00 %
Počet vytvořených partnerství s aktéry mimo území MAS Holicko	5	1	1	20,00 %
Počet realizovaných projektů v rámci Strategického cíle 5.PŘÁTELSKÝ REGION celkem	30	6	9	30,00 %

3.7. Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie

V rámci **opatření 1.1.4 Sociální služby a zapojení znevýhodněných skupin občanů** běží od 4/2023 realizace klíčového projektu MAS (Programový rámec OPZ+) s názvem "Holicko – vlídné místo pro život". Tento projekt je mimo jiné zaměřen i na podporu rodin, neformálních pečujících a seniorů. Na stejné opatření byla navázána i výzva MAS Holicko č.1-IROP v rámci, které byl vybrán projektový záměr na stavbu centra sociálních služeb – ambulantní odlehčovací služby (dotace: 22 573 424,-Kč). Zde jsou opět cílovými skupinami neformální pečující, senioři a osoby s postižením. Společným cílem obou těchto projektů je pomoci rodinám starat se o své příbuzné co nejdéle v domácím prostředí. Poskytnout služby nejen samotným seniorům a osobám s postižením, ale i jejich rodinám (neformálním pečujícím).

Díky klíčovému projektu OPZ+ neformální pečující a senioři získají podporu již teď, a to především díky zlepšení sociální práce na obcích, poskytování poradenství, edukace a psychologické a duchovní podpoře. Tento projekt je tříletý a bude probíhat minimálně do 3/2026. Plynule tedy na jeho výstupy naváže právě stavba centra sociálních služeb (projekt podpořený z výzvy č.1-IROP), které by mělo být hotové v první polovině roku 2026.

Realizace obou projektů byla plánována a projednávána v rámci komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Holice, kde k jednomu stolu zasedli jak poskytovatelé sociálních služeb, starostové obcí, a i zástupci cílových skupin (uživatelé sociálních služeb). Díky tomu došlo k jednomyslnému rozhodnutí na valné hromadě MAS – realizovat klíčový projekt OPZ+ a finance z Programového rámce IROP nedrobit, naopak celý finanční balíček ve výši 22,5 mil. Kč smysluplně využít na jeden společný klíčový projekt, jehož výstupy budou přínosem pro všechny obyvatele Holicka.

Potřebnost odlehčovací služby a příkladná spolupráce obcí na Holicku zaujala i samotný Pardubický kraj, jež souhlasil s rozšířením sítě sociálních služeb v kraji a pomůže tak obcím s financováním následného provozu centra. Město Holice jako jeden z iniciátorů samotné idey, šlo v tomto ještě o něco dál. Oblastní charita Pardubice darovalo pozemek, kde bude toto centrum stát. A u toho to ještě

neskončilo – firma Wienerberger Holice darovala část stavebního materiálu, který pomůže pokrýt rozdíl mezi celkovými výdaji projektu a získanou dotací.

V rámci **opatření 1.1.3 Školství, zájmové a celoživotní vzdělávání** dochází ke vzájemnému doplňování výstupů 2 klíčových projektů, jež realizuje MAS Holicko. Projekty MAP a "Holicko – vlídné místo pro život" (Programový rámec OPZ+) se navzájem doplňují tím, že spojují podporu škol a řešení problémů rodin.

MAP dlouhodobě spolupracuje se školami (od 6/2016) a pomáhá zlepšovat vzdělávání na Holicku, což projektu OPZ+ usnadňuje přístup do škol a spolupráci s vedením škol/učiteli. OPZ+ se zaměřuje na pomoc rodinám, aby jejich těžká situace co nejméně ovlivnila děti a jejich školní výsledky. Zároveň vytváří nástroje pro prevenci, jako např. komunitní klub pro mládež. Díky propojení obou projektů se daří lépe identifikovat děti, které potřebují pomoc, a zároveň poskytovat komplexní podporu rodinám i školám. Společně tak oba projekty vytvářejí síť pomoci, která efektivně propojuje školy, rodiny a odborníky.

V rámci **opatření 4.2.2 Udržitelné nakládání s přírodními zdroji** se snažíme komplexně řešit energetické úspory a obnovitelné zdroje energie na Holicku. K tématu jsme přistupovali nejprve opatrně. Několik let nazpět jsme organizovali různá školení a exkurze, než nazrál ten správný čas i pro náš region.

Od roku 2023 již aktivně pomáháme nízkopříjmovým domácnostem z Holicka získat dotaci z Nová zelená úsporám Light na zateplení svých rodinných domů a solární ohřev vody. Od té doby jsme pomohli získat více jak 29 mil. Kč pro 233 domácností z Holicka. Dalším krokem bylo proškolení 2 manažerek MAS a získání certifikátu "Energetický koordinátor MAS". Tím jsme získali základní technický přehled o způsobu řešení energetických úspor a komunitní energetice a jsme schopni poskytovat v této oblasti základní poradenství a koordinovat energetické projekty v území. To vše prozatím zastřešila právě běžící spolupráce s Dobrovolným svazkem obcí Holicka na tvorbě Místní energetické koncepce, která by se měla stát nástrojem a návodem pro energetický management všech obcí v regionu. Na ni již budou jistě navazovat další projekty řešící energetiku v jednotlivých obcích (zateplování, modernizace osvětlení, výměna kotlů, FVE, komunitní energetika, ...)

Další téma, které MAS Holicko intenzivně v regionu rozvíjí se dotýká naráz 3 opatření: opatření 1.1.3 Školství, zájmové a celoživotní vzdělávání, opatření 3.2.1 Propagace regionu a opatření 5.1.1 Partnerská spolupráce. Od roku 2022 se totiž aktivně věnujeme **podpoře regionální identity, souměřitosti a hodnotovému zakotvení obyvatel Holicka**. Aby lidé, kteří v regionu bydlí, ale i děti, kteří zde vyrůstají, byli hrdí na to, že jsou z Holicka.

V rámci této aktivity jsme již vydaly 2 regionální publikace: "Holicko – osobnosti známé i neznámé" a "Holicko – pověsti a povídky". Do jejich tvorby byly zapojeny i partneři z území (obce, školy). V roce 2023 byla vytvořena síť nově vysazených stromů v regionu MAS Holicko jako symbolická připomínka patnáctileté spolupráce v regionu dle metody LEADER, která stojí na partnerství subjektů v území a společném plánování. V každé členské obci tak byly vysazeny 1-2 stromy. Dále na tyto aktivity bude v rámci klíčového projektu MAP navazovat vydání regionální učebnice (právě probíhá její příprava).

3.8. Horizontální principy

Strategie CLLD MAS Holicko nemá negativní vliv na žádné z horizontálních témat. Jednotlivé specifické cíle a opatření budou naplňovány dílčími projekty zohledňujícími požadavky na horizontální témata

(Udržitelný rozvoj, Rovné příležitosti a zákaz diskriminace a Rovnost mezi muži a ženami). Povinností konečných žadatelů bude zajištění alespoň neutrálního vztahu k daným tématům.

4. Animace strategie CLLD 21+

Animační aktivity MAS jsou všechny činnosti MAS v rámci SCLLD 21+, které nezahrnují vyhlášení výzev a administraci projektů konečných žadatelů/příjemců. Jedná se především o používané komunikační strategie a z nich vycházející komunikační aktivity, které slouží k informování veřejnosti o SCLLD 21+, dále k přenosu informací ke konkrétním žadatelům či zájemcům o podání žádosti o podporu v rámci SCLLD 21+, podpoře žadatelů při realizaci svých projektů či nastavení celkových procesů toku informací mezi všeobecnou veřejností, zájemci, žadatelem a dalšími aktéry na území.

V roce 2024 byly uspořádány 2 semináře pro potenciální žadatele k výzvě č.1 – SP SZP, bohužel pouze na 1 z nich přišli potenciální žadatelé konzultovat své projektové záměry (13.6.2024 – Dolní Ředice).

Tabulka 38 – Počet realizovaných informačních seminářů pro žadatele

	Rok 2024	Celkem 2021-2024
Realizované informační semináře pro žadatele	1	3

Mimoto byly také uspořádány konzultační dny pro potenciální žadatele k výzvě č.2 a 3 – OPTAK, ale z důvodu nezájmu žadatelů nemohly být do indikátoru započítány.

4.1. Propagace strategie CLLD 21+

Ve sledovaném období bylo cílem informovat území o tom, že MAS Holicko realizuje SCLLD 21+ a také všechny potenciální předkladatele projektů seznámit se zaměřením jednotlivých opatření a s pravidly administrace. Pro toto období byly voleny následující prostředky propagace:

- **Roll-up** o realizaci SCLLD 21, který si MAS Holicko nechala vyrobit ve sledovaném období.
- **Webové stránky** (www.holicko.cz) a **facebook** (<https://www.facebook.com/mas.holicko>) MAS Holicko – informace o připravovaných a právě vyhlášených výzvách a realizovaných akcích v rámci SCLLD 21+.
- **Zpravodaj MAS Holicko** (duben, srpen a prosinec 2024) – informace o připravovaných a právě vyhlášených výzvách a realizovaných akcích v rámci SCLLD21+. Distribuce probíhá prostřednictvím partnerů MAS a obecních úřadů na území MAS a dále na webu a facebooku MAS.
- **Výroční zpráva MAS Holicko** za rok 2023 – zveřejnění výsledků, kterých bylo za příslušný rok dosaženo.
- **Tiskové zprávy** – krátké přehledné informace zveřejněné zejména na facebooku, ale i v místních zpravodajích nebo na letáčcích, jež jsou pojmenovány jako **Maskoviny** (avíza výzev, vybrané projekty, apod.).

- **Rozesílání důležitých informací do e-mailových schránek** partnerům MAS, klíčovými aktéry z území MAS a všem subjektům, které má MAS v adresáři – informace o vyhlášení výzvy a jejich důležitých milnících (např. přijaté žádosti o podporu, schválené žádosti o podporu, apod.).
- **Účast na regionálních akcích** – Holické městské slavnosti (21.6.2024) – prezentace realizace SCLLD 21+ na Holicku.
- **Pořádání valných hromad MAS Holicko, které byly veřejně přístupné** (28.5.2024 a 4.12.2024) – Zde byli přítomni informováni o průběhu realizace CLLD.

Prozatím nebyly využity nástroje jako propagační předměty a letáky. Důvodem byl nedostatek financí v rámci 1. etapy provozní dotace MAS. Proto všechny tyto nástroje budou vytvořeny počátkem roku 2025 – v rámci 2. etapy provozní dotace.

4.2. Podpora žadatelů

Telefonické, e-mailové a osobní konzultace s pracovníky MAS. – Konečným žadatelům, resp. příjemcům je poskytnuta podpora ze strany pracovníků MAS. Žadatelům jsou zprostředkovávány přes pracovníky MAS informace z řídicích orgánů a naopak. Na druhou stranu pracovníci MAS u příjemců zjišťují informace o průběhu realizace projektu a reagují na možné problémy.

Příručky pro žadatele – Manažerky MAS zpracovaly pro každé vyhlášené opatření samostatnou Příručku pro žadatele. V nich žadatel najde informace, jak vyplnit projektový záměr, seznam povinných a nepovinných příloh, seznam způsobilých a nezpůsobilých výdajů, kritéria hodnocení a další důležité informace související se zpracováním projektů. Příručky jsou zveřejněny vždy u konkrétní výzvy nebo jsou rozdávány vytištěné na seminářích pořádaných MAS.

Pořádání seminářů a konzultačních dnů pro žadatele v rámci vyhlášené výzvy – V rámci výzvy č. 1 – SP SZP byly uspořádány 2 semináře pro potenciální žadatele k výzvě č.1 – SP SZP, bohužel pouze na 1 z nich přišli potenciální žadatelé konzultovat své projektové záměry (13.6.2024 – Dolní Ředice). Mimoto byly také uspořádány konzultační dny pro potenciální žadatele k výzvam č.2 a 3 – OPTAK, ale potenciální žadatelé nakonec konzultovali své projektové záměry s manažerkami MAS mimo tyto konzultační dny.

4.3. Vzdělávání zaměstnanců a partnerů MAS

Ve sledovaném období se manažerky MAS zúčastnily **34 školení (workshopy, semináře, konference, exkurze, webináře,....) věnovaných realizaci CLLD:**

- Seminář „Umění prezentace“ dne 16.1.2024 pořádaný městem Česká Třebová a Koalicí nevládek Pardubicka v České Třebové,
- Seminář „Sociální práce ve venkovských oblastech“ dne 16.1.2024 pořádaný ŘO OPZ+ a NS MAS ČR,
- Školení „Metody komunitní práce“ ve dnech 18.-19.1.2024, 16.-17.2024 a 29.2.-1.3.2024 pořádaný organizací Rosteam v Praze,
- Seminář „Změna pro děti: Výzvy a příležitosti systému ochrany dětí a podpory rodin“ pořádaný MPSV a Pardubickým krajem dne 23.1.2024 v Pardubicích,
- Webinář „Pravidla pro konečné žadatele intervence 52.77 – LEADER“ dne 21.2.2024 pořádaný Ministerstvem zemědělství,

- Kulatý stůl „Rodinná politika na obcích“ dne 21.2.2024 pořádaný Pardubickým krajem,
- Online konzultační den OPTAK pro podnikatele z Pardubického kraje dne 27.2.2024 pořádaný API,
- Seminář „Zpětná vazba“ dne 23.2.2024 pořádaný městem Česká Třebová a Koalicí nevládek Pardubicka v České Třebové,
- Školení „Koordinace sociální ochrany v praxi – case management“ ve dnech 4.-5.3.2024, 25.-26.3.2024 a 27.3.2024 pořádané MPSV v Hradci Králové,
- Online seminář pro příjemce v OPTP 2021 – 2027 – výzvy č.3 – priorita 2 – MAS dne 10.4.2024 pořádaný NS MAS,
- Online Přípravný seminář k tématu „Ohrožené rodiny s dětmi“ dne 16. 4. 2024 pořádaný ŘO OPZ+ a NS MAS ČR,
- Seminář „Ohrožené rodiny s dětmi“ dne 29.4.2024 pořádaný ŘO OPZ+ a NS MAS ČR v Dobříši,
- Konference „Rodina a současnost“ dne 15.5.2024 pořádaná Pardubickým krajem v Pardubicích,
- Konference „Pro moderní Česko“ dne 17.5.2024 pořádaná Svazem moderní energetiky v Pardubicích,
- Setkání Kraje Pernštějnů 2024 dne 22.5.2024 pořádané MAS Region Kunětické hory, z.s. v Sezemicích,
- Seminář „Brandbuilding“ dne 23.5.2024 pořádaný Koalicí nevládek Pardubicka v Pardubicích,
- Kurz „Krizová intervence – práce s dětmi“ 29.-30.5.2024 pořádaný organizací Remedium v Praze,
- Konference LeaderFEST 5.-7.6.2024 pořádaný NS MAS v Harrachově,
- Konference „Systémové ukotvení prevence v podpoře ohrožených dětí“ dne 12.6.2024 pořádaná organizací SOFA v Praze,
- Navazující kurz EnKoMAS 27.-28.8.2024 pořádaný NS MAS v Hradci nad Moravicí,
- Seminář „Google Workspace“ dne 19.9.2024 pořádaný Koalicí nevládek Pardubicka v Pardubicích,
- Kurz „Místní energetická koncepce“ 25.-26.9.2024 pořádaný KS MAS Ústeckého kraje ve Varnsdorfu,
- Seminář „Wellbeing“ dne 15.10.2024 pořádaný Koalicí nevládek Pardubicka v Pardubicích,
- Kazuistický seminář „Sociální práce na školách“ dne 16.10.2024 pořádaný Asociací sociálních pedagogů v Praze,
- Seminář „Jak na akce, slavnosti a festivaly“ dne 21.10.2024 pořádaný Pardubicko – perníkové srdce Čech v Pardubicích,
- Setkání aktérů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Pardubického kraje 24.-25.10.2024 pořádaný CSV v Bystrém,
- Online webinář k Pravidlům pro projekty spolupráce 52.77 LEADER dne 6.11.2024 pořádaný SZIF,
- Tematický den „Podpora komunitně vedeného místního rozvoje v místních akčních skupinách v ČR“ dne 8.11.2024 pořádaný NS MAS v Praze,
- Webinář „Pravidla pro konečné žadatele intervence 52.77 – LEADER“ dne 20.11.2024 pořádaný SZIF,
- Konference k mezioborové spolupráci dne 21.11.2024 pořádaný organizací SOFA v Olomouci,
- Celostátní školení pro sociální pedagogy 28.-29.11.2024 pořádané Asociací sociálních pedagogů a nadací Sirius v Praze,

- Tematický den „Projekty spolupráce a 20 let MASEk v EU“ dne 9.12.2024 pořádaný NS MAS v Praze,
- Webinář „První základní informace k redesignu programů NZÚ pro RD a NZÚ Light“ dne 10.12.2024 pořádaný SFŽP,
- Partnerské setkání místních akčních skupin a Celostátní sítě pro venkov NUTS 2 Severovýchod 11.-12.12.2024 pořádaný CSV v Hradci Králové.

Dále ve sledovaném období probíhala **výměna zkušeností a poznatků**, a to především v rámci Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje. Obsahem společných setkání byly nejen informace z výboru a pracovních skupin NS MAS ČR, ale i informace k přípravě a zkušenostem z vyhlášení výzev MAS, příprava Strategie CLLD 2021-2027 nebo výměna informací se zástupci Pardubického kraje nebo CSV.

- 10.1.2024 Letohrad,
- 25.1.2024 Bystré,
- 19.3.2024 Hlinsko,
- 15.5.2024 Svitavy,
- 3.9.2024 Jevíčko,
- 13.11.2024 Rosice u Chrudimi.

5. Informace o problémech a rizicích v průběhu realizace strategie CLLD 21+

5.1. Informace o problémech, které se vyskytly v průběhu realizace SCLLD 21+ a přijatá opatření

1. **Problém: Programový rámec OPTAK – nezájem území, vyřazování předem zkonzultovaných projektových záměrů API – hrozba neplnění finančního milníku**

Podmínky výzev OPTAK jsou složité pro malé podnikatele, takže jejich záměry vyřazujeme již při prvotních konzultacích. Projekty musí totiž současně naplňovat nejen podmínky robotizace, digitalizace a automatizace výroby, ale nová technologie musí být také plně integrována do vnitropodnikového systému. Větší podniky i přes snahu individuálně oslovit manažerem MAS naopak nemají o dotaci zájem z důvodu malé finanční alokace. A i přesto, že MAS ještě před podáním záměrů konzultovala všechny projektové záměry s API (byly odsouhlaseny), tak došlo k vyřazení prvního projektu v rámci formálního hodnocení na API. Je otázka, jak to bude vypadat u ostatních projektů, které jsou ještě ve fázi hodnocení na API.

Opatření: Urychlené postupné vyhlášení výzev č.2 a 3 – OPTAK. Znovu oslovení všech vhodných podnikatelských subjektů v území. Vyžadování písemného odkonzultování projektových záměrů s API. Podání žádosti o změnu Programového rámce OPTAK na prodloužení termínu pro splnění finančního milníku.

2. Problém: Programový rámec SP SZP – definice přidané hodnoty projektových záměrů pro území MAS

Jako jedna z prvních MAS, která chtěla vyhlášovat výzvu SP SZP, jsme potřebovali zjistit, co si MZe představuje pod pojmem "přidaná hodnota projektových záměrů pro území MAS". Velký problém byl v tom, že MZe se několik měsíců odvolávalo na Evropskou komisi, pak definici přehodilo na SZIF a ten zase zpět na MZe. Bohužel pro projekty z některých Fichí se jedná o vyřazovací kritérium, tzn. jde o velmi důležitou definici. Navíc kvůli zdlouhavé administraci projektů na SZIF by v případě nevyhlášení výzvy MAS nejpozději v létě 2024 bylo ohroženo plnění finančního milníku.

Opatření: Po měsíčním čekání na odpověď z MZe, vedoucí manažerka MAS absolvovala nepříjemné telefonáty s pracovníky MZe, kde je donutila alespoň k částečnému vyjádření na některá navržená hlediska přidané hodnoty z pohledu MAS Holicko. Díky tomu mohla MAS vyhlásit výzvu č.1-SP SZP. Bohužel se jednalo o neoficiální vyjádření, takže stále je zde určitá nejistota, jak se na definici přidané hodnoty budou tvářit zaměstnanci RO SZIF. To znamená, že stále hrozí, že SZIF projekty vybrané MASKou na tomto kritériu vyřadí. Což může mít opět za následek neplnění finančního milníku.

5.2. Informace o potenciálních rizicích realizace SCLLD 21+ a opatření k jejich eliminaci

1. Riziko: Programový rámec OPTAK – nedostatek žadatelů ve výzvách MAS

Pomalé čerpání programového rámce OPTAK je způsobeno nedostatečnými vazbami na cílovou skupinu. Sice se jedná o malé a střední podniky (stejně jako u PRV v minulém programovém období), ale zaměření projektů je úplně odlišné. Projekty musí v OPTAK současně naplňovat nejen podmínky robotizace, digitalizace a automatizace výroby, ale nová technologie musí být také plně integrována do vnitropodnikového systému. Tyto projekty jsou pro podniky (většinou živnostníci s maximálně 1-2 zaměstnanci), se kterými jsme v kontaktu, příliš složité. Takže jejich záměry vyřazujeme již při prvotních konzultacích. Větší podniky i přes snahu individuálně oslovit manažerem MAS naopak nemají o dotaci zájem z důvodu malé finanční alokace (do 2 mil. Kč). Hospodářská komora má kontakt pouze na 3 podnikatele z Holicka. Ty ale zájem o podporu z OPTAK nemají.

Opatření: Neustálá propagace realizace strategie CLLD 21+ v území (prostřednictvím starostů a členů MAS, obecní zpravodaje, Facebook, Instagram,...). Nalezli jsme cílovou skupinu, které podmínky výzvy vyhovují – lékaři, zubaři, veterináři. Nyní je zapotřebí osobním kontaktem podnítit jejich zájem.

2. Riziko: Programový rámec SP SZP – neplnění indikátorového plánu

V rámci výzvy č. 1 – SP SZP byly ve Fichi 4 – Podnikání malých a středních podniků vybrány k podpoře celkem 4 projekty v celkové výši 1.160.000,-Kč, čímž jsme zazavazovali 29% alokace Fiche 4. Z toho 3 projekty jsou zaměřeny na zemědělské podnikání (plnění indikátorového plánu již na 100 %) a pouze 1 na nezemědělské podnikání (plnění indikátorového plánu na 11 %). Plnění indikátorového plánu je zatím v pořádku. Problém ale může nastat po výzvě č.2 – SP SZP, kterou máme v plánu vyhlásit v 2/2025, protože v programovém období 2021+ na rozdíl od toho předchozího nejde oddělit aktivity pro zemědělce a nezemědělské podnikatele do různých Fichí a ani na to nemáme nastavena preferenční kritéria (v době jejich tvorby to nebylo potřeba).

Opatření: Před vyhlášením výzvy č.3 – SP SZP (plánována na počátek roku 2026) provést změny v podporovaných aktivitách Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků. Konkrétně zrušit aktivitu a) Zemědělské podnikání.

3. Riziko: Programový rámec SP SZP – nedočerpání finanční alokace z důvodu malého zůstatku v jednotlivých Fichích

Při nastavování způsobu výběru projektů SP SZP na MAS Holicko bylo rozhodnuto, že nebude docházet k přesunům alokací v rámci výzvy a ani se nebudou podporovat hraniční projekty. Protože ale očekáváme že v rámci výzvy č.2 – SP SZP dojde k vyčerpání téměř celé alokace MAS Holicko, tím pádem v rámci výzvy č.3 – SP SZP již budou řešeny pouze zbytkové alokace. Proto bude po ukončení výzvy č.2 – SP SZP potřeba řešit co s malými zbytkovými alokacemi v jednotlivých Fichích, aby došlo k jejich vyčerpání do poslední koruny.

Opatření: Před vyhlášením výzvy č.3 – SP SZP (plánována na počátek roku 2026) provést změny ve způsobu výběru projektů SP SZP. Využít možností, které SZIF umožňuje: přesun alokace v rámci výzvy nebo podpora hraničního projektu.

6. Závěr

Hlavním cílem této zprávy bylo zhodnotit současnou situaci naplňování strategie CLLD 21+ v průběhu roku 2024. Jednalo se o kompletní zhodnocení všech činností, které provádí MAS a podstatou samotného hodnocení byly vyhlášené výzvy a v závislosti na tom i přijaté a zrealizované projekty. Účelem této zprávy bylo zjistit, jak bylo dosaženo stanovených cílů a zda byly realizovány stanovené výstupy.

V případě **věcného pokroku stanovených cílů Strategie CLLD 21+** musíme konstatovat, že plánované indikátory jsou plněny **na cca 42 %**, což je odpovídající, pokud vezmeme v potaz, že realizace Strategie CLLD21+ bude probíhat až do roku 2030 (téměř polovina programovacího období).

Co se týče **realizace Programových rámců**, tak protože je realizace Strategie CLLD 21+ teprve na svém počátku (bude probíhat až do roku 2030), tak můžeme vidět, že **finanční a indikátorový plán se ještě nezačaly plnit, nebo jsou na úplném počátku svého plnění**. Důvodem je to, že během sledovaného období byly teprve vyhlášovány první výzvy. Na druhou stranu můžeme konstatovat, že se nám již teď **podařilo zazávkovat 61 % alokace**, kterou má MAS Holicko pro toto programové období k dispozici. Díky tomu můžeme již teď tvrdit, že všechny **finanční milníky nastavené jednotlivými řídicími orgány bychom měli s největší pravděpodobností splnit**. Minimálně kancelář MAS dělá vše pro to, aby byly splněny.

Díky propojování různých aktivit a projektů na území MAS se nám začínají **projevovat různě velké synergické efekty v sociální oblasti, v oblasti vzdělávání, regionální identity a udržitelného nakládání s přírodními zdroji**. Nejde pouze o aktivity samotné MAS Holicko, ale i aktivity místních aktérů (obce, svazek obcí, školy, poskytovatelé sociálních služeb), které MAS Holicko propojuje. Díky tomu výsledný efekt těchto projektů pro region Holicka je daleko vyšší, než kdyby jednotlivé instituce realizovali projekty bez vzájemné spolupráce.

Dále je potřeba zmínit, že v průběhu roku 2024 byly **zjištěny problémy s realizací Programových rámců OPTAK a SP SZP**. Ty byly ale **ještě v průběhu sledovaného období vyřešeny**.

V rámci tvorby této hodnotící zprávy byla ale také **identifikována potencionální rizika, která by mohla přinést vážné problémy s realizací Programových rámců OPTAK a SZP**: nedostatek žadatelů ve výzvách OPTAK, neplnění indikátorového plánu SP SZP a nedočerpání finanční alokace SP SZP.

Kontrolní výbor MAS Holicko navrhuje tato opatření, která povedou ke zlepšení naplňování cílů strategie CLLD 2021-2027(2030):

- **Neustálá propagace realizace strategie CLLD 21+ v území** (prostřednictvím starostů a členů MAS, obecní zpravodaje, Facebook, Instagram,...).
- **Navázání osobního kontaktu s potencionálními žadateli OPTAK** – seznámení s možnostmi podpory. Zejména využít zájmu lékařů, zubařů a veterinářů, kterým podmínky OPTAK vyhovují.
- Před vyhlášením výzvy č.3 – SP SZP (plánována na počátek roku 2026) provést změny v podporovaných aktivitách Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků. Konkrétně **zrušit aktivitu a) Zemědělské podnikání**. Důvodem je předpoklad několikanásobného překročení plánované hodnoty indikátorů u tohoto opatření na úkor neplnění indikátorů u aktivity d) Nezemědělské podnikání.
- Před vyhlášením výzvy č.3 – SP SZP (plánována na počátek roku 2026) provést změny ve způsobu výběru projektů SP SZP. Využít možností, které SZIF umožňuje:
 - **Přesun alokace v rámci výzvy SP SZP** (nesmí být překročena alokace vyhlášená ve výzvě) – Alokace zbývající ve výzvě bude postupně přidělována jednotlivým projektům, které splňují stanovenou minimální výši bodů, ale na které původní alokace na Fichi vyhlášená ve výzvě nebyla dostačující. Z každé Fiche vstoupí jeden projekt, který se nachází tzv. jako první pod čarou, do užšího výběru, z něhož bude dle následujících podmínek vybrán jeden projekt k podpoře:
 - 1) Prvožadatel na MAS
 - 2) Nižší výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 - 3) Místo realizace v obci s nižším počtem obyvatel
 - **Podpora hraničního projektu** = projekt, který je prvním nevybraným projektem v některé z vyhlášených Fichí, a zároveň splňuje minimální stanovenou bodovou hranici, ale alokace stanovená na výzvu již není dostačující na podporu tohoto projektu v plné výši, a i když tím dojde k překročení rezervované alokace MAS pro celé programové období. Z každé Fiche vstoupí jeden projekt, který se nachází tzv. jako první pod čarou, do užšího výběru, z něhož bude dle následujících podmínek vybrán jeden projekt, který bude podpořen jako hraniční:
 - 1) Prvožadatel na MAS
 - 2) Nižší výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 - 3) Místo realizace v obci s nižším počtem obyvatel

V Holicích dne 19.5.2025

.....
Jaroslava Píšová
Předsedkyně Kontrolního výboru MAS Holicko
