



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ STRATEGIE CLLD MAS HOLICKO

v období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

Zpracovatel: Kontrolní výbor MAS Holicko

Konzultant: Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD

Obsah

| | |
|--|-----------|
| 1. ÚVOD..... | 2 |
| 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE..... | 2 |
| 1.2. INFORMACE O PODANÝCH/ SCHVÁLENÝCH ZMĚNÁCH STRATEGIE CLLD | 2 |
| 1.3. OPATŘENÍ PŘI NEPLNĚNÍ ULOŽENÝCH POVINNOSTÍ | 2 |
| 2. REALIZACE STRATEGIE CLLD | 2 |
| 2.1. PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV | 3 |
| 2.1.1. 8. výzva MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2021)..... | 4 |
| 2.2. PRŮBĚH ADMINISTRACE VÝZEV | 5 |
| 2.3. KATEGORIE SCHVÁLENÝCH ŽADATELŮ | 6 |
| 2.4. MÍSTA REALIZACE SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ..... | 7 |
| 3. VĚCNÝ POKROK V PLNĚNÍ CÍLŮ STRATEGIE CLLD..... | 9 |
| 3.1. VĚCNÝ POKROK V PLNĚNÍ CÍLŮ PROGRAMOVÉHO RÁMCE PRV | 9 |
| 3.1.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce PRV..... | 11 |
| 3.1.2. Plnění indikátorového plánu Programového rámce PRV | 17 |
| 3.1.3. Plnění finančního plánu Programového rámce PRV..... | 18 |
| 3.2. VĚCNÝ POKROK V PLNĚNÍ CÍLŮ PROGRAMOVÉHO RÁMCE IROP..... | 20 |
| 3.2.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce IROP | 20 |
| 3.2.2. Plnění indikátorového plánu Programového rámce IROP | 23 |
| 3.2.3. Plnění finančního plánu Programového rámce IROP | 24 |
| 3.3. MÍSTA REALIZACE PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ..... | 25 |
| 3.4. VĚCNÝ POKROK V PLNĚNÍ CÍLŮ SCLLD MIMO PROGRAMOVÉ RÁMCE | 28 |
| 3.5. INFORMACE O DOSAŽENÝCH SYNERGICKÝCH EFEKTECH NA ÚROVNÌ OPATŘENÍ RESP. PODOPATŘENÍ STRATEGIE | 32 |
| 3.6. HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY | 33 |
| 4. ANIMACE STRATEGIE CLLD | 33 |
| 4.1. PROPAGACE STRATEGIE CLLD | 34 |
| 4.2. PODPORA ŽADATELŮ | 34 |
| 4.3. ANIMACE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OPVVV | 35 |
| 4.4. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A PARTNERŮ MAS | 35 |
| 5. INFORMACE O PLNĚNÍ DOPORUČENÍ EVALUAČNÍ ZPRÁVY Z 5/2019..... | 37 |
| 6. INFORMACE O PROBLÉMECH A RIZICÍCH V PRŮBĚHU REALIZACE STRATEGIE CLLD | 39 |
| 6.1. INFORMACE O PROBLÉMECH, KTERÉ SE VYSKYTLY V PRŮBĚHU REALIZACE SCLLD A PŘIJATÁ OPATŘENÍ | 39 |
| 6.2. INFORMACE O POTENCIÁLNÍCH RIZICÍCH REALIZACE SCLLD A OPATŘENÍ K JEJICH ELIMINACI..... | 39 |
| 7. ZÁVĚR | 40 |

1. Úvod

Předmětem této práce je vyhodnocení naplňování cílů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 - 2020 (SCLLD) s mottem: „Holicko – region plný života“.

Výchozím časovým obdobím pro tuto zprávu je období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, během kterého byla vyhlášena poslední výzva z programového rámce IROP. V rámci programového rámce PRV byla MAS Holicko navýšena alokace o cca 3,4 mil. Kč z důvodu navýšení Programu rozvoje venkova 2014-2020 o tzv. přechodného období (využití části alokace určené pro nové programové období 2021-2027 ještě ve stávajícím programovém období 2014-2020).

1.1. Základní údaje

| | |
|------------------------------|---|
| Název MAS: | MAS Holicko, o.p.s |
| Integrovaná strategie: | Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 - 2020 |
| Registrační číslo strategie: | CLLD_15_01_232 |
| Datum schválení Strategie: | 17. 8. 2016 |
| Pořadí hodnotící zprávy: | 5 |
| Sledované období: | 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 |

1.2. Informace o podaných/ schválených změnách strategie CLLD

Ve sledovaném období byly podány a schváleny 2 žádosti o změnu SCLLD:

- 1) **Aktualizace finančního plánu programového rámce IROP - dle skutečného čerpání v roce 2020**, převod zbývající nezazávazkané alokace (uspořená z již zrealizovaných projektů) ve výši 94.898,49 Kč (příspěvek EU) z opatření 1. Vzdělávání do opatření 2. Bezpečnost silničního provozu. – Změna byla podána 11.1.2021 a ŘO schválena 12.1.2021.
- 2) **Aktualizace programového rámce PRV – navýšení alokace v rámci přechodného období o 3.386.400,- Kč**, tzn. z původních celkových 12.756.760,- Kč na nových 16.143.160,- Kč. Nová částka byla přesunuta do Fichí pro zemědělce, potravináře, malé nezemědělské podniky, spolky a zpřístupnění lesa návštěvníkům. Na tomto základě byl upraven i indikátorový plán. – Změna byla podána 16.8.2021 a ŘO schválena 26.8.2021

1.3. Opatření při neplnění uložených povinností

Nerelevantní – žádná opatření ŘO nebyla vůči MAS Holicko uplatněna.

2. Realizace strategie CLLD

V průběhu sledovaného období MAS Holicko vyhlásila 1 výzvu příjmu žádostí, a to z programového rámce IROP. Pro tento programový rámec se jednalo o výzvu poslední. V rámci ní MAS Holicko poskytovala potencionálním příjemcům podporu pouze formou konzultací (osobní, telefon, e-mail).

Semináře byly vynechány z důvodu předchozího nezájmu obcí jako jediných možných žadatelů. Následně probíhala administrace této výzvy (hodnocení a výběr projektů, komunikace se žadateli a řídícími orgány, apod.).

V rámci výzvy č. 8-IROP byla přijata pouze 1 žádost o dotaci, která prošla formálním i věcným hodnocením s kladným výsledkem. V 11/2021 byl 1 vybraný projekt MAS předán na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti (výše dotace: 1.240.178,37 Kč).

V rámci programového rámce IROP byly v tomto období 4 projekty v realizaci (výše dotace: 3.241.020,20 Kč). Všechny tyto projekty podaly v tomto roce žádost o platbu. Dalších 16 projektů již bylo v udržitelnosti (výše dotace: 17.229.518,97 Kč).

V tuto chvíli na programovém rámci IROP zbývá volná finanční alokace ve výši 108.665,46 Kč. Ta vznikla úsporou 2 zrealizovaných projektů v roce 2021. Bohužel k uzavření projektů (schválení ŽoP ze strany ŘO) došlo až v průběhu vyhlášené výzvy č.8-IROP. Protože nedošlo k převisu žádostí v této výzvě, tak nešlo o tuto částku výzvu dodatečně navýšit a tím volné finance urychleně znova využít. Navíc dle podmínek IROP byl rok 2021 rokem posledním, kdy bylo možné výzvu vyhlásit. To znamená, že částka 108.665,46 Kč (0,50% celkové alokace MAS Holicko) propadla a MAS Holicko ji již nebude moci využít.

Na druhou stranu MAS Holicko plní bezproblémově finanční milník (podané ŽoP k 31.10. daného roku), který byl stanoven řídícím orgánem pro rok 2021 na min. 70,00%. MAS Holicko má totiž vyčerpáno již 93,82% své alokace určené pro programový rámec IROP, tzn. že již teď plní finanční milník určený i pro rok 2022 (84,85%).

V rámci programového rámce PRV tento rok nebyla vyhlášena žádná výzva. Důvodem byla malá volná finanční alokace (necelé 2 mil. Kč) a čekání na nově přidělenou alokaci pro přechodné období (3,4 mil. Kč).

Nicméně z předchozích výzev PRV bylo 17 projektů z programového rámce PRV již v pětileté udržitelnosti (výše dotace: 6.424.544,- Kč). Dalších 13 projektů bylo v realizaci (výše dotace: 4.385.105,- Kč), z toho 11 projektů podalo žádost o platbu (výše dotace: 3.954.465,- Kč). Dvěma projektům (620.000,- Kč) byla ukončena administrace ze strany SZIF. Důvodem bylo to, že nepodaly závěrečnou žádost o proplacení (podle vyjádření žadatele z důvodu komplikací s opatřeními proti COVID). Případný problém s neplněním indikátorového plánu (tyto projekty se totiž zavázaly k vytvoření 1,5 pracovního místa, což je povinný indikátor pro MAS č. 94800) vyřešila MAS změnou SCLLD, kterou řídící orgán schválil 26.8.2021.

V tuto chvíli na programovém rámci PRV zbývá volná finanční alokace ve výši 5.333.511,- Kč. Přesně na tuto částku byla v 1-3/2022 vyhlášena výzva č.7-PRV.

Protože Pardubický kraj neotevřel dotační titul pro MAS s názvem Malý LEADER, tak ani MAS Holicko nevyhlásila tento dotační titul. Pouze dobíhala realizace 7 projektů z předchozí výzvy „Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020“ (výše dotace: 174.300,- Kč), které mohly podat vyúčtování na MAS až do konce 4/2021.

2.1. Přehled vyhlášených výzev

V roce 2021 MAS Holicko vyhlásila a úspěšně zrealizovala 1 výzvu z programového rámce IROP zaměřenou na Bezpečnost silničního provozu. Úspěšně zrealizovaná výzva znamená, že Programový

výbor na základě hodnocení Výběrové komise schválil k financování minimálně 1 projekt, který byl následně předán k závěrečnému ověření na Řídící orgán.

Tabulka 1 – Počet úspěšně zrealizovaných výzev MAS

| | Plán uvedený v SCLLD | Plnění | | |
|--|----------------------|----------|--------------------|--------|
| | | Rok 2021 | Celkem 2016 - 2020 | % |
| Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou | 15 | 1 | 12 | 80,00% |

2.1.1. 8. výzva MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2021)

Vyhlašení výzvy: 20.5.2021

Příjem žádostí: 20.5.2021 – 1.9.2021

Vyhlašené opatření: 2 – Bezpečnost silničního provozu

Finanční alokace: 1.240.178,37 Kč

Tabulka 2 – Finanční alokace pro 8. výzvu MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2021)

| 7.výzva MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2020) | Finanční alokace výzvy | Počet přijatých projektů | Výše požadované dotace | Počet schválených projektů | Výše schválené dotace - MAS |
|---|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 – Bezpečnost silničního provozu | 1.240.178,37 Kč | 1 | 1.240.178,37 Kč | 1 | 1.240.178,37 Kč |

Průběh výzvy: Byla přijata 1 žádost o podporu, která prošla kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí s kladným výsledkem.

Tabulka 3 – Přijaté žádosti o dotaci v rámci 8. výzvy MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2021)

| Registrační číslo žádosti | Název žadatele | Název projektu | Místo realizace projektu (NUTS 5) | Počet bodů | Status | Výše schválené dotace |
|---|-------------------------|--|-----------------------------------|------------|-------------|------------------------|
| Opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu | | | | | | 1.240.178,37 Kč |
| CZ.06.4.59/0.0/0.0/ 16_038/0016789 | Obec Poběžovice u Holic | Realizace chodníku, Poběžovice u Holic | Poběžovice u Holic | 70 | Vybraný MAS | 1.240.178,37 Kč |

Výběrová komise zasedala v termínech 1.11.2021 a 8.11.2021. Žádost splnila minimální bodovou hranici. Programový výbor rozhodl 24.11.2021 o schválení tohoto projektu.

Dne 25.11.2021 byla žádost o podporu předána na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.

Tabulka 4 – Parametry schválených žádostí o dotaci v rámci 8. výzvy MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2021)

| Opatření 2 - Bezpečnost silničního provozu | Měrná jednotka | Hodnota |
|--|----------------|---------|
| Počet schválených projektů celkem | Počet | 1 |
| Počet projektů týkající se chodníků nebo stezek pro pěší | Počet | 1 |
| Počet projektů řešících místa pro přecházení | Počet | 1 |
| Počet projektů týkající se realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy | Počet | 0 |
| Počet projektů, jež zajišťují přístup k centru, či občanské vybavenosti | Počet | 0 |

| Opatření 2 - Bezpečnost silničního provozu | Měrná jednotka | Hodnota |
|---|----------------|---|
| Počet projektů šetrných k životnímu prostředí | Počet | 1 |
| Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela cílová skupina | Počet | 1 |
| Délka nově vybudovaných chodníků nebo stezek pro pěší | m | 435 |
| Délka zrekonstruovaných chodníků nebo stezek pro pěší | m | 0 |
| Velikost obce, kde je projekt realizován | - | <ul style="list-style-type: none"> • 1x: do 500 obyvatel. |
| Typ žadatele | - | <ul style="list-style-type: none"> • 1x Obce a jejich organizace |
| Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace) | % | 22,83% |

2.2. Průběh administrace výzev

Následující tabulka shrnuje administraci všech výzev MAS Holicko vyhlášených od začátku realizace Strategie CLLD, tj. od 18.8.2016. Samostatně je zde zdůrazněn sledovaný rok 2021. V tabulce je možné vyčist, kolik žádostí o podporu bylo přijato a hodnoceno, kolik jich bylo schváleno, kolik jich je v realizaci, apod.

V období 2016 – 2019 proběhly každoročně 4 výzvy pro předkládání žádostí o dotaci (1x programový rámec PRV, 2x programový rámec IROP a 1x Malý LEADER pro Holicko). V roce 2020 to byly pouze 3 výzvy (1x programový rámec PRV, 1x programový rámec IROP a 1x Malý LEADER pro Holicko). A ve sledovaném roce 2021 z důvodu téměř vyčerpané alokace a neotevření dotačního titulu Pardubického kraje pro Malý LEADER již byla vyhlášena pouze 1 výzva MAS Holicko (1x programový rámec IROP).

Letos jsme tedy hodnotili pouze 1 nový projekt (administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti, věcné hodnocení). Na druhou stranu dalších 24 projektů bylo v realizaci (17 projektů z výzev pro programové rámce). U těchto projektů jsme přijali 12 hlášení o změně, 15 monitorovacích zpráv a 22 žádostí o proplacení. Dalších 32 projektů bylo v udržitelnosti + dalších 16 projektů do fáze udržitelnosti přešlo v průběhu roku 2021, což znamenalo přijetí dalších 41 monitorovacích zpráv.

Tabulka 5 – Průběh administrace výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 - 2021

| Průběh administrace výzev | Rok 2021 | | | Celkem 2016 - 2021 |
|--|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | Výzvy prog.rámců PRV a IROP | Výzvy Malý LEADER | Celkem rok 2021 | |
| Počet podaných projektů | 1 | - | 1 | 120 |
| Počet projektů vyrazených ve formálním hodnocení | 0 | - | 0 | 5 |
| Počet projektů vyrazených ve věcném hodnocení | 0 | - | 0 | 0 |
| Počet vybraných projektů | 1 | - | 1 | 97 |
| Počet náhradníků | 0 | - | 0 | 6 |
| Počet podaných odvolání na MAS | 0 | - | 0 | 0 |
| Počet vyrazených projektů ŘO | 2 | - | 2 | 4 |
| Počet projektů s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace | 5 | - | 5 | 84 |
| Počet projektů v realizaci (neukončené k 31.12. daného roku) | 2 | - | 2 | 82 |
| Počet podaných Hlášení o změnách | 12 | - | 12 | 74 |
| Počet podaných Monitorovacích zpráv | 56 | - | 56 | 115 |
| Kontrola na místě realizace projektu | 17 | - | 17 | 110 |
| Počet podaných Závěrečných Žádostí o proplacení | 15 | 7 | 22 | 80 |
| Počet projektů v době udržitelnosti (k 31.12. daného roku) | 16 | - | 16 | 48 |

2.3. Kategorie schválených žadatelů


Níže uvedená tabulka uvádí kategorie žadatelů, kteří projekt podali a kteří byli schváleni v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených od začátku realizace Strategie CLLD, tj. od 18.8.2016. Samostatně je zde uveden právě sledovaný rok 2021.

Ze zjištěných výsledků je patrné, že nejvíce schválených žadatelů jsou obce (59,1%). Ostatních typů žadatelů je podstatně méně: podnikatelské subjekty – 19,4%, NNO – 14,0% a zemědělci – 7,5%.

V případě srovnání částek schválené dotace to vypadá obdobně: obce získaly 67,65% dotace, podnikatelské subjekty 16,55% a zemědělci 12,44%. Rozdíl je ale u NNO, které získaly pouhých 3,36% dotace, a to i přesto, že počet schválených projektů je vyšší než zemědělců. Rozdíl je způsoben tím, že NNO mohly do roku 2019 žádat pouze v rámci výzev Malého LEADERu, kde je maximální výše dotace pouze 35 tis. Kč. Teprve v loňském roce (2020) jim byla otevřena nová Fiche v rámci programového rámce PRV. Díky tomu se jim průměrná výše schválené dotace navýšila na 88 tis. Kč. Ostatní kategorie žadatelů (podnikatelé, zemědělci, obce) mají průměrnou výši schválené dotace mezi 312 – 603 tis. Kč.

Tabulka 6 – Kategorie schválených žadatelů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2021

| Monitoring typu schválených žadatelů | Rok 2021 | | | Celkem 2016 - 2021 | % |
|--|--|----------------------|--|---|-------------|
| | Výzvy prográmec PRV a IROP | Výzvy Malý LEADER | Celkem rok 2021 | | |
| Stát a jeho organizace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Obce, svazky obcí nebo jejich organizace | 1.240.178,37Kč <i>(1 projekt)</i> | 0 | 1.240.178,37Kč <i>(1 projekt)</i> | 22.967.223,49Kč <i>(55 projektů)</i> | 67,65% |
| Církve a jejich organizace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nestátní neziskové organizace | 0 | 0 | 0 | 1.139.711,-Kč <i>(13 projektů)</i> | 3,36% |
| Zemědělci | 0 | 0 | 0 | 4.223.723,-Kč <i>(7 projektů)</i> | 12,44% |
| Podnikatelské subjekty | 0 | 0 | 0 | 5.617.817,-Kč <i>(18 projektů)</i> | 16,55% |
| Celkem | 1.240.178,37Kč <i>(1 projekt)</i> | 0 Kč | 1.240.178,37Kč <i>(1 projekt)</i> | 33.948.474,49Kč <i>(93 projektů)</i> | 100% |

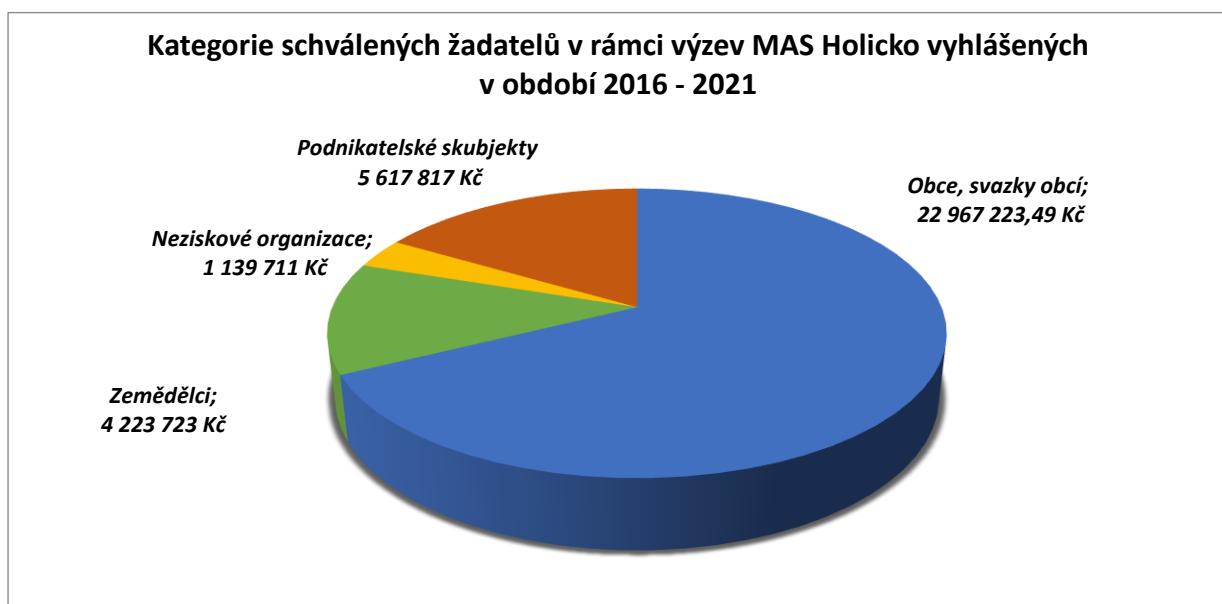

2.4. Místa realizace schválených projektů

Následující tabulka uvádí místa realizace schválených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených od začátku realizace Strategie CLLD, tj. od 18.8.2016.


Počet míst realizace neodpovídá zcela přesně počtu schválených projektů, neboť některé projekty jsou realizovány na více místech (oplocenky).

Jak je vidět, daří se nám pokrýt skoro celé území MAS. Zatím jediná obec, která nevyužila dotací MAS Holicko je obec Týnišťko. Dále nejméně čerpají obce Radhošť a Uhersko. Naopak nejvíce peněz poputuje do obcí Horní Ředice, Dolní Roveň, Ostřetín, Horní Jelení a Chvojenec.


Tabulka 7 – Místa realizace schválených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2021

| Místo realizace schválených projektů | Rok 2021 | | | Celkem 2016 - 2021 | % |
|--------------------------------------|--|-------------------|--|---|-------------|
| | Výzvy prog.rámců PRV a IROP | Výzvy Malý LEADER | Celkem rok 2021 | | |
| Býšť | 0 | 0 | 0 | 1.404.216,86Kč <i>(2,31 projekty)</i> | 4,14% |
| Dolní Roveň | 0 | 0 | 0 | 4.515.837,20Kč <i>(6 projektů)</i> | 13,30% |
| Dolní Ředice | 0 | 0 | 0 | 2.157.339,46 Kč <i>(7 projektů)</i> | 6,35% |
| Holice | 0 | 0 | 0 | 1.556.420,55Kč <i>(15 projektů)</i> | 4,58% |
| Horní Jelení | 0 | 0 | 0 | 3.622.635,80Kč <i>(6 projektů)</i> | 10,67% |
| Horní Ředice | 0 | 0 | 0 | 5.216.483,31Kč <i>(12 projektů)</i> | 15,37% |
| Chvojenec | 0 | 0 | 0 | 3.524.688,37Kč <i>(12,06 projektů)</i> | 10,38% |
| Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 955.378,22Kč <i>(3 projekty)</i> | 2,81% |
| Ostřetín | 0 | 0 | 0 | 4.108.920,13Kč <i>(10 projektů)</i> | 12,10% |
| Poběžovice u Holic | 1.240.178,37Kč <i>(1 projekt)</i> | 0 | 1.240.178,37Kč <i>(1 projekt)</i> | 2.325.209,94Kč <i>(4,68 projekty)</i> | 6,85% |
| Radhošť | 0 | 0 | 0 | 94.900,-Kč <i>(3 projekty)</i> | 0,28% |
| Trusnov | 0 | 0 | 0 | 2.021.889,14Kč <i>(3 projekty)</i> | 5,96% |
| Týnišťko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Uhersko | 0 | 0 | 0 | 345.835,65Kč <i>(2 projekty)</i> | 1,02% |
| Vysoké Chvojno | 0 | 0 | 0 | 885.166,16Kč <i>(4,61 projekty)</i> | 2,61% |
| Nová Ves | 0 | 0 | 0 | 1.213.553,70Kč <i>(2,34 projektu)</i> | 3,57% |
| Celkem | 1.240.178,37Kč <i>(1 projekt)</i> | 0 Kč | 1.240.178,37Kč <i>(1 projekt)</i> | 33.948.474,49 <i>(93 projektů)</i> | 100% |

Místa realizace schválených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených období 2016 - 2021

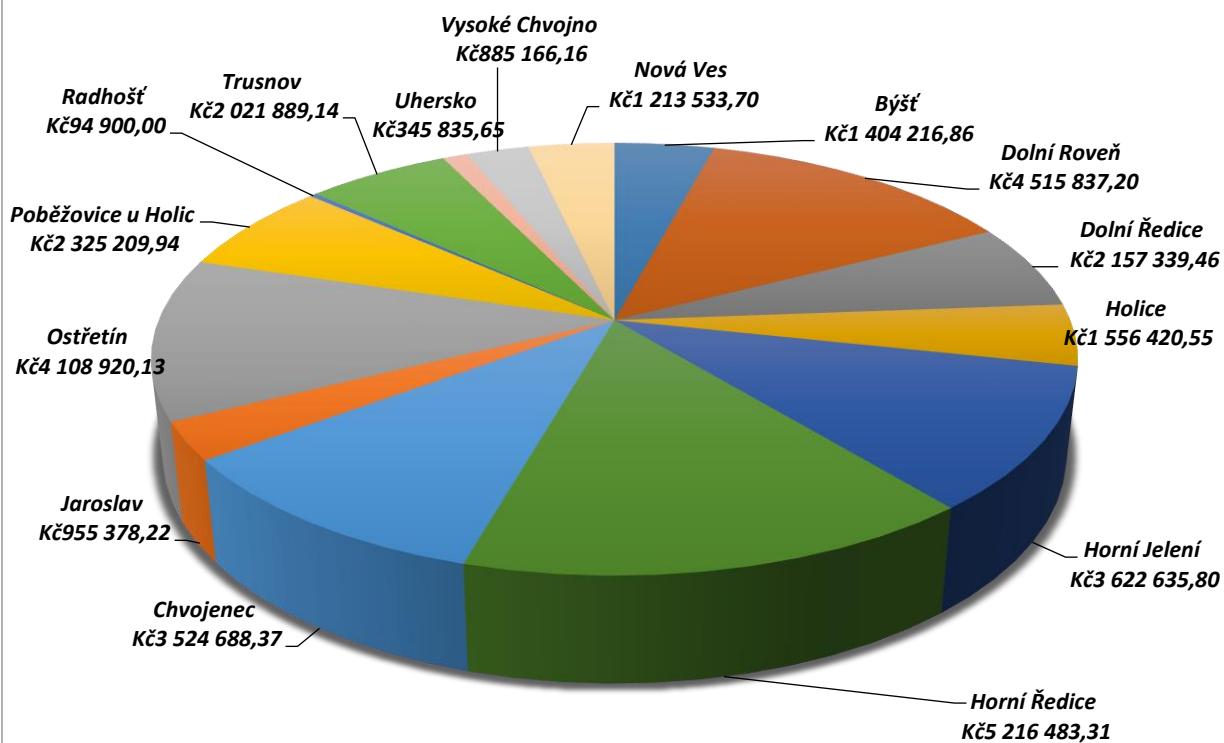

Místa realizace schválených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 - 2021 dle kategorií žadatelů

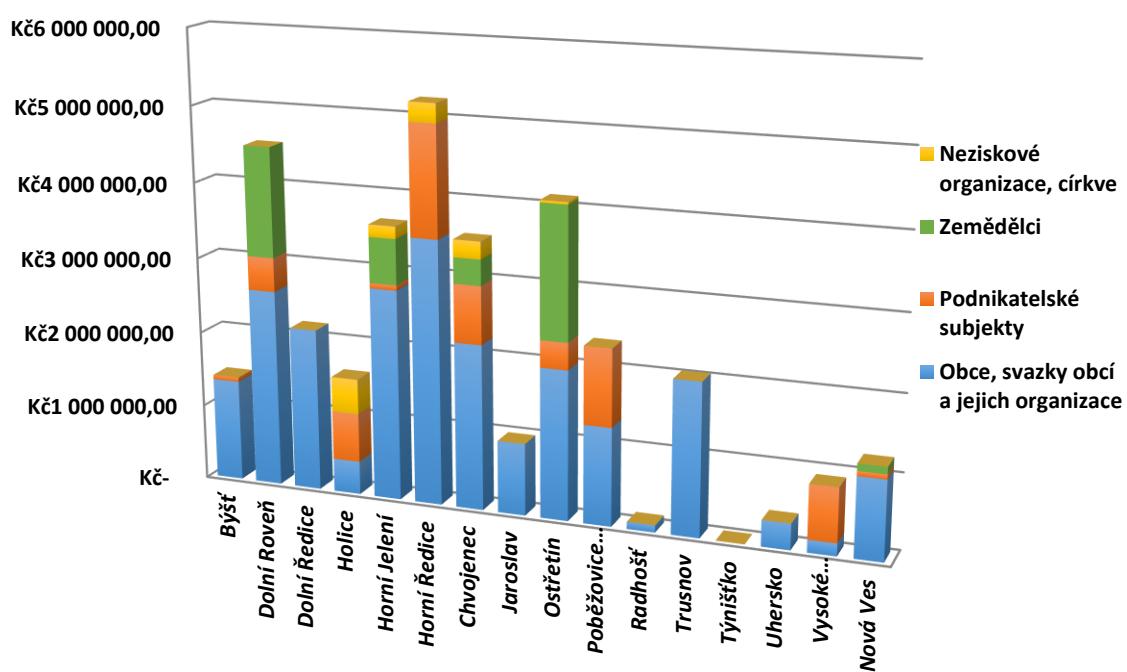

3. Věcný pokrok v plnění cílů strategie CLLD

Ve sledovaném období bylo 24 projektů v realizaci, z toho 17 projektů z výzev programových rámčů PRV a IROP. 15 projektů z výzev programových rámčů podalo závěrečnou žádost o proplacení a 7 projektů z výzvy Malého LEADERu podalo závěrečné vyúčtování.

K 31.12.2021 bylo celkem v udržitelnosti 48 projektů z programových rámčů, z toho 22 projektů přešlo do udržitelnosti v roce 2021. Na projekty podané do výzev Malý LEADER se udržitelnost nevztahuje.

3.1. Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce PRV

Dosavadní plnění SCLLD ve vztahu k jednotlivým Fichím Programového rámce PRV probíhalo následovně:

Fiche 1 - Podpora zemědělských podniků: 5 projektů je v udržitelnosti (3.884.583,- Kč). Poslednímu 1 projektu, který nepodal ŽoP, ukončil SZIF administraci dne 14.9.2021. Podle vyjádření žadatele šlo o komplikace s opatřeními proti COVID. Nicméně po tomto datu se nevyužitá částka 525.000,- Kč vrátila do volné alokace MAS Holicko. Hrozící problém s neplněním indikátorového plánu (tentototo projekt se totiž zavázal k vytvoření 0,50 pracovního místa, což je povinný indikátor pro MAS č. 94800) vyřešila MAS změnou SCLLD, kterou řídící orgán schválil 26.8.2021. Tím došlo ke snížení plánované hodnoty indikátoru č.94800 z hodnoty 1,50 na 1,00 vytvořeného pracovního místa. V tuto chvíli zde zbývá volná finanční alokace ve výši 1.815.417,- Kč (včetně nově přidané částky pro přechodné období ve výši 1.042.542,- Kč). Přesně na tuto částku byla v 1-3/2022 vyhlášena výzva č.7-PRV.

Fiche 2 - Podpora potravinářských podniků: 4 projekty jsou v udržitelnosti (693.497,- Kč). Poslednímu 1 projektu, který nepodal ŽoP, ukončil SZIF administraci dne 11.6.2021. Podle vyjádření žadatele šlo o komplikace s opatřeními proti COVID. Nicméně po tomto datu se nevyužitá částka 95.000,- Kč vrátila do volné alokace MAS Holicko. Hrozící problém s neplněním indikátorového plánu (tentototo projekt se totiž zavázal k vytvoření 1,00 pracovního místa, což je povinný indikátor pro MAS č. 94800) vyřešila MAS změnou SCLLD, kterou řídící orgán schválil 26.8.2021. Tím došlo ke snížení plánované hodnoty indikátoru č.94800 z hodnoty 1,00 na 0 vytvořeného pracovního místa. V tuto chvíli zde zbývá volná finanční alokace ve výši 316.503,- Kč (včetně nově přidané částky pro přechodné období ve výši 202.603,- Kč). Přesně na tuto částku byla v 1-3/2022 vyhlášena výzva č.7-PRV.

Fiche 3 – Podpora malých podniků: 12 projektů je v udržitelnosti (4.011.674,- Kč), z toho 6 projektů přešlo do tohoto stavu ve sledovaném období (podaly ŽoP a byly proplaceny). 1 projekt (269.040,- Kč) je stále v realizaci. V tuto chvíli zde zbývá volná finanční alokace ve výši 1.419.286,- Kč (včetně nově přidané částky pro přechodné období ve výši 951.440,- Kč). Přesně na tuto částku byla v 1-3/2022 vyhlášena výzva č.7-PRV.

Fiche 4 – Ochrana lesních porostů: 2 projekty jsou v udržitelnosti (382.746,- Kč). V tuto chvíli zde zbývá volná finanční alokace ve výši 48.226,- Kč. V rámci přechodného období alokace pro tuto Fichi nebyla navýšena, a to z důvodu nezájmu potencionálních žadatelů. Navíc tato částka bude v rámci výzvy č.7-PRV převedena na Fichi 7 – Podpora spolkového života.

Fiche 5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům: 1 projekt je v udržitelnosti (600.000,- Kč). Navíc tento projekt podal ve sledovaném roce ŽoP a byl proplacen, tzn. že tento rok přešel do udržitelnosti. Žádný jiný projekt není v realizaci. V tuto chvíli zde zbývá volná finanční alokace ve výši 1.000.000,- Kč (včetně nově přidané částky pro přechodné období ve výši 620.000,- Kč). Přesně na tuto částku byla v 1-3/2022 vyhlášena výzva č.7-PRV.

Fiche 6 – Spolupráce místních akčních skupin: V průběhu mid-term evaluace, která proběhla v roce 2019, byla tato Fiche zrušena.

Fiche 7 - Podpora spolkového života: 4 projekty jsou v udržitelnosti (806.509,- Kč), všechny přešly do tohoto stavu ve sledovaném období (podaly ŽoP a byly proplaceny). 1 projekt (161.600,- Kč) je stále v realizaci. V tuto chvíli zde zbývá volná finanční alokace ve výši 733.807,- Kč (včetně nově přidané částky pro přechodné období ve výši 569.815,- Kč). Částka, která bude vyhlášena ve výzvě č.7.PRV (1-3/2022) bude o 48.226,- Kč vyšší (převedeno z Fiche 4 – Ochrana lesních porostů).

Tabulka 8 – Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce PRV k 31.12.2021

| Věcný pokrok v plnění cílů programového rámce PRV | 1 - Podpora zemědělských podniků | 2 - Podpora potravinářských podniků | 3 - Podpora malých podniků | 4 - Ochrana lesních porostů | 5 - Zpřístupnění lesa návštěvníkům | 6 - Spolupráce MAS | 7 - Podpora spolkového života | Celkem Programový rámeček PRV |
|---|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Finanční alokace pro celé období uvedená v SCLLD¹ | 5.700.000,-Kč | 1.010.000,-Kč | 5.700.000,-Kč | 430.972,-Kč | 1.600.000,-Kč | OKČ | 1.702.188,-Kč | 16.143.160,-Kč |
| Vyhlašená alokace | 3.031.207,-Kč | 912.850,-Kč | 9.571.496,-Kč | 1.535.042,-Kč | 1.588.790,-Kč | OKČ | 1.132.373,-Kč | 17.771.758,-Kč |
| Počet podaných projektů | 7 | 5 | 19 | 2 | 3 | 0 | 5 | 41 |
| Výše požadované dotace (<i>Žádost o dotaci</i>) | 5.532.708,-Kč | 907.397,-Kč | 6.390.468,-Kč | 439.351,-Kč | 980.000,-Kč | OKČ | 972.737,-Kč | 15.222.661,-Kč |
| Počet schválených projektů | 6 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 32 |
| Výše schválené dotace (<i>Dohoda o poskytnutí dotace</i>) | 4.409.583,-Kč | 788.497,-Kč | 4.280.714,-Kč | 382.746,-Kč | 600.000,-Kč | OKČ | 972.737,-Kč | 11.779.861,-Kč |
| Počet podpořených projektů | 5 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28 |
| Výše proplacené dotace | 3.884.583,-Kč | 693.497,-Kč | 4.011.674,-Kč | 382.746,-Kč | 600.000,-Kč | OKČ | 806.509,-Kč | 10.379.009,-Kč |
| Výše sankcí a korekcí | 772.875,-Kč ² | 95.000,-Kč ³ | 445.500,-Kč ⁴ | OKČ | 380.000,-Kč ⁵ | OKČ | OKČ | 1.693.375,-Kč |
| Volná alokace využitelná pro další výzvy¹ | 1.815.417,-Kč | 316.503,-Kč | 1.419.286,-Kč | 48.226,-Kč | 1.000.000,-Kč | OKČ | 734.079,-Kč | 5.333.511,-Kč |

¹ Včetně navýšení původní alokace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 o tzv. 3.386.400,- Kč v rámci přechodného období (využití části alokace určené pro nové programové období 2021-2027 ještě ve stávajícím programovém období 2014-2020), tj. navýšení z původních celkových 12.756.760,- Kč na nových 16.143.160,- Kč.

² 1x udělena korekce za špatně provedené výběrové řízení (247.875,- Kč), 1x ukončení administrace z důvodu nedodání ŽoP na SZIF (525.000,- Kč).

³ 1x ukončení administrace z důvodu nedodání ŽoP na SZIF (95.000,- Kč).

⁴ 1x ukončení administrace z důvodu nedoplňení ŽoD na SZIF (445.500,- Kč).

⁵ 1x ukončení administrace z důvodu nedoplňení ŽoD na SZIF (380.000,- Kč).

3.1.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce PRV

Ve sledovaném období podalo závěrečnou žádost o proplacení 11 projektů z Programového rámce PRV. Konkrétně se jednalo o 2 projekty z výzvy č. 5-PRV a 9 projektů z výzvy č. 6-PRV. Všechny tyto projekty byly proplaceny ještě v tomtéž roce. Všechny projekty byly také bez uložené sankce/korekce a dodržely indikátory a preferenční kritéria, ke kterým se zavázaly.

Tabulka 9 – Podpořené projekty v rámci Programového rámce PRV v roce 2021

| Fiche | Registrační číslo | Žadatel | Název projektu | Místo realizace | Poskytnutá dotace | Proplacení projektu |
|-------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------|-------------------|---------------------|
| Výzva č. 5 - PRV | | | | | | |
| 3 | 19/005/19210/453/088/001124 | Miloš Vlasák | Pořízení stavební techniky | Poběžovice u Holic | 895.500,-Kč | 10.5.2021 |
| 3 | 19/005/19210/453/088/001121 | Luboš Kvapil | Drobná zámečnická dílna | Horní Ředice | 899.550,-Kč | 13.07.2021 |
| Výzva č. 6 - PRV | | | | | | |
| 3 | 20/006/19210/453/088/000890 | Josef Branda | Holická zmrzlina u Pepeho | Holice | 117.076,-Kč | 27.4.2021 |
| 3 | 20/006/19210/453/088/000894 | Aleš Erber | Vybavení pro environmentální poradenství 2020 | Chvojenec | 52.180,-Kč | 21.7.2021 |
| 3 | 20/006/19210/453/088/000895 | Antonín Jablonský | Pořízení chladírenského vozu | Chvojenec | 313.650,-Kč | 12.10.2021 |
| 3 | 20/006/19210/453/088/000889 | VODA TOPENÍ SERVIS s.r.o. | Pořízení techniky do stavební činnosti | Horní Ředice | 270.000,-Kč | 26.10.2021 |
| 5 | 20/006/19210/453/088/000887 | "Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o." | Rekonstrukce stezky pro turisty na PUPFL | Vysoké Chvojno | 600.000,-Kč | 16.11.2021 |
| 7 | 20/006/19210/453/088/000893 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Ředice | Vybavení společenské místnosti hasičské zbrojnice SDH Horní Ředice | Horní Ředice | 229.579,-Kč | 6.4.2021 |
| 7 | 20/006/19210/453/088/000892 | TJ Sokol Chvojenec z.s. | Vybavení zázemí pro činnost TJ Sokol Chvojenec z.s. | Chvojenec | 229.270,-Kč | 21.6.2021 |
| 7 | 20/006/19210/453/088/000897 | Obec Vysoké Chvojno | Vybavení pro spolky - Vysoké Chvojno | Vysoké Chvojno | 107.932,-Kč | 2.8.2021 |
| 7 | 20/006/19210/453/088/000886 | Tělocvičná jednota Sokol Holice | Do sokolovny za kulturou a vzděláváním | Holice | 239.728,-Kč | 13.9.2021 |

Níže uvedené tabulky shrnují parametry, které MAS Holicko sleduje u podpořených projektů, pro každou Fichi zvlášť. Jsou zde uvedeny souhrnně všechny projekty, které byly realizovány od začátku realizace Strategie CLLD, tj. od 18.8.2016. Samostatně je zde uveden právě sledovaný rok 2021.

Co se týče Fiche 1, tak zde nebyl v průběhu roku 2021 ukončen žádný projekt. Na druhou stranu od začátku realizace CLLD bylo podpořeno 5 projektů, z toho 4x se podpora týkala živočisné výroby a 1x rostlinné výroby. 3 projekty byly zaměřeny na nákup mobilních strojů pro zemědělskou výrobu. 3 projekty obsahovaly inovativní prvky a 3 projekty byly šetrné k životnímu prostředí. Díky realizaci projektu bylo vytvořeno 1,0 pracovní místo.

V případě podrobnějšího pohledu na žadatele je dobré zmínit, že byli podpořeni 2 začínající podnikatelé a 1x byla žadatelem žena. 1 žadatel byl podpořen dokonce dvakrát (Zemědělská společnost Ostřetín, a.s.).

Tabulka 10 – Parametry podpořených projektů Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2021

| Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků | Měrná jednotka | Hodnota | |
|---|----------------|----------|---|
| | | Rok 2021 | Celkem 2016 - 2021 |
| Počet podpořených projektů celkem | Počet | 0 | 5 |
| Počet podpořených žadatelů celkem | Počet | 0 | 4 |
| Počet projektů týkající se živočišné výroby | Počet | 0 | 4 |
| Počet projektů týkající se rostlinné výroby nebo školkařské produkce | Počet | 0 | 1 |
| Počet projektů týkající se pořízení peletovacího zařízení | Počet | 0 | 0 |
| Počet projektů týkající se pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu | Počet | 0 | 3 |
| Počet inovativních projektů | Počet | 0 | 3 |
| Počet projektů šetrných k životnímu prostředí | Počet | 0 | 3 |
| Počet projektů využívajících stávající zařízení a objekty | Počet | 0 | 5 |
| Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) | Pracovní místa | 0 | 1 |
| Modernizace nevyužitých prostor | m ² | 0 | 0 |
| Velikost obce, kde je projekt realizován | - | 0 | <ul style="list-style-type: none"> • 1x: do 500 obyvatel, • 4x: 501 – 5.000 obyvatel. |
| Typ žadatele | - | 0 | <ul style="list-style-type: none"> • 1x Zemědělec – PO (střední podnik) – podal 2 žádosti, • 3x Zemědělec – FO (mikropodnik). |
| Počet začínajících podnikatelů | Žadatel | 0 | 2 |
| Počet žen (v případě FO) | Žadatel | 0 | 1 |
| Počet držitelů regionální značky „KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt“ | Žadatel | 0 | 0 |
| Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace) | % | 0 | 56,82% |

Ani u Fiche 2 nebyl ve sledovaném období ukončen žádný projekt. Od začátku realizace SCLLD, ale byly podpořeny 4 projekty zaměřené na výrobu potravin. 3 projekty se týkaly investice do zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů. 1 projekt obsahoval inovativní prvky a 1 projekt byl šetrný k životnímu prostředí. V rámci této Fiche nebylo vytvořeno žádné pracovní místo.

V případě podrobnějšího pohledu na žadatele je dobré zmínit, že byli podpořeni 2 začínající podnikatelé. V obou případech se jednalo o ženy, které byly podpořeny dvakrát (Věra Skutilová a Vladimíra Krejčíková). V jednom případě díky realizaci projektu vzniklo nové živnostenské oprávnění. Ačkoliv žadatelky nebyly v době podání žádosti o dotaci držitelkami regionální značky, tak víme že získání dotace bylo impulsem pro získání certifikátu: v jednom případě „KRAJ PERNŠTEJNŮ- regionální produkt“ a v tom druhém „Regionální potravina“ udělovaném ministerstvem zemědělství.

Tabulka 11 – Parametry podpořených projektů Fiche 2 – Podpora potravinářských podniků v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2021

| Fiche 2 – Podpora potravinářských podniků | Měrná jednotka | Hodnota | |
|--|------------------------|----------|---|
| | | Rok 2021 | Celkem 2016 - 2021 |
| Počet podpořených projektů celkem | Počet | 0 | 4 |
| Počet podpořených žadatelů celkem | Počet | 0 | 2 |
| Počet projektů týkající se výroby potravin | Počet | 0 | 4 |
| Počet projektů týkající se výroby krmiv | Počet | 0 | 0 |
| Počet projektů, jejichž součástí je investice do zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů | Počet | 0 | 3 |
| Počet inovativních projektů | Počet | 0 | 1 |
| Počet projektů šetrných k životnímu prostředí | Počet | 0 | 1 |
| Počet projektů využívajících stávající zařízení a objekty | Počet | 0 | 4 |
| Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) | Pracovní místa | 0 | 0 |
| Modernizace nevyužitých prostor | m ² | 0 | 0 |
| Velikost obce, kde je projekt realizován | - | 0 | • 4x: 501 – 5.000 obyvatel. |
| Typ žadatele | - | 0 | • 1x Zemědělec – FO (mikropodnik) – podal 2 žádosti, • 1x Podnikatel – FO (mikropodnik) – podal 2 žádosti. |
| Počet začínajících podnikatelů | Žadatel | 0 | 2 |
| Počet žen (v případě FO) | Žadatel | 0 | 2 |
| Počet držitelů regionální značky „KRAJ PERNŠTEJNU regionální produkt“ | Žadatel | 0 | 0 |
| Počet nově vzniklých živnostenských oprávnění | Živnostenské oprávnění | 0 | 1 |
| Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace) | % | 0 | 59,55% |

V rámci Fiche 3 bylo od začátku realizace SCLLD podpořeno 12 projektů (z toho 6 projektů v roce 2021), které byly zaměřeny na tyto ekonomické činnosti: 5x stravování a pohostinství, 2x stavebnictví, 1x zámečnictví, 1x truhlářství, 1x čalounictví, 1x výroba zmrzliny, 1x sportovní nebo rekreační činnosti a 1x poradenství v oboru životního prostředí. 4 projekty obsahovaly inovativní prvky a 3 projekty byly šetrné k životnímu prostředí. Bohužel žádný projekt nebyl zaměřen na zlepšení poskytovaných služeb v obci. Na druhou stranu bylo vytvořeno 1,0 pracovní místo.

V případě podrobnějšího pohledu na žadatele je dobré zmínit, že byli podpořeni 3 začínající podnikatelé, 2x byla žadatelem žena a 1x požádal o dotaci držitel regionální značky „KRAJ PERNŠTEJNU – regionální produkt“. V jednom případě díky realizaci projektu vzniklo nové živnostenské oprávnění. 2 žadatelé byli podpořeni dokonce dvakrát (Antonín Jablonský a Josef Branda).

Tabulka 12 – Parametry podpořených projektů Fiche3 – Podpora malých podniků v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2021

| Fiche 3 – Podpora malých podniků | Měrná jednotka | Hodnota | |
|---|------------------------|--|--|
| | | Rok 2021 | Celkem 2016 - 2021 |
| Počet podpořených projektů celkem | Počet | 6 | 12 |
| Počet podpořených žadatelů celkem | Počet | 6 | 10 |
| Ekonomická činnost žadatele | - | <ul style="list-style-type: none"> • 2x C - Zpracovatelský průmysl, • 2x F - Stavebnictví, • 5x I – Ubytování, stravování a pohostinství, • 1x M – Profesní, vědecké a technické činnosti, • 1x R - Sportovní, zábavní a rekreační činnosti, • 1 x S 95 - Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost. | <ul style="list-style-type: none"> • 3x C - Zpracovatelský průmysl, • 2x F - Stavebnictví, • 5x I – Ubytování, stravování a pohostinství, • 1x M – Profesní, vědecké a technické činnosti, • 1x R - Sportovní, zábavní a rekreační činnosti, • 1 x S 95 - Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost. |
| Počet inovativních projektů | Počet | 2 | 4 |
| Počet projektů šetrných k životnímu prostředí | Počet | 2 | 3 |
| Počet projektů zlepšujících základní vybavení nebo služby v obci | Počet | 0 | 0 |
| Počet projektů využívajících stávající zařízení a objekty | Počet | 5 | 11 |
| Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) | Pracovní místa | 0 | 1 |
| Modernizace nevyužitých prostor | m ² | 0 | 0 |
| Velikost obce, kde je projekt realizován | - | <ul style="list-style-type: none"> • 1x: do 500 obyvatel, • 4x: 501 – 5.000 obyvatel, • 1x: nad 5.000 obyvatel. | <ul style="list-style-type: none"> • 1x: do 500 obyvatel, • 8x: 501 – 5.000 obyvatel, • 3x: nad 5.000 obyvatel. |
| Typ žadatele | - | <ul style="list-style-type: none"> • 1x Podnikatel – PO (mikropodnik), • 8x Podnikatel – FO (mikropodnik) –2 žadatelé podali 2 žádosti, • 1x Zemědělec – FO (mikropodnik). | <ul style="list-style-type: none"> • 1x Podnikatel – PO (mikropodnik), • 8x Podnikatel – FO (mikropodnik) –2 žadatelé podali 2 žádosti, • 1x Zemědělec – FO (mikropodnik). |
| Počet začínajících podnikatelů | Žadatel | 2 | 3 |
| Počet žen (v případě FO) | Žadatel | 0 | 2 |
| Počet držitelů regionální značky „KRAJ PERŠTEJNU regionální produkt“ | Žadatel | 1 | 1 |
| Počet nově vzniklých živnostenských oprávnění | Živnostenské oprávnění | 0 | 1 |
| Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace) | % | 65,14% | 64,86% |

V případě Fiche 4 nebyl ve sledovaném období ukončen žádný projekt. Od začátku realizace SCLLD, ale byly podpořeny 2 projekty. Jedná se již o finální verzi tabulky, protože již žádné projekty nejsou v realizaci a MAS neplánuje vyhlásit žádnou další výzvu na tuto Fichi. Oba dva projekty byly zrealizovány v hospodářských lesích, kde bylo oploceno 8,59 ha melioračních a zpevňujících dřevin. V obou případech šlo o projekt šetrný k životnímu prostředí. Průměrná výše finanční spoluúčasti žadatelů byla 33,68%.

V případě podrobnějšího pohledu na žadatele je dobré zmínit, že se v obou případech jednalo o toho samého žadatele - Lesní družstvo Vysoké Chvojno, s.r.o. (společnost vlastněná obcemi).

Tabulka 13 – Parametry podpořených projektů Fiche 4 – Ochrana lesních porostů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2021

| Fiche 4 - Ochrana lesních porostů | Měrná jednotka | Hodnota | |
|---|----------------|----------|----------------------------------|
| | | Rok 2021 | Celkem 2016 - 2021 |
| Počet podpořených projektů celkem | Počet | 0 | 2 |
| Počet podpořených žadatelů celkem | Počet | 0 | 1 |
| Počet inovativních projektů | Počet | 0 | 0 |
| Počet projektů šetrných k životnímu prostředí | Počet | 0 | 2 |
| Počet projektů, jejichž místo realizace jsou lesy hospodářské | Počet | 0 | 2 |
| Počet zrealizovaných projektů, jejichž místo realizace jsou vybrané kategorie lesy zvláštního určení (tj. lázeňské, příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí) | Počet | 0 | 0 |
| Celková plocha | ha | 0 | 8,59 |
| Typ žadatele | - | 0 | • Podnikatel – PO (velký podnik) |
| Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace) | % | 0 | 33,68% |

V rámci Fiche 5 byl první projekt schválen k financování až ve výzvě č. 6-PRV vyhlášené v roce 2020. Do té doby nebyl projeven zájem území (nikdo nepodal žádost) nebo žádost byla vyřazena při formálním hodnocení. Díky tomu byl v roce 2021 zrealizován vůbec první projekt této Fiche, který byl zaměřen na posílení rekreační funkce lesa (rekonstrukce 392,1 m turistické stezky), usměrňování návštěvnosti území (zřízení 1 informační tabule) i údržbu lesního prostředí (zřízení 1 odpadkového koše). Realizací projektu bylo dotčeno 10 ha lesů zvláštního určení (tj. lázeňské, příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí). Bohužel na jeho přípravě se nepodílela cílová skupina. Na druhou stranu ale projekt obsahoval inovativní prvky, byl šetrný k životnímu prostředí a zároveň byl zaměřený i na regionální tématiku.

Tabulka 14 – Parametry podpořených projektů Fiche 5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2021

| Fiche 5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům | Měrná jednotka | Hodnota | |
|--|----------------|----------|--------------------|
| | | Rok 2021 | Celkem 2016 - 2021 |
| Počet podpořených projektů celkem | Počet | 1 | 1 |
| Počet podpořených žadatelů celkem | Počet | 1 | 1 |
| Počet projektů zaměřených na posílení rekreační funkce lesa (např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty, značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků) | Počet- | 1 | 1 |
| Počet projektů zaměřených na usměrňování návštěvnosti území (např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory) | Počet | 1 | 1 |

| Fiche 5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům | Měrná jednotka | Hodnota | |
|---|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Rok 2021 | Celkem 2016 - 2021 |
| Počet projektů zaměřených na údržbu lesního prostředí (např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně) | Počet | 1 | 1 |
| Počet inovativních projektů | Počet | 1 | 1 |
| Počet projektů šetrných k životnímu prostředí | Počet | 1 | 1 |
| Počet projektů zaměřených na regionální tematiku | Počet | 1 | 1 |
| Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela cílová skupina | Počet | 0 | 0 |
| Počet zrealizovaných projektů, jejichž místo realizace jsou vybrané kategorie lesy zvláštního určení (tj. lázeňské, příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí) | Počet | 1 | 1 |
| Celková plocha | ha | 10 | 10 |
| Délka nově vybudovaných stezek pro turisty | m | 0 | 0 |
| Délka zrekonstruovaných stezek pro turisty | m | 392,1 | 392,1 |
| Počet herních, naučných a fitness prvků | ks | 0 | 0 |
| Počet odpočinkových stanovišť | ks | 0 | 0 |
| Počet přistřešků | ks | 0 | 0 |
| Počet informačních tabulí | ks | 1 | 1 |
| Typ žadatele | - | • Podnikatel – PO (velký podnik) | • Podnikatel – PO (velký podnik) |
| Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace) | % | 20,47% | 20,47% |

Co se týče Fiche 7, tak ta byla vytvořena až na základě mid-term evaluace v roce 2019, tzn. že na tuto Fichi mohla být vyhlášena první výzva až v roce 2020. To znamená, že ve sledovaném období byly zrealizovány první 4 projekty této Fiche. Všechny tyto projekty budou sloužit pro více aktivit/účelů více jak 50 hodin ročně. Na přípravě 3 projektů se podílela cílová skupina. 3 projekty přímo podpoří činnost spolkových a neziskových organizací. A cca 1.579 obyvatel Holicka bude mít prospěch ze zlepšených služeb.

V případě podrobnějšího pohledu na žadatele je dobré zmínit, že byly podpořeny 3 spolky a 1 obec.

Tabulka 15 – Parametry podpořených projektů Fiche 7 – Podpora spolkového života v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2021

| Fiche 7 – Podpora spolkového života | Měrná jednotka | Hodnota | |
|---|----------------|----------|--------------------|
| | | Rok 2021 | Celkem 2016 - 2021 |
| Počet podpořených projektů celkem | Počet | 4 | 4 |
| Počet podpořených žadatelů celkem | Počet | 4 | 4 |
| Počet projektů, jejichž výstupy budou sloužit pro více aktivit/účelů v obci | Počet | 4 | 4 |
| Počet projektů, jejichž výstupy jsou efektivně využívány: 30 – 49 hodin/rok | Počet | 0 | 0 |
| Počet projektů, jejichž výstupy jsou efektivně využívány: min 50 hodin/rok a více | Počet | 4 | 4 |
| Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela cílová skupina | Počet | 3 | 3 |

| Fiche 7 – Podpora spolkového života | Měrná jednotka | Hodnota | |
|---|----------------|--|--|
| | | Rok 2021 | Celkem 2016 - 2021 |
| Počet projektů, které podpořily činnost spolkových a neziskových organizací (NNO nebo církev a její organizace jsou buď žadatelem, nebo mají předmět realizace projektu v dlouhodobém pronájmu) | Počet | 3 | 3 |
| Počet osob mající prospěch ze zlepšených služeb/infrastruktury | Počet | 1.579 | 1.579 |
| Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) | Pracovní místa | 0 | 0 |
| Velikost obce, kde je projekt realizován | Počet | <ul style="list-style-type: none"> • 1x: do 500 obyvatel, • 2x: 501 – 5.000 obyvatel, • 1x: nad 5.000 obyvatel. | <ul style="list-style-type: none"> • 1x: do 500 obyvatel, • 2x: 501 – 5.000 obyvatel, • 1x: nad 5.000 obyvatel. |
| Typ žadatele | Počet | <ul style="list-style-type: none"> • 1x obec, • 3x NNO. | <ul style="list-style-type: none"> • 1x obec, • 3x NNO. |
| Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace) | % | 24,50% | 24,50% |

3.1.2. Plnění indikátorového plánu Programového rámce PRV

V roce 2021 proběhla aktualizace indikátorového plánu z důvodu navýšení alokace programového rámce PRV v rámci přechodného období. Nové hodnoty indikátorů byly nově nastaveny podle dosavadních zkušeností u již vybraných projektů a na základě provedeného šetření absorpční kapacity.

Cílem aktualizace indikátorového plánu bylo také vyřešit problém s neplněním indikátoru č. 94800 – Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů, do kterého se MAS Holicko dostala vinou nezodpovědného žadatele. V předchozí aktualizaci indikátorového plánu v roce 2019 se totiž MAS Holicko zavázala k vytvoření celkem 3,5 pracovních míst na základě hodnot uváděných v již vybraných projektech. Bohužel 1 žadatel (2 projekty) v průběhu roku 2020 nepodal ŽoP a SZIF mu v průběhu roku 2021 ukončil administraci těchto projektů, u kterých ale byl závazek vytvoření celkem 1,5 pracovního místa. Naštěstí řídící orgán dne 26.8.2021 schválil snížení hodnoty tohoto indikátoru pro MAS Holicko z 3,5 na 2,0 pracovní úvazky (odpovídá povinné minimální hodnotě stanovené Pravidly PRV pro výběr Strategií CLLD (*Na každých 200 000 EUR původní alokace na operaci 19.2.1 by mělo být vytvořeno alespoň jedno pracovní místo*)), což už MAS díky realizaci jiných projektů splnila v letech předcházejících, tzn. tento indikátor je již teď plněn na 100%.

V případě Fiche 1, 2, 5 a 7 je na 1-3/2022 plánována výzva. Zde budou preferenční kritéria nastavena tak, aby vybrané projekty umožnily naplnit i ostatní indikátory na 100%.

V případě Fiche 4, u které jsou oba dva indikátory plněny na 100%, již není v plánu vyhlásit výzva na příjem žádostí.

Tabulka 16 – Plnění indikátorového plánu Programového rámce PRV uvedeného v SCLLD v období 2016 – 2021

| Název indikátoru | Plán uvedený v SCLLD | Plnění | | |
|--|----------------------|----------|--------------------|---------|
| | | Rok 2021 | Celkem 2016 - 2021 | % |
| Fiche 1 - Podpora zemědělských podniků | | | | |
| Počet podpořených podniků / příjemců | 7 | 0 | 5 | 71,43% |
| Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) | 1 | 0 | 1 | 100,00% |
| Fiche 2 - Podpora potravinářských podniků | | | | |

| Název indikátoru | Plán uvedený v SCLLD | Plnění | | |
|--|----------------------|----------|--------------------|---------|
| | | Rok 2021 | Celkem 2016 - 2021 | % |
| Počet podpořených podniků/příjemců | 6 | 0 | 4 | 66,67% |
| Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiche 3 - Podpora malých podniků | | | | |
| Počet podpořených podniků / příjemců | 17 | 6 | 12 | 70,59% |
| Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) | 1 | 0 | 1 | 100,00% |
| Fiche 4 - Ochrana lesních porostů | | | | |
| Počet podpořených operací (akcí) | 2 | 0 | 2 | 100,00% |
| Celková plocha (ha) | 8,59 | 0 | 8,59 | 100,00% |
| Fiche 5 - Zpřístupnění lesa návštěvníkům | | | | |
| Počet podpořených operací (akcí) | 3 | 1 | 1 | 33,33% |
| Celková plocha (ha) | 15 | 10 | 10 | 66,67% |
| Fiche 6 - Spolupráce místních akčních skupin | | | | |
| Celkové veřejné výdaje (O.1) | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiche 7 - Podpora spolkového života | | | | |
| Počet podpořených operací (akcí) | 8 | 4 | 4 | 50,00% |
| Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) | 0 | 0 | 0 | - |

3.1.3. Plnění finančního plánu Programového rámce PRV

V 8/2021 byla schválena změna finančního plánu programového rámce PRV jejímž obsahem bylo navýšení alokace v rámci přechodného období o 3.386.400,- Kč, tzn. z původních celkových 12.756.760,- Kč na nových 16.143.160,- Kč. Nová částka byla přesunuta do Fichí pro zemědělce, potravináře, malé nezemědělské podniky, spolky a zpřístupnění lesa návštěvníkům.

K 31.12.2021 máme zazávazkováno 10.809.649,- Kč, což je o 682.391,- Kč (4,23%) méně než je uvedeno v aktualizovaném finančním plánu. Důvodem je to, že od 8/2021 (v době, kdy byla vyřizována změna finančního plánu na SZIF) do konce 12/2021 bylo ukončeno několik projektů, které oproti částkám uvedeným v Dohodách o poskytnutí dotace (plán financování) ušetřily finance díky provedeným cenovým marketingům. Takto ušetřené finance bude moci MAS Holicko znova využít jako volné finance v dalších výzvách MAS.

V případě Fichí 1 a 2 je nevyšší rozdíl. Ten je víceméně způsoben tím, že v těchto Fichích měl 1 žadatel zaregistrováno po jednom projektu. Bohužel v roce 2020 tento žadatel nepodal ani jednu závěrečnou žádost o proplacení (Dle jeho vyjádření šlo o komplikace s opatřeními proti COVID.) a v druhé polovině roku 2021 mu SZIF ukončil administraci obou těchto projektů. Částky se sice vrátily k dalšímu využití do volné finanční alokace MAS Holicko, ale ve finančním plánu již zůstaly uvedené (Fiche 1 – 525.000,- Kč, Fiche 2 – 95.000,- Kč). Zazávazkováním těchto částek v dalších letech novými projekty by se měl tento rozdíl srovnat.

V případě Fiche 4 je rozdíl mezi plánem a skutečností 48.226,- Kč. Ten byl způsoben tím, že poslední projekt zaměřený na oplocenky v roce 2019 ušetřil tuto částku. SZIF neumožnil MAS Holicko v rámci změny finančního plánu tuto částku narovnat. Na druhou stranu stejně jako u jiných Fichí se tato částka vrátila do volné alokace MAS. Ale protože území již o tuto Fichi nemá zájem, tak o tuto volnou částku byla ve výzvě č. 7-PRV (vyhlášena v 1-3/2022) navýšena alokace Fiche 7.

Tabulka 17 – Plnění finančního plánu Programového rámce PRV uvedeného v SCLLD v období 2016 – 2021

| FINANČNÍ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD – OBDOBÍ 2016 - 2021 | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|--|--|
| Opatření/Fiche SCLLD | PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) | | | | | Nezpůsobilé výdaje (Kč) | Kumulativní % čerpání alokace | | |
| | Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho Podpora | | Z toho Vlastní zdroje příjemce | | | | | |
| | | Příspěvek Unie | Národní veřejné zdroje | | | | | | |
| 1. Podpora zemědělských podniků | 8.908.457,- | 2.822.132,- | 1.587.451,- | 4.498.874,- | 1.901.459,- | | 77,36% | | |
| 2. Podpora potravinářských podniků | 2.635.853,- | 504.645,- | 283.865,- | 1.847.343,- | 219.720,- | | 78,07% | | |
| 3. Podpora malých podniků | 10.697.198,- | 2.748.605,- | 1.546.095,- | 6.402.498,- | 2.057.923,- | | 75,35% | | |
| 4. Ochrana lesních porostů | 617.704,- | 275.821,- | 155.151,- | 186.732,- | 51.290,- | | 100% | | |
| 5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům | 754.432,- | 384.000,- | 216.000,- | 154.432,- | 158.431,- | | 37,50% | | |
| 6. Spolupráce místních akčních skupin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | | |
| 7. Podpora spolkového života | 1.306.367,- | 619.694,- | 348.581,- | 338.092,- | 0 | | 56,88% | | |
| Celkem | 24.920.011,- | 7.354.897,- | 4.137.143,- | 13.427.971,- | 4.388.823,- | | 71,19% | | |
| SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ – OBDOBÍ 2016 - 2021 | | | | | | | | | |
| Opatření/Fiche SCLLD | PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) | | | | | Nezpůsobilé výdaje (Kč) | Kumulativní % čerpání alokace | | |
| | Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho Podpora | | Z toho Vlastní zdroje příjemce | | | | | |
| | | Příspěvek Unie | Národní veřejné zdroje | | | | | | |
| 1. Podpora zemědělských podniků | 8.033.457,- | 2.486.132,- | 1.398.451,- | 4.148.874,- | 1.717.709,- | | 68,15% | | |
| 2. Podpora potravinářských podniků | 1.643.743,88 | 443.837,- | 249.660,- | 950.246,88 | 179.819,80 | | 68,66% | | |
| 3. Podpora malých podniků | 10.666.118,- | 2.739.654,- | 1.541.060,- | 6.385.404,61 | 2.051.395,88 | | 75,10% | | |
| 4. Ochrana lesních porostů | 569.478,- | 244.956,- | 137.790,- | 186.732,- | 0 | | 88,81% | | |
| 5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům | 754.432,20 | 384.000,- | 216.000,- | 154.432,20 | 154.432,20 | | 37,50% | | |
| 6. Spolupráce místních akčních skupin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | | |
| 7. Podpora spolkového života | 1.036.495,34 | 619.587,- | 348.522,- | 338.386,34 | 16.085,01 | | 56,87% | | |
| Celkem | 22.973.725,03 | 6.918.166,- | 3.891.483,- | 12.164.076,03 | 4.119.441,89 | | 66,96% | | |
| SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI S PLÁNEM – OBDOBÍ 2016 - 2021 | | | | | | | | | |
| Opatření/Fiche SCLLD | PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) | | | | | Nezpůsobilé výdaje (Kč) | Kumulativní % čerpání alokace | | |
| | Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho Podpora | | Z toho Vlastní zdroje příjemce | | | | | |
| | | Příspěvek Unie | Národní veřejné zdroje | | | | | | |
| 1. Podpora zemědělských podniků | - 525.000,- | - 336.000,- | - 189.000,- | - 350.000,- | - 183.750,- | | - 9,21% | | |
| 2. Podpora potravinářských podniků | - 95.013,- | - 60.808,- | - 34.205,- | - 897.096,12 | - 39.200,20 | | - 9,41% | | |
| 3. Podpora malých podniků | - 13.986,- | - 8.951,- | - 5.035,- | - 17.093,39 | - 6.527,12 | | - 0,25% | | |
| 4. Ochrana lesních porostů | - 48.226,- | - 30.865,- | - 17.361,- | - | - 51.290,- | | - 11,19% | | |
| 5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům | - | - | - | - | +0,20 | - 3.998,80 | 0% | | |
| 6. Spolupráce místních akčních skupin | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 7. Podpora spolkového života | - 166,- | - 107,- | - 59,- | + 294,34 | + 16.085,01 | | - 0,01% | | |
| Celkem | - 682.391,- | - 436.731,- | - 245.660,- | - 1.263.894,97 | - 269.381,11 | | - 4,23% | | |

*Veškeré částky jsou v případě Programového rámce PRV počítány ze Žádostí o dotaci schválených SZIF do 31.12.2020

3.2. Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce IROP

Dosavadní plnění SCLLD ve vztahu k jednotlivým opatřením Programového rámce IROP probíhalo následovně:

Opatření 1 – Vzdělávání: Všech 7 podpořených projektů v tomto opatření je již v udržitelnosti (7.513.099,24 Kč). 1 poslední projekt přešel do tohoto stavu ve sledovaném období (podal ŽoP a byl proplacen – 998.362,12 Kč). V tuto chvíli na tomto opatření zbývá volná finanční alokace ve výši 28.737,51 Kč. Ta vznikla úsporou posledního zrealizovaného projektu v letošním roce, který byl uzavřen (schválení ŽoP ze strany ŘO) až po ukončení výzvy pro příjem žádostí č.8-IROP. Protože nedošlo k převisu žádostí v této výzvě, tak nešlo o tuto částku výzvu dodatečně navýšit a tím volné finance urychleně znova využít. Navíc dle podmínek IROP byl rok 2021 rokem posledním, kdy bylo možné výzvu vyhlásit. To znamená, že částka 28.737,51 Kč (0,38% alokace opatření 1 - Vzdělávání) propadla a MAS Holicko ji již nebude moci využít.

Opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu: 13 projektů je v udržitelnosti (12.957.439,93 Kč), z toho 4 projekty přešly do tohoto stavu ve sledovaném období (podaly ŽoP a byly proplaceny). V 5/2021 byla na toto opatření vyhlášena nová výzva č.8-IROP, v rámci které byl přijat a následně i programovým výborem MAS schválen 1 projekt (1.240.178,37 Kč). Ten byl v 11/2021 předán na závěrečné ověření na CRR. V tuto chvíli na tomto opatření zbývá volná finanční alokace ve výši 79.927,95 Kč. Ta vznikla úsporou posledního zrealizovaného projektu v letošním roce, který byl uzavřen (schválení ŽoP ze strany ŘO) v průběhu vyhlášené výzvy pro příjem žádostí č.8-IROP. Stejně jako u předchozího opatření, o tuto částku nešlo výzvu dodatečně navýšit a další výzva již vyhlásit nelze. To znamená, že částka 79.927,95 Kč (0,56% alokace opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu) propadla a MAS Holicko ji již nebude moci využít.

Tabulka 18 – Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce IROP k 31.12.2021

| Věcný pokrok v plnění cílů programového rámce IROP | 1 - Vzdělávání | 2 – Bezpečnost silničního provozu | Celkem Programový rámec IROP |
|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Finanční alokace pro celé období uvedená v SCLLD | 7.541.836,75Kč | 14.277.546,25Kč | 21.819.383,-Kč |
| Vyhlášená alokace | 9.834.143,59Kč | 21.881.993,20Kč | 31.716.136,79Kč |
| Počet podaných projektů | 7 | 15 | 22 |
| Výše požadované dotace (žádost o podporu) | 7.636.735,24Kč | 15.979.807,28Kč | 23.616.542,52Kč |
| Počet schválených projektů | 7 | 14 | 21 |
| Výše schválené dotace (Rozhodnutí o poskytnutí dotace) | 7.513.099,24Kč | 14.197.618,30Kč | 21.710.717,54Kč |
| Počet podpořených projektů | 7 | 13 | 20 |
| Výše proplacené dotace | 7.513.099,24Kč | 12.957.439,93Kč | 20.470.539,17Kč |
| Výše sankcí a korekcí | 58.613,26Kč | 452.772,75Kč | 511.386,01Kč |
| Volná alokace využitelná pro další výzvy | 28.737,51Kč | 79.927,95Kč | 108.665,46Kč |

3.2.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce IROP

Ve sledovaném období 4 projekty z Programového rámce IROP podalo závěrečnou žádost o proplacení a bylo proplaceno. Dále v roce 2021 byl proplacen i 1 projekt z výzvy č. 6-IROP, který podal ŽoP už v roce 2020.

Všechny projekty až na jeden byly bez uložené sankce/korekce. Korekce dotace byla uložena pouze projektu Obce Chvojenec s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Chvojenec rekonstrukcí chodníku podél silnice III/29821“ ve výši 452.772,75 Kč za porušení Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tato částka se poté vrátila zpět do volné finanční alokace Opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu.

Na druhou stranu všechny projekty dodržely indikátory a preferenční kritéria, ke kterým se zavázaly.

Tabulka 19 – Podpořené projekty v rámci Programového rámce IROP v roce 2021

| Opatření | Registrační číslo | Žadatel | Název projektu | Místo realizace | Poskytnutá dotace | Proplacení projektu |
|---|---------------------------------------|------------------|---|-----------------|-------------------|---------------------|
| 3. výzva MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2018) | | | | | | |
| 1 | CZ.06.4.59/0.0/0.0/ 16_075/0009423 | Obec Dolní Roveň | Učebna výpočetní techniky ZŠ Dolní Roveň | Dolní Roveň | 998.362,12Kč | 25.11.2021 |
| 6. výzva MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2019) | | | | | | |
| 2 | CZ.06.4.59/0.0/0.0/ 16_038/0012302 | Obec Chvojenec | Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Chvojenec rekonstrukcí chodníku podél silnice III/29821 | Chvojenec | 2.031.837,62Kč | 4.1.2021 |
| 2 | CZ.06.4.59/0.0/0.0/ 16_038/0012307 | Obec Uhersko | Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Uhersko výstavbou nového chodníku při silnici III/30513 | Uhersko | 320.934,65Kč | 1.3.2021 |
| 2 | CZ.06.4.59/0.0/0.0/ 16_038/0012313 | Obec Trusnov | Zvýšení bezpečnosti v obci Trusnov, 2. etapa | Trusnov | 947.605,79Kč | 26.8.2021 |
| 7. výzva MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2020) | | | | | | |
| 2 | CZ.06.4.59/0.0/0.0/ 16_038/0015014 | OBEC NOVÁ VES | Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Nová Ves výstavbou chodníku a rekonstrukcí veřejného osvětlení | Nová Ves | 974.117,64Kč | 6.6.2021 |

Níže uvedené tabulky shrnují parametry, které MAS Holicko sleduje u podpořených projektů, pro každé opatření zvlášť. Jsou zde uvedeny souhrnně všechny projekty, které byly realizovány od začátku realizace Strategie CLLD, tj. od 18.8.2016. Samostatně je zde uveden právě sledovaný rok 2021.

V rámci opatření 1 bylo začátku realizace CLLD podpořeno 7 projektů (z toho 1 projekt v roce 2021) týkajících se učeben základních škol o celkové kapacitě 488 žáků. Jedná se již o finální verzi tabulky, protože již žádné projekty nejsou v realizaci a MAS nemůže vyhlásit žádnou další výzvu na toto opatření. Většina projektů (5) byla zaměřena na výuku více předmětů: 4 projekty byly zaměřeny na učebny cizích jazyků, 5x se řešila učebna technických nebo řemeslných oborů, 3x učebna přírodních věd a 4 projekty byly zaměřeny na práci s digitálními technologiemi. Navíc výstupy všech projektů budou využívány i k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže. 1 projekt také řešil bezbariérovost celé školy a 2 projekty byly zaměřeny i na úpravu venkovního prostředí. Na přípravě všech projektů se podílela cílová skupina. Všechny podpořené školy byly z obcí o velikosti 501 – 5.000 obyvatel. Průměrná výše finanční spoluúčasti žadatelů byla 5,73%.

V případě podrobnějšího pohledu na žadatele je dobré zmínit, že přímo si žádaly 2 základní školy. V ostatních případech byl žadatelem zřizovatel školy, tj. obec. 1 žadatel byl podpořen dokonce dvakrát (obec Dolní Roveň).

Tabulka 20 – Parametry podpořených projektů Opatření 1 – Vzdělávání rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2021

| Opatření 1 - Vzdělávání | Měrná jednotka | Hodnota | |
|--|----------------|--|--------------------|
| | | Rok 2021 | Celkem 2016 - 2021 |
| Počet podpořených projektů celkem | Počet | 1 | 7 |
| Počet podpořených žadatelů celkem | Počet | 1 | 6 |
| Počet podpořených základních škol | Zařízení | 1 | 7 |
| Počet podpořených zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání | Zařízení | 0 | 0 |
| Počet podpořených zařízení pro celoživotní vzdělávání | Zařízení | 0 | 0 |
| Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení | Osoby | 18 | 488 |
| Počet projektů týkajících se komunikace v cizích jazycích | Počet | 1 | 4 |
| Počet projektů týkajících se technických a řemeslných oborů | Projekt | 0 | 5 |
| Počet projektů týkajících se přírodních věd | Projekt | 0 | 3 |
| Počet projektů týkajících se schopnosti práce s digitálními technologiemi | Projekt | 1 | 4 |
| Počet projektů základních škol, jejichž výstupy budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže | Projekt | 1 | 7 |
| Počet projektů základních škol, jejichž výstupy budou sloužit pro výuku více předmětů (kroužků) | Projekt | 0 | 5 |
| Počet projektů týkajících se bezbariérovosti | Projekt | 0 | 1 |
| Počet projektů týkajících se vnitřní konektivity škol a školských zařízení a připojení k internetu | Projekt | 0 | 0 |
| Počet projektů, jejichž součástí byly úpravy venkovního prostředí | Projekt | 0 | 2 |
| Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela cílová skupina | Projekt | 1 | 7 |
| Velikost obce, kde je projekt realizován | - | <ul style="list-style-type: none"> • 1x: 501 – 5.000 obyvatel. • 7x: 501 – 5.000 obyvatel. | |
| Typ žadatele | - | <ul style="list-style-type: none"> • 1x obce. • 2x školy, • 4x obce. | |
| Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace) | % | 5,00% | 5,73% |

V rámci opatření 2 bylo od začátku realizace SCLLD podpořeno 13 projektů (z toho 3 projekty v roce 2021) týkajících se chodníků. Konkrétně bylo vybudováno 928,09 m nových chodníků a zrekonstruováno 3.857,06 m chodníků ve špatném stavu. 9 projektů řešilo místa pro přecházení a 3 projekty realizovaly prvky zvyšujících bezpečnost silniční a pěší dopravy. 10 projektů zlepšilo přístup k občanské vybavenosti v obcích - zpravidla se jednalo o budování nebo rekonstrukce chodníků u škol nebo autobusových zastávek. Součástí 9 chodníků byla výsadba zeleně. Příprava všech projektů byla veřejně projednána s cílovou skupinou a její připomínky byly zapracovány do konečného řešení.

V případě podrobnějšího pohledu na žadatele je dobré zmínit, že 2 obce byly podpořeny dvakrát (Horní Ředice a Trusnov).

Tabulka 21 – Parametry podpořených projektů Opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2021

| Opatření 2 - Bezpečnost silničního provozu | Měrná jednotka | Hodnota | |
|--|----------------|--|--------------------|
| | | Rok 2021 | Celkem 2016 - 2021 |
| Počet podpořených projektů celkem | Počet | 3 | 13 |
| Počet podpořených žadatelů celkem | Počet | 3 | 11 |
| Počet projektů týkající se chodníků nebo stezek pro pěší | Počet | 3 | 13 |
| Počet projektů řešících místa pro přecházení | Počet | 3 | 9 |
| Počet projektů týkající se realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy | Počet | 0 | 3 |
| Počet projektů, jež zajišťují přístup k centru, či občanské vybavenosti | Počet | 2 | 10 |
| Počet projektů šetrných k životnímu prostředí | Počet | 2 | 9 |
| Délka nově vybudovaných chodníků nebo stezek pro pěší | m | 172,9 | 928,09 |
| 09Délka zrekonstruovaných chodníků nebo stezek pro pěší | m | 616,0 | 3.857,06 |
| Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela cílová skupina | Počet | 3 | 13 |
| Velikost obce, kde je projekt realizován | - | <ul style="list-style-type: none"> • 3x: do 500 obyvatel, • 7x: 501 – 5.000 obyvatel, • 1x: nad 5.000 obyvatel. | |
| Typ žadatele | - | <ul style="list-style-type: none"> • 3x obce. • 11x obce. | |
| Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace) | % | 5,00% | 6,33% |

3.2.2. Plnění indikátorového plánu Programového rámce IROP

Protože indikátorový plán programového rámce IROP vznikal na přelomu let 2015/2016, tak dle počtu zaregistrovaných projektů je již teď vidět, že dojde k jeho několikanásobnému překročení.

V případě opatření 1 – Vzdělávání je zrealizováno všech 7 vybraných projektů (plnění indikátoru na 140%). Jedná se již o finální výši indikátoru – MAS Holicko již vyhlašovat výzvu nebude.

Ještě větší rozdíl je v kapacitě podpořených vzdělávacích zařízení, kde plníme původní výši indikátoru na 271%. Největší podíl na tomto indikátoru má ZŠ Býšť, která v rámci realizace projektu řešila mimo jiné i bezbariérovost celé školy. Tím pádem se do tohoto indikátoru započítala kapacita celé školy, místo kapacity pouze řešené učebny. Navíc některé školy řeší v rámci 1 projektu modernizaci 2 učeben, díky čemuž se opět navýšila řešená kapacita.

V případě opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu je v současné chvíli zrealizováno 13 projektů (plnění indikátoru na 217%) a další 1 projekt byl vybrán k podpoře v rámci výzvy č .8-IROP (plánované plnění indikátoru na 233%).

Na základě konzultace s Řídícím orgánem IROP bude indikátorový plán upraven dle skutečnosti až na konci období, tj. až všechny projekty budou proplaceny.

Tabulka 22 – Plnění indikátorového plánu Programového rámce IROP uvedeného v SCLLD v období 2016 – 2021

| Název indikátoru | Plán uvedený v SCLLD | Plnění | | |
|--|----------------------|----------|--------------------|---------|
| | | Rok 2021 | Celkem 2016 - 2021 | % |
| Opatření 1 - Vzdělávání | | | | |
| Počet podpořených vzdělávacích zařízení | 5 | 1 | 7 | 140,00% |
| Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | 180 | 18 | 488 | 271,11% |
| Opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu | | | | |
| Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě | 6 | 3 | 13 | 216,67% |

3.2.3. Plnění finančního plánu Programového rámce IROP

V 1/2021 byla schválena změna finančního plánu programového rámce IROP jejímž obsahem byla úprava podle skutečného čerpání v roce 2021 a převod zbývající nezazávazkovane alokace (uspořená z již zrealizovaných projektů) ve výši 94.898,49 Kč (příspěvek EU) z opatření 1. Vzdělávání do opatření 2. Bezpečnost silničního provozu

K 31.12.2021 máme zrealizované projekty za 20.470.539,17,- Kč, což je o 638.984,18 Kč (2,93%) méně než je uvedeno v aktualizovaném finančním plánu. Důvodem je to, že v průběhu roku 2021 bylo ukončeno několik projektů, které oproti částkám uvedeným v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (plán financování) ušetřily finance díky provedeným výběrovým řízením.

V případě Opatření 1 - Vzdělávání bohužel úspora vznikla až po ukončení výzvy pro příjem žádostí č.8-IROP. Protože nedošlo k převisu žádostí v této výzvě, tak nešlo o tuto částku výzvu dodatečně navýšit a tím volné finance urychleně znova využít. Navíc dle podmínek IROP byl rok 2021 rokem posledním, kdy bylo možné výzvu vyhlásit. To znamená, že částka 28.737,51 Kč (0,38% alokace opatření 1) propadla a MAS Holicko ji již nebude moci využít.

U Opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu se totéž týká částky 79.927,95 Kč (0,56% alokace opatření 2). Zbylá částka (530.318,72 Kč) byla již znova využita pro projekt vybraný v rámci výzvy č. 8-IROP.

Na druhou stranu můžeme konstatovat, že MAS Holicko nemá problém s dosažením milníku IROP pro rok 2021, který byl stanoven řídícím orgánem: předložené žádosti o platbu do 31.10.2021 ve výši 70,00% celkové alokace SCLLD. V případě MAS Holicko jsme dosáhli na 93,82%, což je dokonce vyšší hodnota než je milník pro rok 2022 (84,85%)

Tabulka 23 – Plnění finančního plánu Programového rámce IROP uvedeného v SCLLD v období 2016 – 2021

| FINANČNÍ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD – OBDOBÍ 2016 - 2021 | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|--|
| Opatření/Fiche SCLLD | PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) | | | | Nezpůsobilé výdaje (Kč) | Kumulativní % čerpání alokace | | |
| | Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho Podpora | | Z toho Vlastní zdroje příjemce | | | | |
| | | Příspěvek Unie | Národní veřejné zdroje | | | | | |
| 1. Vzdělávání | 7.938.775,56 | 7.541.836,75 | 0 | 396.938,81 | 0 | 100% | | |
| 2. Bezpečnost silničního provozu | 14.281.775,79 | 13.567.686,60 | 0 | 714.089,19 | 0 | 95,03% | | |
| Celkem | 22.220.551,35 | 21.109.523,35 | 0 | 1.111.028,00 | 0 | 96,75% | | |

| SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ – OBDOBÍ 2016 - 2021 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|--|
| Opatření/Fiche SCLLD | PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) | | | | Nezpůsobilé výdaje (Kč) | Kumulativní % čerpání alokace | | |
| | Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho Podpora | | Z toho Vlastní zdroje příjemce | | | | |
| | | Příspěvek Unie | Národní veřejné zdroje | | | | | |
| 1. Vzdělávání | 7.908.525,55 | 7.513.099,24 | 0 | 395.426,31 | 58.613,26 | 85,31% | | |
| 2. Bezpečnost silničního provozu | 13.663.241,02 | 12.957.439,93 | 0 | 705.801,09 | 452.772,75 | 75,55% | | |
| Celkem | 21.571.766,57 | 20.470.539,17 | 0 | 1.101.227,40 | 511.386,01 | 93,82% | | |

| SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI S PLÁNEM – OBDOBÍ 2016 - 2021 | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|--|
| Opatření/Fiche SCLLD | PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) | | | | Nezpůsobilé výdaje (Kč) | Kumulativní % čerpání alokace | | |
| | Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho Podpora | | Z toho Vlastní zdroje příjemce | | | | |
| | | Příspěvek Unie | Národní veřejné zdroje | | | | | |
| 1. Vzdělávání | - 30.250,01 | - 28.737,51 | - | - 1.512,50 | + 58.613,26 | -0,38% | | |
| 2. Bezpečnost silničního provozu | - 618.534,77 | - 610.246,67 | - | - 8.228,10 | + 452.772,75 | -4,27% | | |
| Celkem | - 648.784,78 | - 638.984,18 | - | - 9.800,60 | + 511.386,01 | -2,93% | | |

*Veškeré částky jsou v případě Programového rámce IROP počítány ze Žádostí o platbu podaných na CRR do 31.10.2020

3.3. Místa realizace podpořených projektů

Následující tabulka uvádí místa realizace podpořených (již proplacených) projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených od začátku realizace Strategie CLLD, tj. od 18.8.2016.

Počet míst realizace neodpovídá zcela přesně počtu podpořených projektů, neboť některé projekty jsou realizovány na více místech (oplocenky).


Jak je vidět, již teď se daří pokrýt skoro celé území MAS. Zatím jediná obec, která nevyužila dotací MAS Holicko je obec Týništěko. Prozatím je nejméně podpořených projektů z území obcí Radhošť, Uhersko, Vysoké Chvojno a Jaroslav. Naopak nejvíce peněz prozatím získalo území obcí Horní Ředice, Dolní Roveň, Ostřetín, Chvojenec a Horní Jelení.


Tabulka 24 – Místa realizace podpořených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 – 2021

| Místo realizace podpořených projektů | Rok 2021 | | | Celkem 2016 - 2021 | % |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|--------|
| | Výzvy prog.rámců PRV a IROP | Výzvy Malý LEADER | Celkem rok 2021 | | |
| Býšť | 0 | 0 | 0 | 1.404.216,86Kč (2,31 projektů) | 4,41% |
| Dolní Roveň | 998.362,12Kč (1 projekt) | 0 | 998.362,12Kč (1 projekt) | 4.480.837,20Kč (5 projektů) | 14,07% |
| Dolní Ředice | 0 | 0 | 0 | 2.122.339,46Kč (6 projektů) | 6,66% |
| Holice | 356.804,-Kč (2 projekty) | 0 | 356.804,-Kč (2 projekty) | 1.217.380,55Kč (12 projektů) | 3,82% |
| Horní Jelení | 0 | 0 | 0 | 3.461.035,80Kč (5 projektů) | 10,87% |
| Horní Ředice | 1.399.129,-Kč (2 projekty) | 0 | 1.399.129,-Kč (2 projekty) | 5.181.483,31Kč (10 projektů) | 16,27% |
| Chvojenec | 2.626.937,62 (4 projekty) | 0 | 2.626.937,62 (4 projekty) | 3.489.688,37Kč (11,06 projektů) | 10,96% |

| Místo realizace podpořených projektů | Rok 2021 | | | Celkem 2016 - 2021 | % |
|--------------------------------------|---|----------------------|---|--|-------------|
| | Výzvy prog.rámců PRV a IROP | Výzvy Malý LEADER | Celkem rok 2021 | | |
| Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 920.378,22Kč (2 projekty) | 2,89% |
| Ostřetín | 0 | 0 | 0 | 4.073.920,13Kč (9 projektů) | 12,79% |
| Poběžovice u Holic | 895.500,-Kč (1 projekt) | 0 | 895.500,-Kč (1 projekt) | 1.050.031,57Kč (2,68 projektu) | 3,30% |
| Radhošť | 0 | 0 | 0 | 59.900,-Kč (2 projekty) | 0,19% |
| Trusnov | 947.605,79Kč (1 projekt) | 0 | 947.605,79Kč (1 projekt) | 2.021.889,14Kč (3 projekty) | 6,35% |
| Týniště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Uhersko | 320.934,65Kč (1 projekt) | 0 | 320.934,65Kč (1 projekt) | 345.834,65Kč (2 projekty) | 1,09% |
| Vysoké Chvojno | 707.932,-Kč (2 projekty) | 0 | 707.932,-Kč (2 projekty) | 885.166,16Kč (4,62 projektu) | 2,78% |
| Nová Ves | 974.117,64Kč (1 projekt) | 0 | 974.117,64Kč (1 projekt) | 1.133.626,75Kč (2,34 projektu) | 3,56% |
| Celkem | 9.227.322,82Kč (15 projektů) | 0 | 9.227.322,82Kč (15 projektů) | 31.847.728,17Kč (79 projektů) | 100% |

Místa realizace podpořených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2016 - 2021 dle kategorii žadatelů

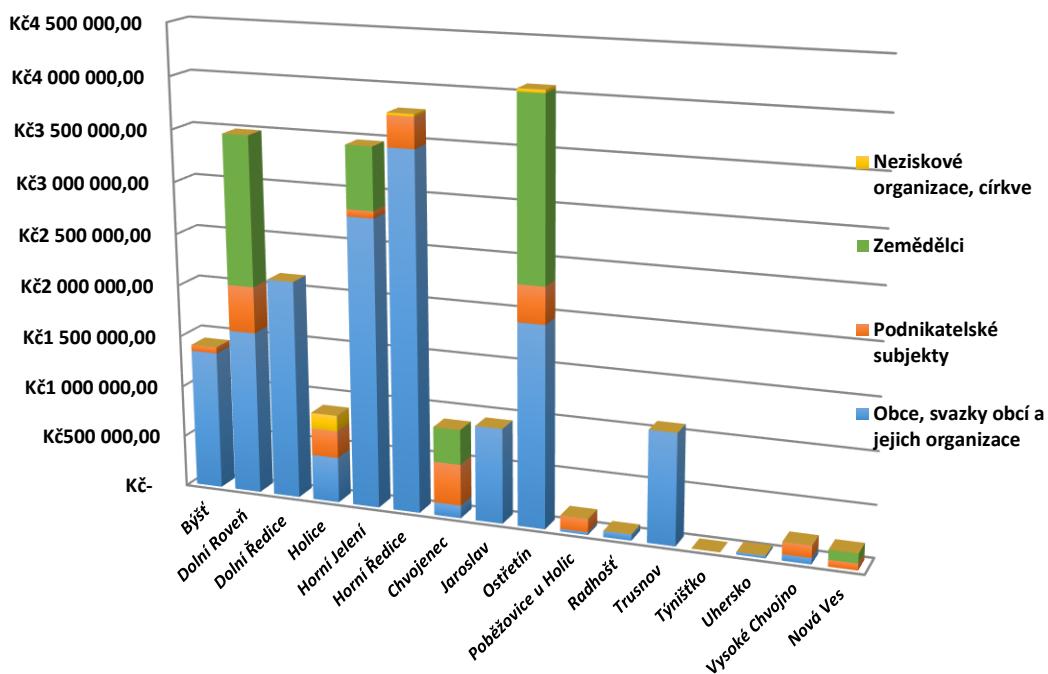

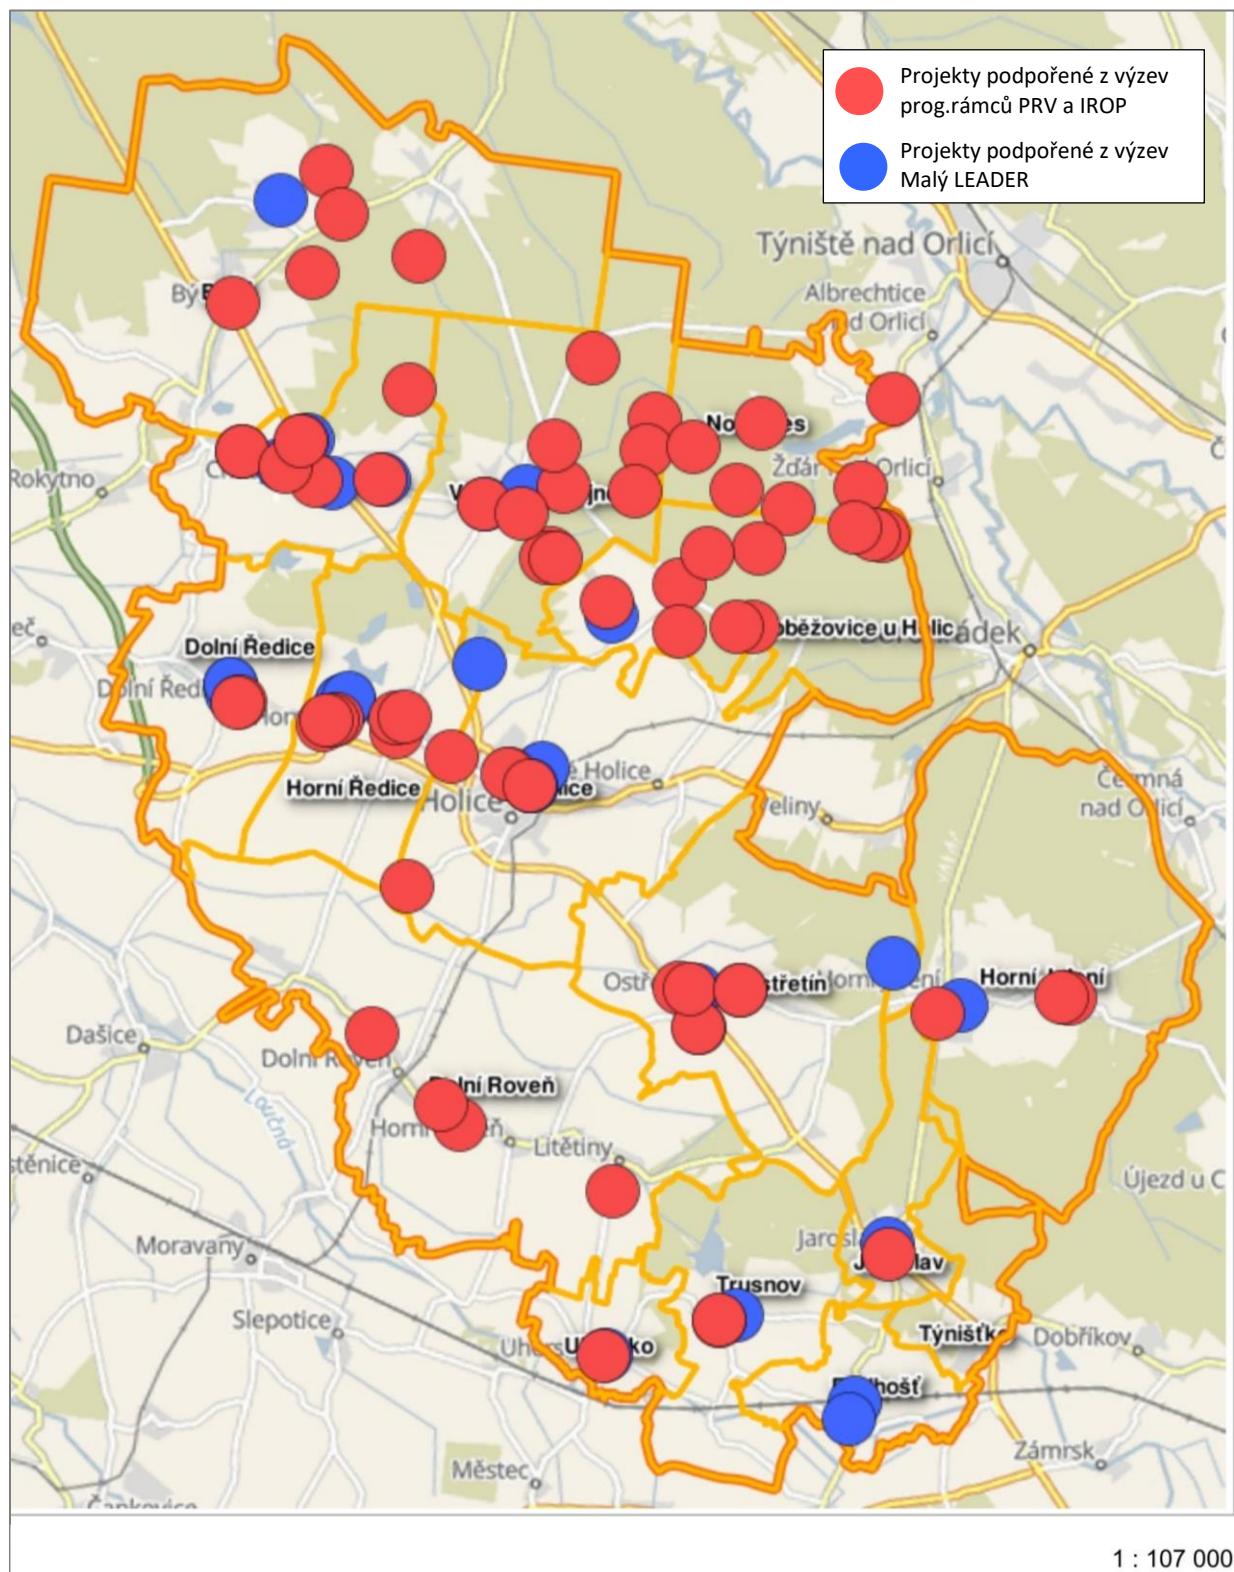

3.4. Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo programové rámce

Ihned po ukončení sledovaného období bylo provedeno šetření na území Holicka o naplňování cílů strategie CLLD MAS Holicko, které si stanovila MAS mimo programové rámce PRV a IROP.

Počátkem 2/2022 byli osloveni všichni starostové obcí z územní působnosti MAS, členové MAS a další aktéři z území, jež má MAS ve svém adresáři se žádostí o vyplnění údajů do vytvořeného dotazníku. Ten byl zaměřen na zjištění počtu projektů, které se na Holicku ve sledovaném období realizovaly. Mohlo se jednat o projekty realizované z evropských fondů, národních dotací, dotací Pardubického kraje nebo i třeba z vlastních zdrojů.

Protože návratnost dotazníků byla malá (odpovědělo pouze 22 respondentů), tak kancelář MAS zjišťovala informace o realizovaných projektech ještě na těchto portálech:

- DotInfo (Informace o Dotacích a návratných finančních výpomocích EDS) - <https://www.dotinfo.cz/Default.aspx>
- DotaceEU - <https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznamy-prijemu>
- Informace o poskytnutých účelových dotacích ze státního rozpočtu (evidovaných v centrálním registru dotací) - <https://red.financnisprava.cz/>

Na základě výsledků těchto šetření můžeme konstatovat, že skutečnost předčila předpoklady z přelomu let 2015/2016, kdy Strategie CLLD vznikala. Protože již teď 2 roky před ukončením programového období (2023) jsou indikátory plněny na cca 127 %. Toto je potřeba vzít v potaz při tvorbě nové Strategie CLLD 2021-2027 a pro příští programové období lépe (pozitivněji) naplánovat plnění indikátorů.

V rámci klíčové oblasti A. Partnerská spolupráce je největší rozdíl mezi předpokladem a skutečným plněním. Indikátory jsou plněny na 533%. Důvodem je to, že projekty založené na spolupráci několika jiných subjektů, ať již na regionální, národní nebo mezinárodní úrovni realizovaly i jiné subjekty v území než pouze MAS Holicko (Dobrovolný svazek obcí Holicka, Rodinné centrum Holoubek, ZUŠ Karla Malicha, Dětský domov Holice).

Konkrétně ve sledovaném období pokračovala na území Holicka realizace projektů z předchozích let „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II“ (partnerství MŠ, ZŠ, školských zařízení a jejich zřizovatelů z Holicka), „Komunitní plánování sociálních služeb“ (partnerství poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Holicka). V rámci mimoregionálních projektů taktéž probíhala již navázaná spolupráce z předchozích let „Pardubicko – Perníkové srdce Čech“ (partnerství subjektů působících v cestovním ruchu na území celého Pardubicka) a „Zájmové vzdělávání nás baví!“ (partnerství s NNO řešícími zájmové vzdělávání dětí na území Holicka, Polička a Kunětické hory).

Tabulka 25 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo programové rámce k 31.12.2021 – Klíčová oblast A. Partnerská spolupráce

| Název opatření / indikátoru | Plán uvedený v SCLLD | Plnění | | |
|--|----------------------|----------|--------------------|---------|
| | | Rok 2021 | Celkem 2016 - 2021 | % |
| Opatření: A.1.1.1 Aktivní tvorba dostatečného prostoru na setkávání, navazování kontaktů a spolupráci nejrůznějších subjektů ať již vně, či uvnitř jednotlivých sektorů a zájmových skupin místního partnerství | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 1 | 0 | 5 | 500,00% |
| Počet vytvořených partnerství v rámci regionu MAS Holicko | 2 | 0 | 2 | 100,00% |

| Opatření: A.1.2.1 Přenos zkušeností a aktivní spolupráce na regionální, národní i mezinárodní úrovni | | | | |
|---|----------|----------|-----------|----------------|
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 2 | 0 | 11 | 550,00% |
| Počet vytvořených partnerství s aktéry mimo území MAS Holicko | 3 | 0 | 2 | 66,67% |
| 92501 - Celkové veřejné výdaje (O.1) (EUR) | 0 | 0 | 0 | - |
| Počet realizovaných projektů v rámci Klíčové oblasti A celkem | 3 | 0 | 16 | 533,33% |

V rámci klíčové aktivity B. Kvalitní život v obcích jsme na přibližně 121% plnění indikátorů. Nejvíce zrealizovaných projektů je z opatření zaměřených na školství (125), volnočasové aktivity (68), kulturu a sport (58) a veřejná prostranství (51). Naopak nejméně projektů bylo z opatření dopravní dostupnost (2) a rozvoj komunitních služeb (10). Žádný projekt se netýkal zlepšení dohledu nad veřejným pořádkem

Tabulka 26 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo programové rámce k 31.12.2021 – Klíčová oblast B. Kvalitní život v obcích

| Název opatření /indikátoru | Plán uvedený v SCLLD | Plnění | | |
|--|----------------------|----------|--------------------|---------|
| | | Rok 2021 | Celkem 2016 - 2021 | % |
| Opatření: B.1.1.1 Obnova a kultivace veřejných prostranství a center obcí | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 60 | 7 | 51 | 85,00% |
| Opatření: B.1.1.2 Rozvoj komunitních služeb a vybavenosti obcí | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 10 | 4 | 10 | 100,00% |
| Opatření: B.1.1.3 Podpora školství a celoživotního vzdělávání | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 60 | 20 | 125 | 208,33% |
| 50000 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení | 5 | 1 | 7 | 140,00% |
| 50001 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení | 180 | 18 | 488 | 271,11% |
| 50030 - Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém | 5,00% | - | - | - |
| Opatření: B.1.1.4 Podpora sociálních služeb a zapojení sociálně a jinak znevýhodněných skupin občanů do života v obcích a v regionu | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 10 | 3 | 16 | 160,00% |
| Opatření: B.2.1.1 Volnočasové aktivity a spolkový život | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 30 | 3 | 68 | 226,67% |
| 92702 - Počet podpořených operací | 5 | 3 | 3 | 60,00% |
| 94800 - Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Opatření: B.2.1.2 Kulturní, společenské a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 60 | 5 | 58 | 96,67% |
| 92702 - Počet podpořených operací | 3 | 1 | 1 | 33,33% |
| 94800 - Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Opatření: B.3.1.1 Rozvoj technické infrastruktury | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 20 | 4 | 16 | 80,00% |
| Opatření: B.3.1.2 Rozvoj dopravní infrastruktury | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 30 | 1 | 15 | 50,00% |
| Opatření: B.3.1.3 Dopravní dostupnost a obslužnost regionu | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 5 | 0 | 2 | 40,00% |

| Název opatření /indikátoru | Plán uvedený v SCLLD | Plnění | | |
|--|----------------------|-----------|--------------------|----------------|
| | | Rok 2021 | Celkem 2016 - 2021 | % |
| Opatření: B.4.1.1 Podpora bezpečnosti silničního provozu a rozvoj cyklodopravy v obcích regionu | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 20 | 3 | 24 | 120,00% |
| 75001 - Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě | 6 | 3 | 13 | 216,67% |
| 75120 - Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě | 35% | - | - | - |
| Opatření: B.4.1.2 Zlepšení dohledu nad veřejným pořádkem | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 5 | 0 | 0 | 0% |
| Opatření: B.4.1.3 Protipovodňová a požární prevence | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 20 | 1 | 15 | 75,00% |
| Počet realizovaných projektů v rámci Klíčové oblasti B celkem | 330 | 51 | 400 | 121,21% |

V rámci klíčové aktivity C. Podpora podnikání a zaměstnanosti jsme na 132% plnění indikátorů. Oznámené zrealizované projekty jsou z opatření zaměřených na drobné nezemědělské podnikání (26), zemědělské podnikání (16), lesní hospodářství (10), na podporu zaměstnanosti (8) i na podporu regionálních produktů a řemesel (2).

Tabulka 27 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo programové rámce k 31.12.2021 – Klíčová oblast C. Podpora podnikání a zaměstnanosti

| Název opatření | Plán uvedený v SCLLD | Plnění | | |
|---|----------------------|-----------|--------------------|----------------|
| | | Rok 2021 | Celkem 2016 - 2021 | % |
| Opatření: C.1.1.1 Podpora rozvoje zemědělského podnikání | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 15 | 0 | 16 | 106,67% |
| 93701 - Počet podpořených podniků / příjemců | 7 | 0 | 5 | 71,43% |
| 94800 - Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) | 1 | 0 | 1 | 100,00% |
| Opatření: C.1.1.2 Podpora lesního hospodářství | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 10 | 3 | 10 | 100,00% |
| 92702 - Počet podpořených operací | 5 | 1 | 3 | 60,00% |
| 93001 - Celková plocha (ha) | 23,59 | 10 | 18,59 | 78,80% |
| Opatření: C.1.2.1 Podpora drobného podnikání, rozvoje služeb a tradičních řemesel | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 20 | 9 | 26 | 1300,00% |
| 93701 - Počet podpořených podniků / příjemců | 23 | 6 | 16 | 69,57% |
| 94800 - Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) | 1 | 0 | 1 | 100,00% |
| Opatření: C.1.2.2 Podpora regionálních produktů, řemesel a služeb včetně jejich propagace | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 1 | 1 | 2 | 200,00% |
| Opatření: C.2.1.1 Podpora zaměstnanosti a rozvoj vzdělanosti v souladu s potřebami regionu | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 1 | 1 | 8 | 800,00% |
| Počet realizovaných projektů v rámci Klíčové oblasti C celkem | 47 | 14 | 62 | 131,91% |

V rámci klíčové aktivity D. Rozvoj cestovního ruchu jsme na přibližně 64% plnění indikátorů, tj. jedná se o nejméně řešenou oblast na Holicku. A to bohužel i přesto, že původní plán byl pouze v počtu jednotek realizovaných projektů. Jednak se jedná o dlouhodobý trend, který byl zřetelný při každém hodnocení realizace Strategie CLLD. Ale navíc ve sledovaném roce byla tato oblast jako nejvíce ze všech zasažena celostátními opatřeními proti COVIDU.

Oznámené zrealizované projekty jsou z opatření zaměřených na podporu turisticky významných objektů (7), propagaci regionu (6), infrastrukturu cestovního ruchu (4) a rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit (1). Žádný projekt se netýkal cykloturistiky a informačních center.

MAS Holicko se také snaží přispět k plnění této klíčové aktivity prostřednictvím založení a fungování destinační společnosti Pardubicko – perníkové srdce Čech, díky které je oblast Pardubicka propagována nejen po celé ČR, ale i v jiných evropských zemích.

V oblasti cykloturistiky víme, že v území vznikají projektové dokumentace ke vzniku cyklostezek Holice – Veliny, Holice – Horní Ředice. Ale bohužel přípravné práce jsou časově hodně náročné.

Z tohoto pohledu je jasné, že by MAS i její partneři měli iniciovat území i k jiné podpoře cestovního ruchu v regionu, např. zlepšení služeb informačního centra, vznik naučných stezek, budování nových turistických atraktivit (např. vyhlídky, rozhledny, obecní muzea,...), rozvoj ubytovacích a stravovacích zařízení, vydání nových propagačních a informačních materiálů, mapování kulturního a historického dědictví nebo místních tradic, apod.

Tabulka 28 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo programové rámce k 31.12.2021 – Klíčová oblast D. Rozvoj cestovního ruchu

| Název opatření | Plán uvedený v SCLLD | Plnění | | |
|---|----------------------|----------|--------------------|---------------|
| | | Rok 2021 | Celkem 2016 - 2021 | % |
| Opatření: D.1.1.1 Infrastruktura pro cestovní ruch (rozhledny, pěší stezky, naučné stezky, půjčovny sportovních potřeb, servis, apod.) | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 5 | 1 | 4 | 80,00% |
| Opatření: D.1.1.2 Podpora turisticky a historicky významných objektů | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 15 | 4 | 7 | 46,67% |
| Opatření: D.1.2.1 Rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit v oblasti venkovské turistiky | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 3 | 0 | 1 | 33,33% |
| Opatření: D.1.2.2 Podpora cykloturistiky | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 3 | 0 | 0 | 0% |
| Opatření: D.2.1.1 Podpora informačních a návštěvnických center a jejich spolupráce | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Opatření: D.2.1.2 Propagace regionu (i mimo jeho území) a v něm působících subjektů | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 1 | 1 | 6 | 600,00% |
| Počet realizovaných projektů v rámci Klíčové oblasti D celkem | 28 | 5 | 18 | 64,29% |

V rámci klíčové aktivity E. Životní prostředí jsou indikátory naplňovány lépe, než bylo při tvorbě strategie očekáváno (244%). Důvodem je to, že původně bylo odhadováno plnění v rámci jednotek (18 projektů), tudíž i když se zrealizovalo ve sledovaném období 44 projektů, tak procentní překročení plánovaného plnění je veliké.

Oznámené zrealizované projekty jsou z opatření zaměřených na hospodaření s odpady (13), udržitelné nakládání s přírodními zdroji (13), zachování a obnovu krajinných hodnot (7), zlepšení vodního režimu krajiny (6) a udržitelné obhospodařování krajiny (1). Naopak žádný projekt se netýkal revitalizace černých skládek a vzdělávání v oblasti životního prostředí.

Tabulka 29 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo programové rámce k 31.12.2021 – Klíčová oblast E. Životní prostředí

| Název opatření | Plán uvedený v SCLLD | Plnění | | |
|---|----------------------|----------|--------------------|----------------|
| | | Rok 2021 | Celkem 2016 - 2021 | % |
| Opatření: E.1.1.1 Zachování a obnova krajinných hodnot a přírodního dědictví | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 5 | 0 | 7 | 140,00% |
| Opatření: E.1.1.2 Udržitelné obhospodařování krajiny | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 2 | 0 | 1 | 50,00% |
| Opatření: E.1.1.3 Zlepšování vodního režimu v krajině a hospodaření s vodou | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 2 | 1 | 6 | 300,00% |
| Opatření: E.2.1.1 Zkvalitnění hospodaření s odpady | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 3 | 1 | 13 | 433,33% |
| Opatření: E.2.1.2 Revitalizace černých skládek a zátěží | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Opatření: E.3.1.1 Udržitelné nakládání s přírodními zdroji | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 2 | 2 | 13 | 650,00% |
| Opatření: E.3.1.2 Vzdělávání, informovanost, výchova a zapojování veřejnosti v oblasti životního prostředí | | | | |
| Počet realizovaných projektů v rámci opatření | 2 | 4 | 4 | 200,00% |
| Počet realizovaných projektů v rámci Klíčové oblasti E celkem | 18 | 8 | 44 | 244,44% |

3.5. Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie

Synergické efekty se začínají pomalu projevovat, i když zatím pouze v omezeném rozsahu. To je způsobeno i nízkou finanční alokací, kterou má MAS Holicko k dispozici na celé období 2016 - 2023 (necelých 38 mil. Kč). Takže ani po zrealizování všech podpořených projektů nebudou efekty tak zřetelné, jako kdybychom měli financí dvojnásobek.

Synergický efekt je asi nejvýraznější v oblasti podpory vzdělávání: provázanost animačních aktivit MAS Holicko v animaci škol v OP VVV s aktivitami projektu Místního akčního plánu vzdělávání (realizátor MAS Holicko) a i s právě realizovanými projekty z opatření 1 - Vzdělávání zaměřenými na podporu jazykového, přírodovědného a polytechnického vzdělávání.

Další oblastí je bezpečnost silničního provozu. Zde se díky realizaci jednotlivých projektů postupně zvyšuje bezpečnost silniční a pěší dopravy v jednotlivých obcích regionu Holicka, který je celý zatížen intenzivní automobilovou dopravou (především podél silnic I/35 a I/36 a návazných komunikací). Navíc řešené chodníky zlepšují přístup k občanské vybavenosti v obcích - mimo jiné se jedná o chodníky u základních škol, které jsou podporovány v rámci opatření 1 nebo o chodníky u mateřských škol, sportovišť, kulturních zařízení, apod., jejichž rekonstrukce byla podporována v předchozím programovém období 2007 - 2013 a v současném období je podporována jejich údržba a vybavení v

rámci Fiche 7 - Podpora spolkové činnosti údržba a v rámci výzev Malého LEADERu (přerozdělení financí Programu obnovy venkova Pardubického kraje prostřednictvím MAS).

V případě fichí PRV je podporován rozvoj drobného podnikání na Holicku, ať už se jedná o zemědělce nebo nezemědělské podnikatele. Bohužel, zde se kvůli opravdu nízké finanční alokaci Strategie CLLD a různých typů žádajících podnikatelů (zemědělci, jezdecká stáj, výrobci potravin, catering, pohostinství, truhlářství, stavební firma, zámečnictví,....), synergické efekty až tolik neprojevují. Jedinou spojující aktivitou je propojení regionálních producentů podpořených z výzev PRV s aktivitami projektu Kraj Pernštejnů - regionální produkt (MAS Holicko je jedním z realizátorů) a kampaní na podporu lokální ekonomiky Regiony sobě!. Další vazbu lze vysledovat v propojení podnikatelů zaměřených na cestovní ruch a pohostinství s aktivitami Turistické oblasti Pardubicko (MAS Holicko je jedním ze zakládajících členů).

3.6. Horizontální principy

Strategie CLLD MAS Holicko nemá negativní vliv na žádné z horizontálních témat. Jednotlivé specifické cíle a opatření jsou naplňovány dílčími projekty zohledňujícími požadavky na horizontální téma (Udržitelný rozvoj, Rovné příležitosti a zákaz diskriminace a Rovnost mezi muži a ženami). Povinností konečných žadatelů je zajištění alespoň neutrálního vztahu k daným tématům.

Nadto v rámci hodnocení a výběru projektů jsou zvýhodňovány ty projekty, jež mají pozitivní vliv na horizontální téma (především udržitelný rozvoj). Z tohoto důvodu byly podpořeny žadosti zaměřené na pořízení technologií a strojů šetrných k životnímu prostředí nebo jejichž součástí je i výsadba zeleně. A například projekty z programového rámce IROP (školy, chodníky) musí splňovat podmínky bezbariérovosti, jež je základním požadavkem na přijatelnost projektu.

4. Animace strategie CLLD

Animační aktivity MAS jsou všechny činnosti MAS v rámci SCLLD, které nezahrnují vyhlašování výzev a administraci projektů konečných žadatelů/příjemců. Jedná se především o používané komunikační strategie a z nich vycházející komunikační aktivity, které slouží k informování veřejnosti o SCLLD, dále k přenosu informací ke konkrétním žadatelům či zájemcům o podání žádosti o podporu v rámci SCLLD, podpoře žadatelů při realizaci svých projektů či nastavení celkových procesů toku informací mezi všeobecnou veřejností, zájemci, žadateli a dalšími aktéry na území.

V roce 2021 byla uspořádána 1 veřejně přístupná valná hromada MAS Holicko (22.6.2021), přítomní zde byli informováni o průběhu realizace CLLD.

Tabulka 30 – Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí

| | Plán uvedený v SCLLD | Plnění | | |
|---|----------------------------|----------|-----------------------|--------|
| | | Rok 2021 | Celkem 2016 - 2021 | % |
| Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí | 26 | 1 | 24 | 92,31% |

Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitolách níže.

4.1. Propagace strategie CLLD

Ve sledovaném období bylo cílem informovat území o tom, že MAS Holicko realizuje SCLLD a také všechny potencionální předkladatele projektů seznámit se zaměřením jednotlivých opatření a s pravidly administrace. Pro toto období byly voleny následující prostředky propagace:

- Využití **roll-upu, propagačních předmětů a letáků**, které si MAS Holicko nechala vyrobit v předcházejících letech. Mimoto ve sledovaném období byly pořízeny nové propagační předměty (papírové tašky a hry Mikado, Paddle Ball), které jsou distribuovány do území.
- **Informační tabule pro projekty podpořené MAS** jsou rozdávány všem příjemcům dotace po úspěšné realizaci jejich projektu. Příjemce dotace má povinnost tuto tabulku umístit na viditelném místě v místě realizace projektu. Tímto krokem se zvyšuje informovanost území o činnosti MAS Holicko a samotné realizaci SCLLD.
- **Webové stránky** (www.holicko.cz) a **facebook** (<https://www.facebook.com/mas.holicko>) MAS Holicko – informace o připravovaných a právě vyhlášených výzvách a realizovaných akcích v rámci SCLLD.
- **Vizitky** manažerek pro SCLLD – rozdávány jak na osobních konzultacích, tak i na kulturních, propagačních a vzdělávacích akcích, kterých se pracovníci MAS účastní.
- **Zpravodaj MAS Holicko** (duben, srpen a prosinec 2021) – informace o připravovaných a právě vyhlášených výzvách a realizovaných akcích v rámci SCLLD. Distribuce probíhá prostřednictvím partnerů MAS a obecních úřadů na území MAS a dále na webu a facebooku MAS.
- **Výroční zpráva MAS Holicko** za rok 2020 – zveřejnění výsledků, kterých bylo za příslušný rok dosaženo.
- **Tiskové zprávy** – krátké přehledné informace zveřejněné zejména na facebooku, ale i v místních zpravodajích nebo na letáčcích, jež jsou pojmenovány jako **Maskoviny** (avíza výzev, nová Fiche, vybrané projekty, apod.).
- **Rozesílání důležitých informací do e-mailových schránek** partnerům MAS, klíčovým aktérům z území MAS a všem subjektům, které má MAS v adresáři – informace o vyhlášení výzvy a jejich důležitých milnících (např. přijaté žádosti o podporu, schválené žádosti o podporu, apod.).
- **Účast na regionálních akcích** – Holické slavnosti (11.9.2021) – prezentace realizace SCLLD na Holicku.
- **Pořádání valných hromad MAS Holicko, které byly veřejně přístupné** (22.6.2021) – Zde byli přítomní informováni o průběhu realizace CLLD.

4.2. Podpora žadatelů

Telefonické, e-mailové a osobní konzultace s pracovníky MAS. – Konečným žadatelům, resp. příjemcům je poskytnuta podpora ze strany pracovníků MAS. Žadatelům jsou zprostředkovávány přes pracovníky MAS informace z řídících orgánů a naopak. Na druhou stranu pracovníci MAS u příjemců zjišťují informace o průběhu realizace projektu a reagují na možné problémy.

Příručky pro žadatele – Manažerky MAS zpracovaly pro každou vyhlášenou Fichi / opatření samostatnou Příručku pro žadatele. V nich žadatel najde informace jak vyplnit žádost o podporu,

seznam povinných a nepovinných příloh, seznam způsobilých a nezpůsobilých výdajů, kritéria hodnocení přijatelnosti, bodovací tabulky a další důležité informace související se zpracováním projektů. Příručky jsou zveřejněny vždy u konkrétní výzvy nebo jsou rozdávány vytiskněné na seminářích pořádaných MAS.

Pořádání seminářů pro žadatele v rámci každé výzvy – Ve sledovaném období bylo výjimečně upuštěno od pořádání seminářů pro žadatele do vyhlášené výzvy č. 8-IROP. Důvodem byla dosavadní zkušenost s jedinými možnými žadateli této výzvy – starosty obcí: nezájem o semináře, protože zpracování žádosti o dotaci zadávají externím poradcům, kteří dávají přednost individuálním konzultacím.

4.3. Animace školských zařízení v OPVVV

V průběhu sledovaného období také samozřejmě probíhala animace školských zařízení v OP VVV, v rámci které manažerky MAS poskytují MŠ, ZŠ a střediskům volného času z regionu Holicka **konzultace (telefonické, e-mailové a osobní)**, zprostředkovávají kontakt s MŠMT, pomáhají se založením žádosti o dotaci, oznámením změny, žádostí o proplacení, jejím vyplněním a odesláním.

Naši pomoc využívají všechny školy na Holicku, některé více a některé méně. Školy, kterým pomáháme intenzivněji s podáváním žádostí a následnou realizací aktivit, již získaly z OP VVV cca 7,5 mil. Kč pro další vzdělávání pedagogů, na mzdu chůvy nebo školního asistenta, projektové dny, apod.

V roce 2021 jsme pomohli:

- 5 MŠ a 2 ZŠ podat žádost o podporu na Šablony III a průběžnou zprávu o realizaci,
- 3 MŠ, 2 ZŠ a 1 ZUŠ požádat o změnu projektu a podat závěrečnou zprávu o realizaci Šablon II.

Samozřejmě manažerky MAS se také účastní různých školení k tomuto tématu.

4.4. Vzdělávání zaměstnanců a partnerů MAS

Ve sledovaném období se manažerky MAS **zúčastnily 42 školení (workshopy, semináře, konference, webináře,...) věnovaných realizaci CLLD**:

- Tematický seminář „Senioři a venkov“ pořádaný NS MAS 7.1.2021 on-line,
- Tematický seminář „Mládež a venkov“ pořádaný NS MAS 8.1.2021 on-line,
- Veletrh „Úspěch pro každého žáka 2021“ pro Místní akční plány pořádaný Stálou konferencí asociací ve vzdělávání, z.s. 21.1.2021 on-line,
- Workshopy v rámci Veletrhu úspěch pro každého žáka „Jak prostřednictvím vzdělávání rozvíjet pedagogický leadership u ředitelů“ a „Příklady sítěvání škol a školských zařízení a vytváření sítě podpory“ pořádaný SKAV 22.1.2021 on-line,
- Seminář „Setkání příjemců IPo MAP“ pořádaný NPI ČR Pardubice 3.2.2021 on-line,
- Tematický den „MAS a CLLD v OPZ+ 2021 – 2027“ pořádaný NS MAS 8.2.2021 on-line,
- Seminář „Chytrý venkov III“ pořádaný Středočeským krajem 25.2.2021 on-line,
- Kurz IT dovedností „MS Word“ pořádaný NS MAS 24.2., 25.2., 3.3., 4.3.2021 on-line,
- Seminář „Umění empatie v týmu aneb EMOČNÍ INTELIGENCE pro managery“ pořádaný P-PINK 10.3.2021 on-line,
- Seminář OP VVV „Workshop pro žadatele - výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území, aktivita A“ pořádaný MŠMT 23.3.2021 on-line,

- Informační seminář k využití struktury MAS metody CLLD/LEADER v programovém období 2020-2027 pořádaný NS MAS 30.3.2021 on-line,
- Kurz IT dovedností „MS Excel“ pořádaný NS MAS 24.3., 25.3., 30.3., 31.3.2021 on-line,
- Kurz IT dovedností „MS Power Point“ pořádaný NS MAS 6.4., 7.4., 13.4., 14.4.2021 on-line,
- Diskusní fórum „Jak neztratit hlavu v době velkých společenských transformací“ pořádaný ČMKOS dne 28.4.2021 on-line,
- Seminář „Problematika rozvoje Pardubického kraje“, pořádaný Pardubickým krajem 29.4.2021 on-line,
- Tematický den „Spolupráce a podpora rozvoje venkovských knihoven místními akčními skupinami v novém programovém období 2021-2027“ pořádaný NS MAS dne 17.5.2021 on-line,
- Webinář „Parádní příležitosti pro podnikatele“ pořádané Pardubickým krajem dne 19.5.2021 on-line,
- Seminář „Setkání příjemců IPo MAP“ pořádaný NPI ČR Pardubice 26.5.2021 on-line,
- Seminář „Asertivita pro pedagogické pracovníky“ pořádaný MAS Holicko 27.5.2021 v Holicích,
- Tematický den „Inspirativní aktivity v OPZ+“ pořádaný NS MAS dne 28.5.2021 on-line,
- Tematický den „Koncept chytrého venkova – trendy a vize“ pořádaný NS MAS dne 9.6.2021 on-line,
- Tematický den „Úvod do světa komunitní energetiky pro MAS“ pořádaný NS MAS dne 14.6.2021 on-line,
- Akce „Podnikej kreativně: design, podnikání, kreativita, spolupráce“ pořádaný P-PINK dne 15.6.2021 v Pardubicích,
- Tematický den „Představení pilotáže Středního článku podpory regionálního školství zástupci MŠMT“ pořádaný NS MAS dne 15.6.2021 on-line,
- Workshop „Zkušenosti se sociálními sítěmi a PR“ pořádaný NPI ČR Pardubice 21.6.2021 on-line,
- Tematický den „Jak se zapojit do vývoje středního článku od příštího školního roku v rámci projektu Partnerství 2030+“ pořádaný NS MAS dne 23.6.2021 on-line,
- Seminář „Obnovitelné zdroje energie“ pořádaný KS MAS Pardubického kraje dne 28.6.2021 on-line,
- Hromadná konzultace „Vzory tabulek investičních priorit v území v programovém období 2021-2027“ pořádaná NPI 23.8.2021 on-line,
- Workshop k realizaci SCLLD 2014-2020 a 2021-2027 a sdílení příkladů dobré praxe pořádaný MAS Region Kunětické hory, z.s. dne 23.8.2021 v Sezemicích,
- Kongres „Paliativní den Holice“ pořádaný Oblastní charitou Pardubice 9.9.2021 v Holicích,
- Vzdělávací program „Myšlenkové mapy digitálně a prakticky se zaměřením na strategické řízení a plánování“ pořádaný NPI ČR Pardubice 13.9.2021 on-line,
- Tematický seminář „Příprava nového programovacího období 2021-2027“ pořádaný NS MAS dne 21.9.2021 v Kutné Hoře,
- LeaderFEST 2021 pořádaný KS MAS Středočeského kraje ve dnech 21. – 22.9.2021 v Kutné Hoře,
- Seminář „Time Management“ pořádaný NS MAS 5.-6.10.2021 on-line,
- Seminář k novému programovému období v rámci OPZ+ pořádaný MPSV 15.10.2021 on-line,
- Seminář „Obnovitelné zdroje energie a komunitní energetika na úrovni MAS“ pořádaný KS MAS Pardubického kraje dne 26.10.2021 v Horních Ředicích,
- Kurz „Efektivní a assertivní komunikace“ pořádaný NS MAS ve dnech 2.-3.11.2021 v Brně,

- Webinář „Aktuality v SCLLD“ pořádaný RO SZIF 3.11.2021 on-line,
- Kurz “Komplexní příprava k certifikaci IPMA“ pořádaný PM CONSULTING, s.r.o. 8.-12.11.2021 on-line
- Kurz „Techniky jednání a vyjednávání“ pořádaný NS MAS ve dnech 30.11. – 1.12.2021 on-line,
- Kurz „Manažer Koučem“ pořádaný Akademii Libchavy ve dnech 22.9., 19.10., 11.11. a 7.12.2021 v Libchavách,
- Kurz „První spirála kouče“ pořádaný Akademii Libchavy ve dnech 21.9., 25.-26.10 a 22.-23.11.2021 v Libchavách.

Dále ve sledovaném období probíhala **výměna zkušeností a poznatků**, a to především v rámci Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje. Obsahem společných setkání byly nejen informace z výboru a pracovních skupin NS MAS ČR, ale i informace k přípravě a zkušenostem z vyhlašování výzev MAS, příprava Strategie CLLD 2021-2027 nebo výměna informací se zástupci Pardubického kraje nebo CSV.

- 22.1.2021 on-line – Modernizační fond – výzva na komunitní energetiku,
- 29.4.2021 on-line – zkušenosti z realizace výzev a příprava Strategie CLLD 2021-2027,
- 10.6.2020 on-line – zkušenosti z realizace výzev a příprava Strategie CLLD 2021-2027,
- 1.10.2021 Sezemice – možný rozvoj spolupráce mezi MAS a Pardubickým krajem, spolupráce MAS a CSV, zkušenosti z realizace výzev a příprava Strategie CLLD 2021-2027,
- 26.10.2021 Horní Ředice - příprava Strategie CLLD 2021-2027, obnovitelné zdroje energie, podpora inovací,
- 16.11.2021 Hlinsko – zkušenosti z realizace výzev a příprava Strategie CLLD 2021-2027.

5. Informace o plnění doporučení Evaluační zprávy z 5/2019

V průběhu první poloviny roku 2019 probíhala mid-term evaluace Strategie CLLD, jejímž cílem bylo zhodnotit:

- relevanci nastavení jednotlivých programových rámců,
- nastavení činností a procesů implementace Strategie CLLD,
- pokrok v plnění cílů programových rámců,
- příspěvek Strategie CLLD ke vzniku přidané hodnoty v území MAS.

Jak vyplývá z tabulek uvedených níže, většina doporučení již byla splněna. Pouze zbývá dořešit napojení MAS na Hospodářskou komoru a přes ně na podnikatele. I na tomto doporučení se intenzivně pracuje, tak aby došlo k jeho naplnění zejména ve spojitosti s novými výzvami MAS Holicko pro nové programové období 2021-2027.

Tabulka 31 – Plnění doporučení Evaluační zprávy z 5/2019

| Doporučení Evaluační zprávy | | Stav plnění |
|-----------------------------|--|-------------|
| 1 | Interní procesy a postupy na úrovni nositele SCLLD | |
| 1.1 | Vedoucí manažer SCLLD se obrátil na kancelář NS MAS, aby vznesla požadavek na ŘO PRV a IROP k odstranění skutečností, které negativně ovlivňují činnosti na MAS. | Splněno |
| 1.2 | Vedoucí manažer SCLLD zajistí v jednacím řádu ošetření situace, kdy by hlasování výběrové komise skončilo rovným počtem hlasů. | Splněno |
| 1.3 | Vedoucí manažer SCLLD zajistí vyšší a lepší propagaci informací do území: | |

| Doporučení Evaluační zprávy | | Stav plnění |
|------------------------------------|---|--------------------|
| 1.3.a | - posílí vazbu na mikroregion (účast pracovníka MAS na jednání svazku obcí), | Plněno průběžně |
| 1.3.b | - více využít propagačně akci „dny Holicka“, | Plněno průběžně |
| 1.3.c | - napojit se na Hospodářskou komoru a přes ně na podnikatele, | Pokračuje |
| 1.3.d | - zhodnotí návštěvnost webových stránek MAS a jejich přehlednost a v případě potřeby tento komunikační kanál posílit, | Splněno |
| 1.3.e | - zajistí lepší propagaci seminářů pro žadatele a posílí komunikační kanály do území (např. účast vedoucího pracovníka SCLLD na jednání svazku obcí, přenos informací přes starosty). | Plněno průběžně |
| 2 | Nastavení východisek pro realizaci SCLLD a řešení aktuálních problémů | |
| 2.1 | Návrhy na drobnou úpravu SWOT analýzy a Analýzy rizik vzešlé z jednání Focus group budou zpracovány při tvorbě strategie do nového programového období. | Splněno |
| 2.2 | MAS zavede do svých aktivit některá opatření (navrhovaná Focus group) na eliminaci hrozeb: | |
| 2.2.a | - Zajišťovat monitoring dotačních titulů a zajistit informace o zdrojích do území k potenciálním žadatelům, | Plněno průběžně |
| 2.2.b | - Využívat komunitární programy (pro hrozbu: Nedostatečné množství finančních zdrojů pro realizaci), | Plněno průběžně |
| 2.2.c | - Články v obecních zpravodajích, osobní schůzky se starosty, leták do každé schránky (pro hrozbu: Nedostatek žadatelů při výzvách MAS), | Plněno průběžně |
| 2.3 | Jednou z možných cest, jak účinněji problémy a potřeby řešit je i rozšíření Programových rámců IROP a PRV a zavedení nových Opatření/Fichí a současně navýšení alokace na Programové rámce. | Splněno |
| 3 | Klíčové závěry k jednotlivým Programovým rámcům v rámci relevance SCLLD | |
| 3.1 | Úprava SCLLD – rozšířit programový rámec o článek 20, Fiche Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, oblast f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. | Splněno |
| 3.2 | Úprava SCLLD – úprava finančního indikátorového plánu | Splněno |
| 3.3 | Aktivity MAS – animace území, která zajistí připravenost žadatelů do dalších výzev v rámci Programových rámců PRV a IROP. | Plněno průběžně |
| 3.4 | Aktivity MAS – realizovat dotační poradenství a pomáhat subjektům hledat zdroje na pokrytí aktuálních potřeb v území. | Plněno průběžně |
| 4 | Výstupy a výsledky implementace SCLLD | |
| 4.1 | Úprava SCLLD – úprava finančního indikátorového plánu. | Splněno |
| 4.2 | Aktivity MAS – neustálá propagace realizace SCLLD MAS Holicko v území. Možné nové nástroje: účast manažera MAS na jednání Svazku obcí, využít dny Holicka. | Plněno průběžně |
| 4.3 | Posílení podpory neziskového sektoru v rámci realizace SCLLD. Mezi novými nástroji může být: Cílenější komunikační strategie, využití šablon pro NNO jako nástroj podpory NNO, zavedení článku 20 v rámci PR PRV. | Plněno průběžně |
| 4.4 | Zkvalitnění komunikační strategie směrem ke srozumitelnějšímu podávání informací (možné nástroje: vzdělání pracovníka MAS, využití externích služeb, využití sociálních sítí). | Plněno průběžně |
| 4.5 | Posílit synergické účinky projektů. Možné nástroje: Zavedení nového kritéria: popis synergických vazeb, vyhledávání dalších nástrojů. | Plněno průběžně |
| 4.6 | V rámci vyhlašování výzev PRV zachovat jako preferenční kritérium „Uplatňování inovačních a více odvětvových přístupů“, kde je jako inovace považována i odborná vzdělávací akce pro místní občany. | Splněno |
| 4.7 | Animace území vedoucí k zajištění dostatečného počtu kvalitních projektů v rámci PR PRV. | Plněno průběžně |

6. Informace o problémech a rizicích v průběhu realizace strategie CLLD

6.1. Informace o problémech, které se vyskytly v průběhu realizace SCLLD a přijatá opatření

- 1) Realizace některých projektů se zpožďuje (chybějící materiál a dodávky) a zdražuje (vliv na problém se spolufinancováním žadatelů).**

V současnosti je trh typický tím, že buď chybí materiál a dodávky nebo díky vysoké inflaci je jeho cena vyšší než v době podání žádosti o dotaci. To zapříčinuje zpožďování a zdražování projektů konečných žadatelů, což může v konečném důsledku mít vliv na neplnění finančního a indikátorového plánu Strategie CLLD MAS Holicko.

Opatření: Neustálá podpora žadatelů ze strany MAS Holicko formou telefonických, e-mailových a osobních konzultací, tak aby koneční žadatelé se vyvarovali co nejvíce případným problémům a dopustili se co nejméně chyb v průběhu realizace svých projektů. Tím se alespoň trochu dopomůže k tomu, že žadatel dokončí projekt administrativně včas a bez chyb.

V případě, že i přesto nedojde k realizaci některých projektů, čímž bude ohroženo plnění finančního nebo indikátorového plánu Strategie CLLD MAS Holicko. Pak MAS Holicko musí rychle reagovat tím, že vypíše na volné finance novou výzvu.

- 2) Programový rámec PRV - problém s neplněním indikátoru č. 94800 - Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů. – VYŘEŠENO V PRŮBĚHU ROKU 2021**

Do hrozícího problému s neplněním indikátoru č. 94800 - Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů, se MAS Holicko dostala vinou nezodpovědného žadatele. V předchozí aktualizaci indikátorového plánu v roce 2019 se totiž MAS Holicko zavázala k vytvoření celkem 3,5 pracovních míst na základě hodnot uváděných v již vybraných projektech. Bohužel 1 žadatel (2 projekty) v průběhu roku 2020 nepodal ŽoP a SZIF mu v průběhu roku 2021 ukončil administraci těchto projektů, u kterých ale byl závazek vytvoření celkem 1,5 pracovního místa. MAS Holicko tak mohla mít problém s plněním indikátorového plánu Strategie CLLD MAS Holicko.

Opatření: MAS Holicko podala žádost o změnu na ŘO, a to společně se změnou týkající se navýšení alokace programového rámce PRV v rámci přechodného období a s tím související navýšení hodnot indikátorů. Součástí tedy bylo i snížení hodnot indikátorů týkající se nesplněných pracovních míst. MAS Holicko se pokusila co nejlépe vysvětlit důvody k úpravě tohoto indikátoru a ŘO dne 26.8.2021 schválil snížení hodnoty z 3,5 na 2,0 pracovní úvazky. To jednak odpovídalo povinné minimální hodnotě stanovené Pravidly PRV pro výběr Strategií CLLD (Na každých 200 000 EUR původní alokace na operaci 19.2.1 by mělo být vytvořeno alespoň jedno pracovní místo), tak tuto hodnotu MAS Holicko splnila již v předcházejících letech díky realizaci jiných projektů.

6.2. Informace o potenciálních rizicích realizace SCLLD a opatření k jejich eliminaci

- 1) Neplnění finančního a indikátorového plánu Strategie CLLD**

Realizace některých projektů se zpožďuje a zdržuje. A tak zejména u fichí PRV zaměřených na podporu podnikatelských subjektů nebo spolků může dojít ke zhoršení finančního zdraví žadatelů a nemožnosti pořídit si plánovanou technologii nebo vybavení. Nebo zejména u podnikatelů s ekonomickou činností

týkající se venkovské turistiky, může dojít až k ukončení podnikání žadatele vlivem celostátních opatření souvisejících s COVID. Což povede k tomu, že zazávazkováný projekt se nezrealizuje vůbec. To vše může mít vliv na nedodržení finančního a indikátorového plánu Strategie CLLD MAS Holicko.

Opatření: Neustálá podpora žadatelů ze strany MAS Holicko formou telefonických, e-mailových a osobních konzultací, tak aby koneční žadatelé se vyvarovali co nejvíce případným problémům a dopustili se co nejméně chyb v průběhu realizace svých projektů. Tím se alespoň trochu dopomůže k tomu, že žadatel dokončí projekt administrativně včas a bez chyb.

V případě, že i přesto nedojde k realizaci některých projektů, čímž bude ohroženo plnění finančního nebo indikátorového plánu Strategie CLLD MAS Holicko. Pak MAS Holicko musí rychle reagovat tím, že vypíše na volné finance novou výzvu.

7. Závěr

Hlavním cílem této zprávy bylo zhodnotit současnou situaci naplňování strategie CLLD v průběhu roku 2021. Jednalo se o kompletní zhodnocení všech činností, které provádí MAS a podstatou samotného hodnocení byly vyhlášené výzvy a v závislosti na tom i přijaté a zrealizované projekty. Účelem této zprávy bylo zjistit, jak bylo dosaženo stanovených cílů a zda byly realizovány stanovené výstupy.

V případě věcného pokroku stanovených cílů Strategie CLLD musíme konstatovat, že **skutečné plnění předčila předpoklady z přelomu let 2015/2016, kdy Strategie CLLD vznikala**. Protože již teď 2 roky před ukončením programového období (2023) jsou indikátory plněny na cca 127 %. Na jednu stranu je potěšující, že se na Holicku realizuje více projektů, než jsme si původně mysleli. Ale na druhou stranu je potřeba tuto skutečnost vzít v potaz při tvorbě nové Strategie CLLD 2021-2027 a naplánovat lépe plnění indikátorů tak, aby to více odpovídalo skutečnosti.

Protipól ale tvoří **klíčová aktivita D. Rozvoj cestovního ruchu**, kde jsme na přibližně 64% plnění indikátorů, tj. jedná se o nejméně řešenou oblast na Holicku. A to bohužel i přesto, že původní plán byl pouze v počtu jednotek realizovaných projektů. Jedenak se jedná o dlouhodobý trend, který byl zřetelný při každém hodnocení realizace Strategie CLLD. Ale navíc ve sledovaném roce byla tato oblast jako nejvíce ze všech zasažena celostátními opatřeními proti COVIDU. MAS Holicko se také snaží přispět k plnění této klíčové aktivity prostřednictvím založení a fungování destinační společnosti Pardubicko – perníkové srdce Čech, díky které je oblast Pardubicka propagována nejen po celé ČR, ale i v jiných evropských zemích. Dále Dobrovolný svazek obcí intenzivně pracuje na přípravě projektových dokumentací ke vzniku cyklostezek. Přesto je víceméně jasné, že je potřeba **více iniciovat území k podpoře cestovního ruchu v regionu**.

V případě programového rámce IROP byla tento rok **vyhlášena poslední výzva** na zbývající alokaci určenou pro území MAS Holicko. Alokace této výzvy byla do haléře zazávazkována vybranému projektu. **K 31.12.2021 bylo již podpořeno 20 projektů** (7x základní školy a 13x chodníky) v celkové částce **20.470.539,17,- Kč (93,82%)**. To je o 638.984,18,- Kč (2,93%) méně než je uvedeno v aktualizovaném finančním plánu. Důvodem je úspora již zrealizovaných projektů díky provedeným výběrovým řízením. Většina částky se stihla vrátit do volné alokace MAS a mohla být využita ještě v poslední výzvě. Bohužel dva projekty byly uzavřeny až v průběhu vyhlášené výzvy č.8-IROP a tak **volná alokace ve výši 108.665,46 Kč (0,50% celkové alokace MAS Holicko)** propadla a MAS Holicko ji již **nebude moci využít**. Na druhou stranu MAS Holicko **plní bezproblémově finanční milník** (podané ŽoP k 31.10. daného roku), který byl stanoven řídícím orgánem pro rok 2021 na min. 70,00%. MAS Holicko

má totiž vyčerpáno již 93,82% své alokace určené pro programový rámec IROP, tzn. že již teď plní finanční milník určený i pro rok 2022 (84,85%). Co se týče **indikátorového plánu**, který vznikal na přelomu let 2015/2016, tak dle počtu zaregistrovaných projektů je již teď vidět, že dojde k jeho několikanásobnému překročení (v tuto chvíli plníme na 140 – 217%). Na základě konzultace s Řídícím orgánem IROP bude indikátorový plán upraven dle skutečnosti až na konci období, tj. až všechny projekty budou proplaceny.

V případě programového rámce PRV je situace trochu odlišná, protože tento rok nebyla vyhlášena žádná výzva. Důvodem byla malá volná finanční alokace (necelé 2 mil. Kč) a čekání na nově přidělenou **alokaci pro přechodné období** (využití části alokace určené pro nové programové období 2021-2027 ještě ve stávajícím programovém období 2014-2020). Díky němu byla v 8/2021 **navýšena alokace o 3.386.400,- Kč**, tzn. z původních celkových 12.756.760,- Kč **na nových 16.143.160,- Kč**. Nová částka byla přesunuta do Fichí pro zemědělce, potravináře, malé nezemědělské podniky, spolky a zpřístupnění lesa návštěvníkům. **K 31.12.2021 bylo již podpořeno 28 projektů** (5x zemědělci, 4x potravináři, 12x malé podniky, 2x oplocenky, 1x zpřístupnění lesa návštěvníkům a 4x spolková a kulturní činnost) a **2 projekty jsou ještě v realizaci** (1x malý podnik a 1x spolková činnost), v nichž **je již zazávazkováno 10.809.649,- Kč (66,96%)**. To je o 682.391,- Kč (4,23%) méně než je uvedeno v aktualizovaném finančním plánu. Důvodem je úspora již zrealizovaných projektů díky provedeným cenovým marketingům a nerealizace 2 zazávazkovaných projektů. Tato částka se vrací do volné alokace MAS a bude ji tak možné využít v následujících výzvách MAS. Kvůli přechodnému období byl upraven i indikátorový plán programového rámce, který je tak plněn mezi 33 – 100%. Co je však důležité, MAS Holicko již v tuto chvíli **plní povinný indikátor č. 94800 – Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů na 100%** (*Na každých 200 000 EUR původní alokace na operaci 19.2.1 by mělo být vytvořeno alespoň jedno pracovní místo*). Podpořené projekty **vytvořily již 2,0 pracovních míst**.

Protože **Pardubický kraj neotevřel dotační titul pro MAS s názvem Malý LEADER**, tak ani MAS Holicko nevyhlásila tento dotační titul.

Postupnou realizací projektů v rámci Strategie CLLD 2014-2020 **se začínají projevovat synergické efekty**, i když zatím pouze v omezeném rozsahu. To je způsobeno i nízkou finanční alokací, kterou má MAS Holicko k dispozici na celé toto období (necelých 38 mil. Kč). Na druhou stranu se projevuje provázanost i s projekty podpořenými v předchozím programovém období 2007 – 2013 nebo aktivitami MAS Holicko mimo programové rámce.

Z pohledu jak programových rámců, tak i dalšího obsahu (mimo programové rámců) se Strategie CLLD 2014-2020(2023) v tuto chvíli jeví jako dostatečná, a proto **Kontrolní výbor MAS Holicko nenavrhoje žádná další doporučení pro její aktualizaci**.

Z pohledu **doporučení Evaluační zprávy** (mid-term evaluace) z 5/2019 byla většina doporučených aktivit splněna. Už zbývá dořešit pouze napojení MAS na Hospodářskou komoru a přes ně na podnikatele.

Dále je potřeba zmínit, že v průběhu tvorby této hodnotící zprávy byly **identifikovány 2 problémy**. Jeden týkající se **hrozby neplnění povinného indikátoru č. 94800 (pracovní místa)** byl již v průběhu roku 2021 vyřešen. U druhého problému je třeba se mít stále na pozoru. Ten se týká **případného zpožďování a zdražování projektů**. V současnosti je totiž trh typický tím, že buď chybí materiál a

dodávky nebo díky vysoké inflaci je jeho cena vyšší než v době podání žádosti o dotaci. To vše může v konečném důsledku mít vliv na neplnění finančního a indikátorového plánu Strategie CLLD MAS Holicko. Jediným možným řešením je neustálá podpora žadatelů ze strany MAS Holicko formou konzultací, tak aby koneční žadatelé se vyvarovali co nejvíce případným chybám a problémům. Pokud by i přesto došlo k nerealizaci některých projektů, pak musí MAS rychle vypsat novou výzvu na volné finance.

Kontrolní výbor MAS Holicko navrhuje tato opatření, která povedou ke zlepšení naplňování cílů strategie CLLD MAS Holicko 2014-2020(2023):

- **Dořešení doporučení Evaluační zprávy (mid-term evaluace) z 5/2019:** napojení MAS na Hesopadářskou komoru a přes ně na podnikatele.
- **Neustálá podpora žadatelů ze strany MAS Holicko formou telefonických, e-mailových a osobních konzultací** tak, aby se koneční žadatelé co nejvíce vyvarovali případným problémům a dopustili se co nejméně chyb v průběhu realizace svých projektů. Tím se alespoň trochu dopomůže k tomu, že žadatel dokončí projekt včas a bez chyb.
- **Rychlé vypsání výzev na případné volné finanční alokace,** tak aby byly využity pokud možno veškeré finance, které byly poskytnuty EU do území MAS Holicko.
- **Iniciace území k větší podpoře cestovního ruchu v regionu,** např. zlepšení služeb informačního centra, vznik naučných stezek, budování nových turistických atraktivit (např. vyhlídky, rozhledny, obecní muzea,...), rozvoj ubytovacích a stravovacích zařízení, vydání nových propagačních a informačních materiálů, mapování kulturního a historického dědictví nebo místních tradic, apod.

V Holicích dne 23.5.2022

.....
Lenka Bezdíčková, Obec Jaroslav
Předsedkyně Kontrolního výboru MAS Holicko
